รายงานผลการดำเนินโครงการ พัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง

ประจำปี 2569











จัดทำโดย สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

จัดทำโดย **สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง**

ที่ปรึกษา นางสาวสุมล ยางสูง
นางสาวชญาดา สิงห์ปี
นายสุริยะบุศร์ สดแสงจันทร์
นายธนัช นฤพรพงศ์

เรียบเรียง นางสาวทัชชกร ศีลพรหม

ผู้จัดทำ นางสาวทัชชกร ศีลพรหม
นางสาวชญามน แจ่มจำรัส
นายคมกริช สิริโยธาสกุล
นายเกษม เพิ่มสา
นางสาวพรสุดา อินมูลติ่ง
นายชาญณรงค์ เหมือนปั้น
นางสาวอุไรวรรณ แคลนกระโทก
นายสมเชาว์ บุญประสม
นายคมกฤษ อินทรักษ์
นายพงษ์ศักดิ์ ขาวคง
นางสาวพิชามญชุ์ จำปามี
นางสาวนิตยา ทองสอน
นางสาวจิดาภา การะเวก
นางสาวจินตนา รัจรัญ
นางสาวสมหญิง เพ็ชร์สุวรรณ
นางสาวทาริณี ทองนุ่ม
นายสืบสกุล ตุงคะเศวต
นายอิสระ ศิระพรหม
นายฐากูร ปิ่นทอง
นายนวฤทธิ์ พึ่งเมือง
นางสาวชนิดาภา ประดิษฐ์จา
นางสาววันวิสา นิลใหม่
นายไชยา หอมอ่อน
นางสาวสุกัญญา อัตถาชน
นางสาวสุพรรณี บึงพับ
นายเสฏฐวุฒิ ประมงค์

สารบัญ

รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 1

1. ที่มาโครงการ 1

1.1 ที่มาเชิงนโยบาย 1

1.2 วัตถุประสงค์ 2

1.3 กลุ่มเป้าหมาย 2

1.4 หลักเกณฑ์ ประกาศ และคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ 3

1.5 กลไกการบริหารโครงการ (ภายใน) 4

2. รายงานผลด้านการบริหารโครงการ 5

2.1 รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง งบประมาณปี พ.ศ. 2569 5

2.2 งบประมาณโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2568 11

2.3 ภาพรวมการบริหารโครงการ ปี 2559-2569 11

2.4 ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลต่อเรื่องการบริหารโครงการและการเบิกจ่าย 16

3. รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 17

3.1 รายงานผลความคืบหน้าด้านการก่อสร้างบ้าน 17

3.2 รายงานผลการพัฒนาเครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลองปี 2569 19

3.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลอง 38

3.4 การพัฒนาคุณภาพองค์กรผู้ใช้สินเชื่อ 44

3.5 การสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่รูปธรรมองค์กรผู้ใช้สินเชื่อ ปี 2569 53

3.6 งานช่างชุมชน 54

4. รายงานผลการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน และภาคี 60

5. ภาคผนวก 63

5.1 ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข 63

5.2 กิจกรรมสำคัญ 65

รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ตัวชี้วัดที่ 2. ระดับความสำเร็จในการบริหารโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด (ตัวชี้วัดร่วม) ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2569

1. ที่มาโครงการ

1.1 ที่มาเชิงนโยบาย

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 เห็นชอบข้อเสนอการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) โดยให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) และกรุงเทพมหานคร ร่วมกันดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่บุกรุกลำน้ำสาธารณะ และมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พิจารณาจัดหาที่พักอาศัยถาวรให้กับผู้บุกรุก ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ให้ พม. มท. (กรุงเทพมหานคร) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดำเนินการกำหนดมาตรการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด รวมทั้งจัดหาที่อยู่อาศัยถาวรให้แก่ผู้รุกล้ำคูคลองและทางระบายน้ำ

ในปี พ.ศ. 2558 รัฐบาลได้กำหนดนโยบายสำคัญในการบริหารจัดการสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลำน้ำ และการจัดระเบียบที่อยู่อาศัยให้ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับผู้อยู่อาศัยตามแนวคูคลองและทางระบายน้ำ โดยมีโครงการนำร่องในพื้นที่คลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อเป็นลำดับแรก และสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งที่ 249/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ ลงวันที่ 16 กันยายน 2558 โดยกำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดกรอบแนวทางและมาตรการจัดระเบียบ แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด และพัฒนาที่อยู่อาศัยของชุมชนริมคลองและทางระบายน้ำให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 เห็นชอบโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองตามที่ พม. เสนอ โดยกรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำ ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้สอดรับกับโครงการบริหารจัดการสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลำน้ำ โดยจัดทำแผนดำเนินการระยะเร่งด่วน จำนวน 9 คลอง ได้แก่ คลองบางเขน คลองบางซื่อ คลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร คลองสามวา คลองประเวศบุรีรมย์ คลองพระยาราชมนตรี คลองพระโขนง และคลองลาดบัวขาว โดยมีโครงการนำร่องในพื้นที่คลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อเป็นลำดับแรก และดำเนินการต่อเนื่องไปยังคลองเปรมประชากรในปี พ.ศ. 2562

พม. โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้กำหนดมาตรการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด รวมทั้งการจัดหาที่อยู่อาศัยถาวรให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อน โดยสถาบันได้จัดทำแผนการแก้ไขปัญหาและนำเสนอรูปแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวทางโครงการบ้านมั่นคง ซึ่งชุมชนและสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินช่วยเหลือ เงินสนับสนุน และเงินอุดหนุนจากรัฐ ครัวเรือนละประมาณ 147,000 บาท รวมถึงสามารถขอสินเชื่อเพื่อสร้างบ้านจากสถาบัน โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4 และระยะเวลาผ่อนชำระคืน 30 ปี

การดำเนินโครงการพัฒนาคลองเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชน โดยเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ได้มีการลงนามใน "บันทึกความร่วมมือด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยของชุมชนริมคลองเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ" ระหว่างกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ร่วมกับสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร และสถาบัน เพื่อร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยู่อาศัยของชุมชนริมคลองผู้มีรายได้น้อยที่อยู่ในที่ดินราชพัสดุ ซึ่งได้รับผลกระทบจากโครงการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ ให้มีความมั่นคงและมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีขึ้น ที่สำคัญคือ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถอยู่อาศัยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลัก

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังเป็นการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 9/2560 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกลำน้ำสาธารณะ โดยกำหนดมาตรการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด รวมทั้งการสร้างที่อยู่อาศัยรุกล้ำแนวลำคลองและทางระบายน้ำ ตลอดจนมีโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยของชุมชนตามแนวคลอง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการสร้างระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดหาที่อยู่อาศัยรองรับให้แก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ การดำเนินการพัฒนาคลองเปรมประชากรอยู่ภายใต้แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร ตามที่ มท. เสนอเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 โดยเห็นชอบแผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ การป้องกันน้ำท่วม และการบำบัดน้ำเสียคลองเปรมประชากรทั้งระบบ ตั้งแต่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถึงกรุงเทพมหานคร รวมระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร ซึ่งพบว่ามีการรุกล้ำลำคลองของประชาชนเป็นระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาการรุกล้ำของชุมชนริมคลองและพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่โดยมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งแวดล้อมที่ดี มีรูปแบบที่เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตและสร้างความมั่นคงและสิทธิการครอบครองที่ดินและที่อยู่อาศัยของชุมชน

1.2.2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์และระบบของชุมชนนำไปสู่การสร้างชุมชนเข้มแข็ง จัดการตนเองได้

1.2.3 เพื่อสนับสนุนให้เกิดแผนและทิศทางการพัฒนาชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สวัสดิการ กายภาพ สิ่งแวดล้อม มีการออมทรัพย์เพื่อการสร้างทุนของชุมชน และการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน ประชาสังคม และองค์กรท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง

1.3 กลุ่มเป้าหมาย

การดำเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองกำหนดพื้นที่เป้าหมายดำเนินการตามแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองโดยแบ่งเป็น

1.3.1 คลองลาดพร้าว กลุ่มเป้าหมายการดำเนินการ 50 ชุมชน 7,069 ครัวเรือน ระยะความยาวของชุมชนโดยรวม 2 ฝั่งคลองประมาณ 31.9 กิโลเมตร โดยเป็นครัวเรือนที่อยู่ในแนวการก่อสร้างเขื่อนของกรุงเทพมหานคร ประมาณ 3,800 ครัวเรือน (ประเมินจากการขยายแนวความกว้างของคลอง 35 – 38 เมตร ตามที่สำนักการระบายน้ำกำหนด) ส่วนที่เหลือเป็นครัวเรือนที่ปลูกสร้างบ้านอยู่บนที่ตลิ่ง

1.3.2 คลองเปรมประชากร กลุ่มเป้าหมายการดำเนินการ จำนวน 38 ชุมชน 6,386 ครัวเรือน โดยเป็นข้อมูลจากการสำรวจของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) เมื่อเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน 2561 มาจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง เขตหลักสี่ และเขตจตุจักร จำนวน 32 ชุมชน และพื้นที่เทศบาลตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี 6 หมู่ ระยะความยาวของชุมชนโดยรวม 2 ฝั่งคลองประมาณ 17 กิโลเมตร



1.4 หลักเกณฑ์ ประกาศ และคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ

1.4.1 บันทึกความร่วมมือด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยของชุมชนริมคลองเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ” ระหว่าง กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ร่วมกับ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร และ สถาบัน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558

1.4.2 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 9/2560 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร

1.4.3 แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองลาดพร้าว

1.4.4 แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร ตามที่ มท. เสนอเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562

1.4.5 ระเบียบสถาบันว่าด้วยหลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาชุมชนริมคลอง พ.ศ. 2565

1.4.6 ประกาศสถาบัน เรื่อง แนวทางการสนับสนุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1.4.7 คู่มือการบริหารโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ปี 2569

1.5 กลไกการบริหารโครงการ (ภายใน)

1.5.1 คณะอนุกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน มีบทบาทในการกำกับติดตามการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามโครงการ โดยมีองค์ประกอบมาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนชุมชน ผู้บริหารของ สถาบัน เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง

1.5.2 คณะทำงานต่าง ๆ ที่คณะอนุกรรมการเสนอผู้อำนวยการแต่งตั้ง ดังนี้

(1) คณะทำงานติดตาม สอบทาน และตรวจงวดงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง เพื่อทำหน้าที่วางแผน ติดตาม และสอบทานการใช้งบประมาณและการดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองให้เป็นไปตามแผนงาน ส่งเสริมระบบบริหารจัดการโครงการและสหกรณ์ในชุมชนให้โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะอนุกรรมการฯ ประสานงานกับชุมชนเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียน และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง

(2) คณะทำงานพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาพื้นที่ชุมชนริมคลองลาดพร้าว คลองบางซื่อ และคลองเปรมประชากร เพื่อทำหน้าที่ศึกษา พิจารณา และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการบ้านมั่นคงในพื้นที่ชุมชนริมคลองลาดพร้าว คลองบางซื่อ และคลองเปรมประชากร รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์ในการกลั่นกรองและให้ความเห็นเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ เอกชน ภาควิชาการ องค์กรและเครือข่ายชุมชน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

(3) คณะทำงานจัดการพื้นที่สร้างสรรค์ชุมชนริมคลอง เพื่อทำหน้าที่กำหนดทิศทางและกรอบแนวทางการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ชุมชนริมคลอง รวมทั้งจัดทำหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด ระบบติดตาม และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานร่วมกับชุมชน โดยพิจารณา ให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ต่อกิจกรรมการพัฒนาของชุมชนหรือภาคีเครือข่ายที่ได้รับความเห็นชอบจากสถาบันฯ และวางแผน กำกับ ติดตาม และขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ชุมชนริมคลอง ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลงพื้นที่เพื่อสนับสนุน ให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในชุมชนเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ข้อค้นพบ ปัญหาข้อติดขัด ต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1.5.3 คณะทำงานที่แต่งตั้งขึ้นเฉพาะกิจ ได้แก่ คณะทำงานติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากรของสหกรณ์เคหสถานสามัคคีเทวสุนทร จำกัด เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อทำหน้าที่ กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร โดยสหกรณ์เคหสถานสามัคคี เทวสุนทร จำกัด เขตจตุจักร ให้เป็นไปตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน และรายงานผลต่อผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

2. รายงานผลด้านการบริหารโครงการ

(ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2569)

2.1 รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง งบประมาณปี พ.ศ. 2569

(กลุ่มโครงการใหม่)


2.1.1 การพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง งบประมาณปี พ.ศ. 2569

(เฉพาะโครงการที่ใช้จ่ายจากงบที่ได้รับจัดสรรในปี พ.ศ. 2569)

การพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง งบประมาณปี พ.ศ. 2569 มีเป้าหมายดำเนินการตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายปีในพื้นที่คลองเปรมประชากร จำนวน 151 ครัวเรือน วงเงินรวม 26,576,000 บาท (ยี่สิบหกล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็นงบบริหารจัดการโครงการ 2,258,960 บาท และงบสนับสนุนให้กับองค์กรชุมชน 24,317,040 บาท

การดำเนินการ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2569 มีการพิจารณาและเห็นชอบงบประมาณโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากรให้กับองค์กรชุมชน จำนวน 4 โครงการ 151 ครัวเรือน งบประมาณ 24,317,040 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 14,655,432 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.27 ของงบที่ได้รับอนุมัติคงเหลือ 9,661,608 บาท ดังนี้

องค์กรชุมชน	อนุมัติ		เบิกจ่าย	คงเหลือรอเบิกจ่าย
	ครัวเรือน	จำนวนเงิน		
1.สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนหลังแฟลตรวมพัฒนา จำกัด	122	19,306,000.00	10,468,300.00	8,837,700.00
2.สหกรณ์เคหสถานทำนบสตรีเหล็กรวมพัฒนา จำกัด	11	1,644,500.00	1,422,502.00	221,998.00
3.สหกรณ์เคหสถานตาลคู่สมบูรณ์พูนทรัพย์ จำกัด	18	2,703,500.00	2,101,590.00	601,910.00
4.สหกรณ์เคหสถานแจ้งวัฒนะ 5 จำกัด	-	663,040.00	663,040.00	-
รวม	**151**	**24,317,040.00**	**14,655,432.00**	**9,661,608.00**

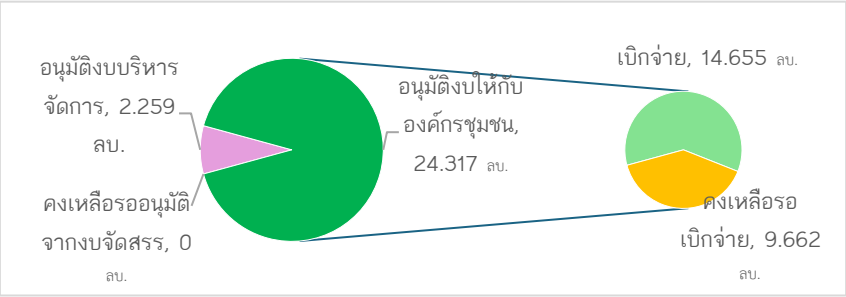

ทั้งนี้ อนุมัติงบประมาณสนับสนุนให้กับองค์กรชุมชนครบถ้วนทั้งวงเงินแล้ว

(1) การวิเคราะห์เปรียบเทียบเป้าหมายผลลัพธ์ตามงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ. 2569

ผลการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากรตามเป้าหมายที่สำนักฯ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กำหนดเป้าหมายจำนวน 151 ครัวเรือน ภายใต้วงเงินงบอุดหนุนจำนวน 24,317,040 บาท ปรากฏว่า สามารถสนับสนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนได้

ครบถ้วนตามเป้าหมาย จำนวน 151 ครัวเรือน เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 24,317,040 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย

ทั้งนี้ สำนักฯ ขอรายงานผลลัพธ์จากการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว โดยโครงการที่ได้รับอนุมัติทั้ง 4 โครงการ สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ครบถ้วนทั้ง 4 โครงการ และมีความคืบหน้าในการก่อสร้างบ้านและระบบสาธารณูปโภคภาพรวมของชุมชนเป็นไปตามแผนงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์กรชุมชน/สถานะด้านการรื้อย้ายและก่อสร้าง	อนุมัติปี 69	เตรียมรื้อ	รื้อย้าย	ระหว่างสร้าง	สร้างเสร็จ
1.สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนหลังแฟลตร่วมพัฒนา จำกัด	122	24 (มิ.ย.69)	-	-	-
2.สหกรณ์เคหสถานทำนบสตรีเหล็กร่วมพัฒนา จำกัด	11	รื้อแล้ว	11	11	-
3.สหกรณ์เคหสถานตาลคูสมบูรณ์พูนทรัพย์ จำกัด	18	18 (มิ.ย.69)	-	-	-
4.สหกรณ์เคหสถานแจ้งวัฒนะ 5 จำกัด	-	รื้อแล้ว	53	-	-
รวม	**151**	**42**	**64**	**11**	**-**

➢**สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนหลังแฟลตร่วมพัฒนา จำกัด เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร** ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัย จำนวน 122 ครัวเรือน 19,306,000.00 บาท โดยเบิกจ่ายแล้ว 10,468,300.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.22 ของวงเงินที่ได้รับ คงเหลือ 8,837,700.00 บาท ซึ่งมีแผนดำเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ปัจจุบันสหกรณ์ฯ ได้รับอนุญาตให้เช่าที่ดินจากกรมธนารักษ์ เนื้อที่ 3-1-98.5 ไร่ และอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างบ้านจากกรมธนารักษ์ โดยได้ยื่นคำขอเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2569 และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จะดำเนินการยื่นขออนุญาตต่อสำนักงานเขตหลักสี่ตามลำดับ ทั้งนี้ การดำเนินงานมีความล่าช้า เนื่องจากสมาชิกบางส่วนขาดความเชื่อมั่นต่อโครงการจากความล่าช้าในกระบวนการพิจารณาอนุญาตของหน่วยงานราชการ รวมถึงมีข้อกังวลเกี่ยวกับความชัดเจนของแผนงานก่อสร้างเขื่อน ส่งผลให้สมาชิกเกิดความลังเลและกังวลต่อการรื้อย้ายบ้านเดิม ซึ่งสถาบันฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงข้อมูลและสร้างความเข้าใจกับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง รวมถึงร่วมกับคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ดำเนินการทบทวนจำนวนสมาชิกที่มีความพร้อมในการรื้อย้ายบ้านเดิมและก่อสร้างบ้านใหม่ในระยะแรก เพื่อเร่งให้เกิดรูปธรรมในการพัฒนาโครงการ ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่แจ้งความประสงค์ที่จะดำเนินการรื้อย้ายทันทีเมื่อได้รับอนุญาตก่อสร้างบ้านจากกรมธนารักษ์และสำนักงานเขตหลักสี่ โดยคาดว่ากระบวนการพิจารณาอนุญาตจะใช้ระยะเวลาประมาณ 45–60 วัน ทั้งนี้ สถาบันฯ จะติดตามและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถดำเนินการตามแผนและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่คงเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ต่อไป





➢**สหกรณ์เคหสถานทำนบสตรีเหล็กร่วมพัฒนา จำกัด เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร** ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัย จำนวน 11 ครัวเรือน 1,644,500.00 บาท โดยเบิกจ่ายแล้ว 1,422,502.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.50 ของวงเงินที่ได้รับ คงเหลือ 221,998.00 บาท ซึ่งมีแผนดำเนินการเบิกจ่ายในช่วงเดือน มิถุนายน 2570 ผลการดำเนินงานพบว่า สหกรณ์ดำเนินการก่อสร้างบ้านรวมทั้งสิ้น 167 ครัวเรือน ประกอบด้วย บ้านที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 125 ครัวเรือน และบ้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 42 ครัวเรือน โดยในจำนวนดังกล่าวเป็นบ้านที่ได้รับการเสนอของบประมาณในปี 2569 จำนวน 11 ครัวเรือน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบบ้านได้ภายในเดือนกันยายน 2569






➢**สหกรณ์เคหสถานตาลคู่สมบูรณ์พูนทรัพย์ จำกัด เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร** ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัย จำนวน 18 ครัวเรือน 2,703,500.00 บาท โดยเบิกจ่ายแล้ว 2,101,590.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.75 ของวงเงินที่ได้รับ คงเหลือ 601,910.00 บาท ซึ่งมีแผนดำเนินการเบิกจ่ายในช่วงเดือน มิถุนายน 2570 ผลการดำเนินงานพบว่า สหกรณ์ดำเนินการก่อสร้างบ้านแล้วรวม 152 ครัวเรือน ประกอบด้วย บ้านที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 151 ครัวเรือน และบ้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 1 ครัวเรือน นอกจากนี้ สหกรณ์มีแผนก่อสร้างบ้านเพิ่มเติม จำนวน 59 ครัวเรือน โดยในจำนวนดังกล่าวเป็นบ้านที่ได้รับการเสนอของบประมาณในปี 2569 จำนวน 18 ครัวเรือน ในพื้นที่ชุมชนตาลคู่พัฒนา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรื้อย้ายบ้าน และได้ดำเนินการคัดเลือกผู้รับเหมาเรียบร้อยแล้ว โดยผู้รับเหมาอยู่ระหว่างการปรับพื้นที่เพื่อดำเนินการวางผังที่อยู่อาศัยให้แก่สมาชิก และดำเนินการก่อสร้างบ้านให้เป็นไปตามแผนต่อไป







➢**สหกรณ์เคหสถานแจ้งวัฒนะ 5 จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร** ได้รับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินการตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 663,040.00 บาท โดยเบิกจ่ายงบประมาณแล้วทั้งวงเงิน คิดเป็นร้อยละ 100 ของวงเงินที่ได้รับ สหกรณ์มีแผนก่อสร้างบ้านรวม 81 ครัวเรือน ดำเนินการรื้อย้ายบ้านเดิมแล้ว จำนวน 53 ครัวเรือน ทั้งนี้ ปัจจุบันสำนักการระบายน้ำอยู่ระหว่างการก่อสร้างเขื่อน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2569 จากนั้นจึง

จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างบ้านในเฟสที่ 1 ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้ดำเนินกระบวนการสรรหาผู้รับเหมาแล้ว และคาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างบ้านได้ในช่วงเดือนกันยายน–ตุลาคม 2569



(2) การวิเคราะห์เปรียบเทียบระยะเวลากระบวนการดำเนินงาน

➢ การเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ และการออกแบบแสดงผลการอนุมัติโครงการ

สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ในฐานะฝ่ายเลขาคณะอนุกรรมการฯ ได้เสนอผู้อำนวยการพิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณสนับสนุนระยะเวลาหลังจากการประชุมตั้งแต่ 4 วัน ไปจนถึง 5 วัน (เฉลี่ย 4.5 วัน) และระยะการออกแบบแสดงผลการอนุมัติโครงการหลังจากที่ผู้อำนวยการอนุมัติโครงการและงบประมาณตั้งแต่ 4 วัน ไปจนถึง 9 วัน (เฉลี่ย 5.25 วัน) ดังนี้

โครงการ	การประชุมคณะอนุกรรมการ		ผู้อำนวยการอนุมัติ	แบบแสดงผลฯ
1.สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนหลังแฟลตร่วมพัฒนา จำกัด	ครั้งที่ 7/2568	18 พ.ย. 68	21 พ.ย. 68 (4 วัน)	24 พ.ย. 68 (4 วัน)
2.สหกรณ์เคหสถานทำนบสตรีเหล็กร่วมพัฒนา จำกัด	ครั้งที่ 7/2568	18 พ.ย. 68	21 พ.ย. 68 (4 วัน)	24 พ.ย. 68 (4 วัน)
3.สหกรณ์เคหสถานตาลคู่สมบูรณ์พูนทรัพย์ จำกัด	ครั้งที่ 8/2568	25 ธ.ค. 68	29 ธ.ค. 68 (5 วัน)	6 ม.ค. 69 (9 วัน) (วันหยุด)
4.สหกรณ์เคหสถานแจ้งวัฒนะ 5 จำกัด	ครั้งที่ 2/2569	11 พ.ค. 69	15 พ.ค. 69 (5 วัน)	18 พ.ค. 69 (4 วัน)

➢ การเบิกจ่ายงบประมาณ

สำนักสำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ในฐานะฝ่ายเลขาคณะอนุกรรมการฯ ดำเนินการตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ นับจากวันที่ลงรับเอกสารขอเบิกจ่ายงบประมาณจนกระทั่งเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จในงวดนั้น (กรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วน) โดยกำหนดให้เบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ได้รับการอนุมัติโครงการและงบประมาณ

➢ การอนุมัติและเบิกจ่าย


โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	โอนเงินวันที่	หมายเหตุ
1.สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนหลังแฟลตร่วมพัฒนา จำกัด	19,306,000.00	10,468,300.00	8,837,700.00	26 มี.ค.69	ตามแผนงาน
2.สหกรณ์เคหสถานทำนบสตรีเหล็กร่วมพัฒนา จำกัด	1,644,500.00	1,422,502.00	221,998.00	15 พ.ค.69	ตามแผนงาน
3.สหกรณ์เคหสถานตาลคู่สมบูรณ์พูนทรัพย์ จำกัด	2,703,500.00	2,101,590.00	601,910.00	26 มี.ค.69	ตามแผนงาน
4.สหกรณ์เคหสถานแจ้งวัฒนะ 5 จำกัด	663,040.00	663,040.00	-	29 มิ.ย.69	ตามแผนงาน

➢ กระบวนการการบริหารโครงการ

โครงการ	ลงรับเอกสาร	เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ (3 วัน)	อนุมัติ	การตรวจสอบและโอนเงิน (6 วัน)
1.สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนหลังแฟลตร่วมพัฒนา จำกัด	13 มี.ค.69	20 มี.ค.69 (8 วัน) *มีแก้ไขเอกสาร	23 มี.ค.69 (4 วัน)	26 มี.ค.69 (4 วัน)
2.สหกรณ์เคหสถานทำนบสตรีเหล็กร่วมพัฒนา จำกัด	7 พ.ค.69	7 พ.ค.69 (1 วัน)	8 พ.ค.69 (2 วัน)	15 พ.ค.69 (8 วัน) *มีแก้ไขเอกสาร
3.สหกรณ์เคหสถานตาลคู่สมบูรณ์พูนทรัพย์ จำกัด	16 มี.ค.69	20 มี.ค.69 (5 วัน)	23 มี.ค.69 (4 วัน)	26 มี.ค.69 (4 วัน)

โครงการ	ลงรับ เอกสาร	เสนอผู้มีอำนาจ อนุมัติ (3 วัน)	อนุมัติ	การตรวจสอบและ โอนเงิน (6 วัน)
		*มีแก้ไขเอกสาร		
4.สหกรณ์เคหสถานแจ้งวัฒนะ 5 จำกัด	18 มิ.ย.69	23 มิ.ย.69 (6 วัน) *มีแก้ไขเอกสาร	24 มิ.ย.69 (2 วัน)	29 มิ.ย.69 (6 วัน)

(3) ข้อสังเกต ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงาน

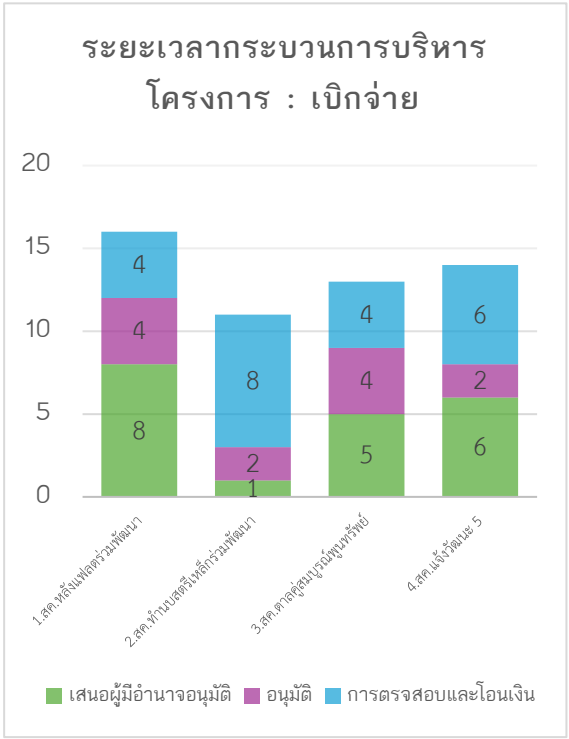

จากการระยะเวลาดำเนินการ พบว่ากระบวนการบริหารโครงการ ตั้งแต่การรับเอกสารจนถึงขั้นตอนการตรวจสอบและโอนเงิน ใช้ระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 10.5 วันต่อโครงการ โดยมีระยะเวลาอยู่ระหว่าง 8–13 วัน ทั้งนี้ ขั้นตอนการเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติสามารถดำเนินการได้ภายใน 0–7 วัน ขั้นตอนการอนุมัติใช้เวลา 0–3 วัน และขั้นตอนการตรวจสอบและโอนเงินใช้เวลา 3–7 วัน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ควรพิจารณาปรับปรุงเพื่อลดระยะเวลาการดำเนินงาน

ทั้งนี้พบว่า ความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อระยะเวลาการดำเนินงาน โดยในกรณีที่เอกสารมีข้อผิดพลาดหรือจำเป็นต้องแก้ไข จะส่งผลให้ระยะเวลาตั้งแต่การรับเอกสารจนถึงการเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ จากการดำเนินงานพบข้อผิดพลาดในเอกสารของบางโครงการ อาทิ การระบุชื่อสหกรณ์ ชื่อตำแหน่งผู้ลงนาม แผนการดำเนินงาน ที่อยู่ของผู้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ รายงานการประชุมประกอบการเบิกจ่าย จึงจำเป็นต้องส่งเอกสารกลับไปแก้ไขหลายครั้ง ส่งผลให้ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบและประสานงานเพิ่มเติม โดยการป้องกันและลดปัญหาดังกล่าว สำนักฯ ได้ส่งเสริมให้ชุมชนมีการกลั่นกรองความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารก่อนส่งให้สำนักฯ พร้อมทั้งนำข้อค้นพบจากการดำเนินงานในปีก่อนมาปรับใช้ โดยจัดทำรายการตรวจสอบ (Checklist) ที่มีขั้นตอนและรายการตรวจสอบที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน ซึ่งมีบทบาทในการสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชน อย่างไรก็ตาม จากการดำเนินงานยังพบข้อผิดพลาดและความไม่ครบถ้วนของเอกสารประกอบการเบิกจ่ายในบางกรณี

นอกจากข้อผิดพลาดจากการจัดทำเอกสารของชุมชนแล้ว ยังพบข้อจำกัดด้านระบบสารสนเทศของสถาบันฯ เป็นครั้งคราว อาทิ ระบบไม่สามารถจัดทำเอกสาร หรือ Generate จากแบบฟอร์มสำเร็จรูปได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ส่งผลให้ต้องประสานงานกับสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาระบบ และในบางกรณีจำเป็นต้องส่งเอกสารกลับไปยังชุมชนเพื่อดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งส่งผลต่อระยะเวลาในการดำเนินงานโดยรวม

และแม้ว่าโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้ง 4 โครงการที่ได้รับอนุมัติสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด แต่ยังพบข้อจำกัดในรายชุมชน อาทิ กรณีสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนหลังแฟลตร่วมพัฒนา จำกัด เขตหลักสี่ ที่เดิมกำหนดรื้อย้ายในเดือนมิถุนายน 2569 แต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากได้รับอนุญาตให้เช่าที่ดินล่าช้ากว่าแผน ส่งผลให้การยื่นขออนุญาตก่อสร้างเลื่อนออกไปตามลำดับ ทั้งนี้ จากการประสานการทำงานกับสหกรณ์ พบว่าสหกรณ์ได้เตรียมความพร้อมและสามารถดำเนินการรื้อย้ายได้ทันทีเมื่อได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง

กรณีสหกรณ์เคหสถานตาลคู่สมบูรณ์พูนทรัพย์ จำกัด เขตดอนเมือง อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง โดยได้ปรับแผนการรื้อย้ายเป็นช่วงเดือนมิถุนายน–กรกฎาคม 2569 เนื่องจากราคาวัสดุก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้นจากสถานการณ์ภายนอก ประกอบกับการก่อสร้างเขื่อนริมคลองเปรมประชากรระยะที่ 1 ล่าช้ากว่าแผน ส่งผลให้ต้องทบทวนแผนการก่อสร้างและการรื้อย้ายใหม่ ซึ่งจากการประสานการทำงานกับสหกรณ์ พบว่าสหกรณ์มีความพร้อมในการดำเนินการตามแผนที่ปรับปรุงแล้ว โดยยังคงอยู่ในกรอบระยะเวลาการดำเนินงานตามแผน

นอกจากนี้ในหลายชุมชนภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ยังประสบข้อติดขัดเรื่องการติดตั้งระบบไฟฟ้าและประปาใหม่ รวมถึงความล่าช้าในการก่อสร้างเขื่อนริมคลอง ซึ่งอาจกระทบต่อการเข้าอยู่อาศัยของสมาชิกภายหลังการก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จ สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองจึงได้บูรณาการการทำงานร่วมกับสหกรณ์และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานการรื้อย้าย การก่อสร้าง และการติดตั้งสาธารณูปโภคให้สอดคล้องกัน พร้อมมอบหมายผู้ปฏิบัติงานติดตามสถานการณ์และเร่งรัดการดำเนินงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นและสนับสนุนให้แผนการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย

2.1.2 ภาพการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

มีการอนุมัติงบสนับสนุนให้กับองค์กรชุมชนและภาคีพัฒนา 29 โครงการ 345 ครัวเรือน 69,375,472 บาท เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 45,966,267 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.26 คงเหลือรอเบิกจ่าย 23,409,205 บาท ดังนี้

ปีงบประมาณ/ สนับสนุนชุมชนริมคลอง	รหัสงบ	ปีงบ	ดำเนินการปี 2569 (กลุ่มใหม่ อนุมัติ 2569)				ร้อยละการเบิกจ่าย
			อนุมัติระหว่างปี		เบิกจ่าย (กลุ่ม2569)	คงเหลือรอเบิกจ่าย	
			ครัวเรือน	จำนวนเงิน			
งบโครงการบ้านมั่นคง		2559	-	15,780,557	14,139,480	1,641,077	89.60
งบสนับสนุนการพัฒนาฯ และงบช่วยเหลือฯ		2560	49	5,529,500	2,423,850	3,105,650	43.83
1.งบสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภคชุมชนริ	ค86568		49	3,576,000	1,953,600	1,622,400	
2.งบช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเสียโอกาสชุมชนริมคลอ	ค86668			1,953,500	470,250	1,483,250	
3.งบช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนริมคล	ค86700	2561		2,119,000	-	2,119,000	-
4.โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรม	86800	2563	145	21,516,575	14,634,705	6,881,870	68.02
5.โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรม	86900	2564				-	
6.โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรม	86000	2565				-	
7.โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรม	86100	2566				-	
8.โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรม	86200	2567				-	
9.โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรม	86300	2568		112,800	112,800	-	100.00
10.โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง	86400	2569	151	24,317,040	14,655,432	9,661,608	60.27
รวมทั้งสิ้น			345	69,375,472	45,966,267	23,409,205	66.26

2.2 งบประมาณโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2568

(กลุ่มโครงการเดิม) *ไม่รวมงบโครงการบ้านมั่นคง*

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มีงบคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รวม 111,687,187 บาท โดยมีการเบิกจ่ายระหว่างปี 13,168,815 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.79 ของวงเงินคงเหลือยกมา มีการคืนโครงการและงบประมาณ จำนวน 170 ครัวเรือน 25,167,205 บาท ทั้งนี้ ได้รับโอนคืนงบประมาณ จำนวน 22,148,500 บาท ทั้งนี้มีงบที่อยู่ระหว่างเรียกคืนเงินที่เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน 11,753,583 บาท **ส่งผลให้คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย (กรณีได้รับคืนเงินที่เบิกจ่ายไปแล้ว) จำนวน 95,280,885 บาท** โดยมีการอนุมัติคงงบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว (ใช้ดำเนินการแล้ว) จำนวน 218,782 บาท ดังนี้

ปีงบประมาณ/ สนับสนุนชุมชนริมคลอง	รหัสงบ	ปีงบ	คงเหลือรอเบิกจ่าย (กรณีรับคืนเงินที่เบิกจ่ายไปแล้ว)	ดำเนินการปี 2569 (กลุ่มเดิม)						
				เบิกจ่ายระหว่างปี	คืนงบระหว่างปี		คงเหลือรอเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	รับคืนเงินที่เบิกจ่ายไปแล้ว	คงเหลือรอเบิกจ่าย (กรณีรับคืนเงินที่เบิกจ่ายไปแล้ว)
					ครัวเรือน	จำนวนเงิน				
งบโครงการบ้านมั่นคง		2559	0.00	-			0			0
งบสนับสนุนการพัฒนาฯ และงบช่วยเหลือฯ		2560	12,637,154	-	-	-	12,637,154		-	12,418,372
1.งบสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภคชุมชนริ	ค86568		8,700,654	-	-	-	8,700,654		-	8,700,654
2.งบช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเสียโอกาสชุมชนริมคลอ	ค86668		3,936,500	-		-	3,936,500		-	3,717,718
3.งบช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนริมค	ค 86700	2561	-		40	5,880,000	- 5,880,000		5,880,000.00	-
4.โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรม	86800	2563	90,189,203	12,372,815	113	16,745,705	61,070,683	13.72	16,268,500.00	77,339,183
5.โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรม	86900	2564	796,000	796,000			-	100.00		-
6.โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรม	86000	2565	-				-			-
7.โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรม	86100	2566	-				-			-
8.โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรม	86200	2567	6,697,200		17	2,541,500	4,155,700			4,155,700
9.โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรม	86300	2568	1,367,630				1,367,630			1,367,630
รวมทั้งสิ้น			111,687,187	13,168,815	170	25,167,205	73,351,167	11.79	22,148,500	95,280,885
รวมทั้งสิ้น (ไม่รวมงบโครงการบ้านมั่นคงปี 2559)			111,687,187	13,168,815	170	25,167,205	73,351,167	11.79	22,148,500	95,280,885


2.3 ภาพรวมการบริหารโครงการ ปี 2559-2569

2.3.1 สรุปภาพรวมงบประมาณที่ผ่านมา

การดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองตามนโยบายของรัฐบาล ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่ปี 2559– 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณดำเนินการ รวม 10,302 ครัวเรือน งบประมาณ 1,778,416,000 บาท โดย ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2569 มีการอนุมัติงบประมาณสุทธิ 7,703 ครัวเรือน 1,408,517,491.42 บาท เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 1,302,084,984.42 บาท อยู่ระหว่างเรียกคืนเงินที่เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน 12,257,583 บาท **ส่งผลให้คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย (กรณีหากได้รับคืนเงินที่เบิกจ่ายไปแล้ว) จำนวน 118,908,872 บาท** ทั้งนี้มีการอนุมัติคงงบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว (ใช้ดำเนินการแล้ว) จำนวน 218,782 บาท และในการดำเนินการระยะต่อไป **คงเหลือเป้าหมายดำเนินการ รวม 3,372 ครัวเรือน 561,132,782.54 บาท** ดังนี้

ปีงบประมาณ/ สนับสนุนชุมชนริมคลอง	รหัสงบ	ปีงบ	กรอบที่ได้รับจัดสรร		อนุมัติสุทธิ (สะสม)		เบิกจ่ายสุทธิ (สะสม)	ระหว่างเรียกคืนงบที่เบิกจ่ายไปแล้ว	อนุมัติคงงบที่เบิกจ่ายไปแล้ว	คงเหลือรอเบิกจ่าย (กรณีรับคืนเงินที่เบิกจ่ายไปแล้ว)	คงเหลือเป้าหมายดำเนินการต่อ รออนุมัติ	
			ครัวเรือน	งบประมาณ	ครัวเรือน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน				ครัวเรือน	รวม
				A		B	C	D	E	F=B-C+E+D		G=A-B
งบโครงการบ้านมั่นคง		2559	-	-	813	203,205,938.96	202,068,861.96	504,000.00		1,641,077.00	-	-
งบสนับสนุนการพัฒนาฯ และงบช่วยเหลือฯ		2560	4,696	751,360,000	2,890	440,304,331.00	436,533,892.00	11,753,583	218,782	15,742,804	1,806	299,084,004
1.งบสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภคชุมชนริ	ค86568		4,696		2,890	188,028,344.00	180,642,623.00	2,937,333.00		10,323,054	1,806	147,147,023.00
2.งบช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเสียโอกาสชุมชนริมคลอ	ค86668					204,869,587.00	208,484,869.00	8,816,250.00	218,782.00	5,419,750		151,936,981.00
3.งบช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนริมค	ค86700	2561	905	199,680,000	865	195,681,603.46	193,562,603.46	-		2,119,000		3,998,396.54
4.โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรม	86800	2563	3,115	548,240,000	2,846	502,241,778.00	418,020,725.00	-		84,221,053	269	45,998,222.00
5.โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรม	86900	2564	995	175,120,000	15	16,142,224.00	16,142,224.00	-		-	980	158,977,776.00
6.โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรม	86000	2565	200	35,200,000	-	2,228,160.00	2,228,160.00	-		-	200	32,971,840.00
7.โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรม	86100	2566	100	17,600,000	-	1,114,100.00	1,114,100.00	-		-	100	16,485,900.00
8.โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรม	86200	2567	70	12,320,000	53	8,703,356.00	4,547,656.00	-		4,155,700	17	3,616,644.00
9.โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรม	86300	2568	70	12,320,000	70	12,320,000.00	10,952,370.00	-		1,367,630	-	-
10.โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง	86400	2569	151	26,576,000	151	26,576,000.00	16,914,392.00	-		9,661,608	-	-
รวมทั้งสิ้น			10,302	1,778,416,000	7,703	1,408,517,491.42	1,302,084,984.42	12,257,583.00	218,782.00	118,908,872	3,372	561,132,782.54

<u>หมายเหตุ</u> งบประมาณปี พ.ศ. 2565 และ 2566 ยังไม่ได้มีการอนุมัติสนับสนุนให้องค์กรชุมชน แต่การดำเนินการยังคงดำเนินการต่อเนื่องตามเป้าหมายที่ได้รับมาในแต่ละปี

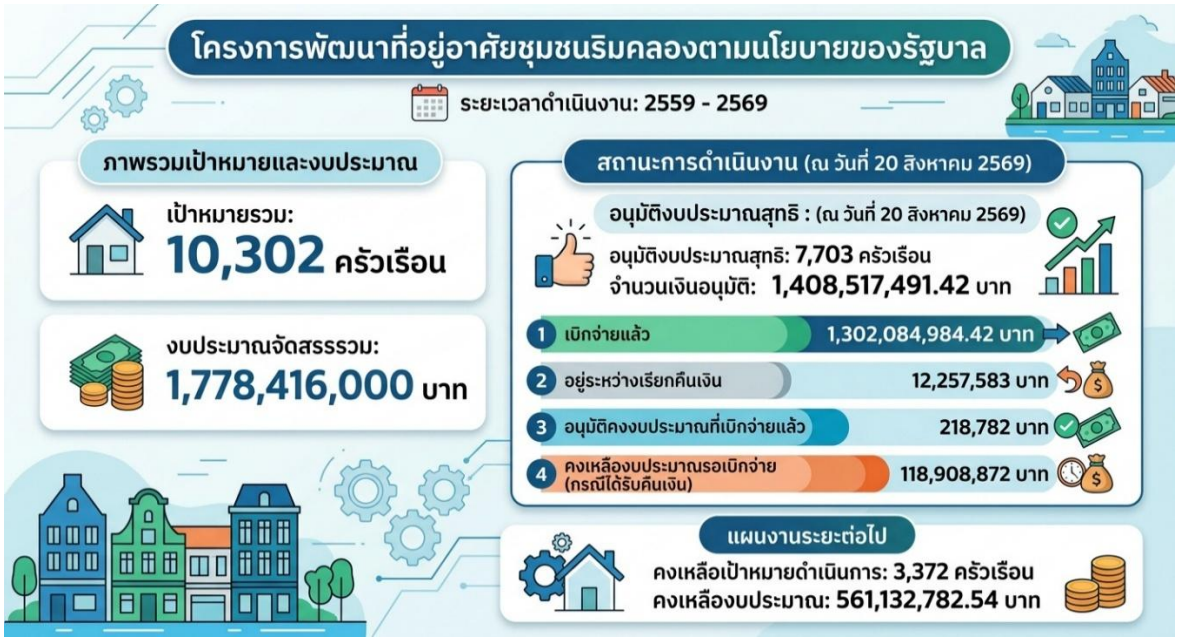

2.3.2 สถานะงบประมาณปี พ.ศ. 2559-2569

(1) งบประมาณโครงการบ้านมั่นคง คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย 1,641,077.00 บาท

(2) งบประมาณปี พ.ศ. 2560 ใช้สำหรับดำเนินการคลองลาดพร้าว มีงบที่อยู่ระหว่างเรียกคืนเงินที่เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน 11,753,583.00 บาท และมีการอนุมัติคงงบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว (ใช้ดำเนินการตามแผนงานแล้ว) จำนวน 218,782.00 บาท ส่งผลให้คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย (กรณีได้รับคืนเงินที่เบิกจ่ายไปแล้ว) จำนวน 15,742,804.00 บาท และคงเหลือเป้าหมายดำเนินการต่อในปีหน้า 1,806 ครัวเรือน วงเงินคงเหลือ 299,084,004.00 บาท

(3) งบงบประมาณปี พ.ศ. 2561 มีงบคงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 2,119,000.00 บาท และคงเหลือเป้าหมายดำเนินการต่อในปีหน้า วงเงินคงเหลือ 3,998,396.54 บาท

(4) งบงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ใช้สำหรับดำเนินการคลองเปรมประชากร งบคงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 84,221,053.00 บาท และคงเหลือเป้าหมายดำเนินการต่อในปีหน้า 269 ครัวเรือน วงเงินคงเหลือ 45,998,222.00 บาท

(5) งบงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ใช้สำหรับดำเนินการคลองเปรมประชากร ไม่มีงบคงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย โดยคงเหลือเป้าหมายดำเนินการต่อในปีหน้า 980 ครัวเรือน วงเงินคงเหลือ 158,977,776.00 บาท

(6) งบประมาณปี พ.ศ. 2565 ใช้สำหรับดำเนินการคลองเปรมประชากร ไม่มีการอนุมัติโครงการและงบประมาณจากงบปีดังกล่าว โดยใช้งบประมาณคงเหลือในปีอื่น ๆ โดยคงเหลือเป้าหมายดำเนินการต่อในปีหน้า 200 ครัวเรือน วงเงินคงเหลือ 32,971,840.00 บาท

(7) งบประมาณปี พ.ศ. 2566 ใช้สำหรับดำเนินการคลองเปรมประชากร ไม่มีการอนุมัติโครงการและงบประมาณจากงบปีดังกล่าว โดยใช้งบประมาณคงเหลือในปีอื่น ๆ โดยคงเหลือเป้าหมายดำเนินการต่อในปีหน้า 100 ครัวเรือน วงเงินคงเหลือ 16,485,900.00 บาท

(8) งบงบประมาณปี พ.ศ. 2567 ใช้สำหรับดำเนินการคลองเปรมประชากร งบคงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 1,367,630.00 บาท โดยดำเนินการอนุมัติตามเป้าหมายที่ได้รับจัดสรรประจำปีแล้วดำเนินการต่อในปีหน้า 17 ครัวเรือน วงเงินคงเหลือ 3,616,644.00 บาท

(9) งบงบประมาณปี พ.ศ. 2568 ใช้สำหรับดำเนินการคลองเปรมประชากร งบคงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 1,367,630.00 บาท โดยดำเนินการอนุมัติตามเป้าหมายที่ได้รับจัดสรรประจำปีแล้ว

(10) งบงบประมาณปี พ.ศ. 2569 ใช้สำหรับดำเนินการคลองเปรมประชากร งบคงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 9,473,358.00 บาท โดยดำเนินการอนุมัติตามเป้าหมายที่ได้รับจัดสรรประจำปีแล้ว

2.2.3 รายชื่อโครงการที่คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่ายภายใต้การพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง

(1) งบโครงการบ้านมั่นคง จำนวน 5 โครงการ จำนวนเงินคงเหลือ 1,641,077 บาท

ลำดับ	รหัสโครงการ	องค์กรชุมชน	คงเหลือสุทธิ
1	PT046869-03491	โครงการสนับสนุนบ้านมั่นคงที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนริมคลองเปรมประชากร ของ กลุ่มออมทรัพย์แจ้งวัฒนะ 5 จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	245,652
2	PT046869-03492	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ไล่รื้อ ภัยพิบัติ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงลาดพร้าวสามัคคี จำกัด	144,150
3	PT046869-03615	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ไล่รื้อ ภัยพิบัติ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นสิทธิชุมชนคนริมคลอง จำกัด	122,570
4	ระหว่างบันทึกโครงการ	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยบ้านมั่นคง สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองสามแสนสุข จำกัด	488,765
5	PT046869-03620	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยบ้านมั่นคง สหกรณ์เคหสถานบ้านเพื่อที่อยู่อาศัยบางบัวเชิงสะพานไม้ 1 จำกัด	639,940
			1,641,077

(2) งบประมาณปี พ.ศ. 2560 งบสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภคชุมชนริมคลองค86568 และงบช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเสียโอกาสชุมชนริมคลอง ค86668 คงเหลือจำนวน 10 โครงการ จำนวนเงินคงเหลือ 15,742,804 บาท

ลำดับ	รหัสโครงการ	องค์กรชุมชน	คงเหลือ	ระหว่างเรียกคืน	อนุมัติคงไว้	คงเหลือสุทธิ
1	PT116868-03028	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองลาดพร้าวจตุจักร จำกัด (หลังกรมวิทยาศาสตร์)	1,534,500			1,534,500
2	PT116868-01832	ชุมชนหลังสมาคมโรงเรียนไทย-ญี่ปุ่น โดยสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงห้วยขวาง จำกัด	1,772,890			1,772,890
3	PT116869-01652	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนพหลโยธิน 32 จำกัด	463,650			463,650
4	PT116869-03409	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเพิ่มทรัพย์สินสมบุญ จำกัด (ชุมชนพัฒนาหมู่ 1)	90,000.00			90,000.00
5	PT116869-03408	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเพิ่มทรัพย์สินสมบุญ จำกัด (ชุมชนพัฒนาหมู่ 2)	2,552,000.00			2,552,000.00
6	HS-60-0025	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนลาดพร้าว 80	-112,532		112,532	-
7	HS-60-0039	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนสามัคคีร่วมใจ	-175,000	175,000		-

ลำดับ	รหัสโครงการ	องค์กรชุมชน	คงเหลือ	ระหว่างเรียกคืน	อนุมัติคงไว้	คงเหลือสุทธิ
8	HS-60-0058	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนริมคลองบางซื่อ ลาดพร้าว 34	- 8,540,833	8,434,583	106,250	-
9	HS-60-0081	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนคลองเสนานิคม 2	- 2,103,914	3,144,000		1,040,086
10	HS-60-0036	สหกรณ์เคหสถานเครือข่ายคลองบางเขน จำกัด (ชุมชนพหลโยธิน 32 กลุ่ม 2)	1,872,000			1,872,000
11	HS-60-0080	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนพหลโยธิน 46	1,950,040			1,950,040
12	HS-60-0083	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนริมคลองลาดพร้าว ภาวนา	2,700,342			2,700,342
13	HS-60-0084	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนหลังตลาดสุภาพงษ์	1,767,296			1,767,296
			3,770,439	**11,753,583**	**218,782**	**15,742,804**

(3) งบประมาณปี พ.ศ. 2561 งบช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนริมคลอง ค86700 คงเหลือจำนวน 2 โครงการ จำนวนเงินคงเหลือ 2,119,000 บาท

ลำดับ	รหัสโครงการ	องค์กรชุมชน	คงเหลือสุทธิ
1	ระหว่างบันทึกโครงการ	โครงการพื้นที่สร้างสรรค์ สู่การจัดการที่ยั่งยืนอย่างมีส่วนร่วม ปี 2569 โดยเครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง	2,000,000
2	PT116869-03617	โครงการสนับสนุนการขอทะเบียนบ้านโครงการบ้านมั่นคงเดิม เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร	119,000
			2,119,000

(4) งบประมาณปี พ.ศ. 2563 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร 86800 คงเหลือจำนวน 23 โครงการ จำนวนเงินคงเหลือ 84,221,053 บาท

ลำดับ	รหัสโครงการ	องค์กรชุมชน	คงเหลือสุทธิ
1	PT116863-05813	สหกรณ์เคหสถานศิษย์หลวงปู่ขาว จำกัด	820,000
2	PT116863-07909	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงประเสริฐเปรมประชา จำกัด	7,497,000
3	PT116863-07912	สหกรณ์เคหสถานร่มไทรงามพัฒนา จำกัด	16,464,000
4	PT116863-07926	สหกรณ์เคหสถานประชากร 3 จำกัด	477,630
5	PT116863-09414	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนหลักหก จำกัด	26,709,835
6	PT116863-09417	สหกรณ์เคหสถานแจ้งวัฒนะ 5 จำกัด	2,928,420
7	PT116863-09472	สหกรณ์เคหสถานชุมชนร่วมพัฒนา จำกัด	14,538,700
8	PT116865-06462	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนหลักหก จำกัด	1,800,000
9	PT116865-06532	สหกรณ์เคหสถานชุมชนปู่เจ้าสมิงพรายสะพานปูน ดอนเมือง จำกัด	152,858
10	PT116866-05594	สหกรณ์เคหสถานแจ้งวัฒนะ 5 จำกัด (ซอยต้นสน)	300,000
11	PT116866-05595	สหกรณ์เคหสถานพัฒนา 99 มีสุขร่วมใจ จำกัด	67,500
12	PT116866-05596	สหกรณ์เคหสถานชุมชนปู่เจ้าสมิงพรายสะพานปูน ดอนเมือง จำกัด	89,000
13	PT116866-05597	สหกรณ์เคหสถานศิษย์หลวงปู่ขาว จำกัด	135,000
14	PT116866-05598	สหกรณ์เคหสถานประชากร 3 จำกัด	105,000
15	PT116867-01528	สหกรณ์เคหสถานแจ้งวัฒนะ 5 จำกัด (อยู่ดีมีสุข)	133,170
16	PT116868-01874	สหกรณ์เคหสถานคลองเปรมประชาพัฒนา จำกัด	190,320
17	PT116869-01578	สหกรณ์เคหสถานตาลคู่สมบูรณ์พูนทรัพย์ จำกัด	147,500
18	PT116869-03146	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จำกัด	6,660,000
19	PT176864-03270	สหกรณ์เคหสถานประชากร 3 จำกัด	68,250
20	PT176864-04202	สหกรณ์เคหสถานชุมชนร่วมพัฒนา จำกัด	3,328,500
21	PT176864-04204	สหกรณ์เคหสถานศิษย์หลวงปู่ขาว จำกัด	730,000
22	PT176864-04277	สหกรณ์เคหสถานชุมชนปู่เจ้าสมิงพรายสะพานปูน ดอนเมือง จำกัด	804,000
23	ระหว่างบันทึกโครงการ	สหกรณ์เคหสถานชุมชนแจ้งวัฒนะ 5 จำกัด	74,370
			84,221,053

(5) งบประมาณปี พ.ศ. 2567 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร 86200 คงเหลือจำนวน 1 โครงการ จำนวนเงินคงเหลือ 4,155,700 บาท

ลำดับ	รหัสโครงการ	องค์กรชุมชน	คงเหลือสุทธิ
1	PT116867-06117	สหกรณ์เคหสถานตาลคู่สมบูรณ์พูนทรัพย์ จำกัด (ตาลคู่พัฒนา)	4,155,700
			4,155,700

(6) งบประมาณปี พ.ศ. 2568 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร 86300 คงเหลือจำนวน 2 โครงการ จำนวนเงินคงเหลือ 1,480,430 บาท

ลำดับ	รหัสโครงการ	องค์กรชุมชน	คงเหลือสุทธิ
1	PT116868-00028	สหกรณ์เคหสถานร่มไทรงามพัฒนา จำกัด	867,630
2	PT116868-01874 (นับปี2563)	สหกรณ์เคหสถานคลองเปรมประชาพัฒนา จำกัด	500,000
			1,367,630


(7) งบประมาณปี พ.ศ. 2569 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร 86400 คงเหลือจำนวน 3 โครงการ จำนวนเงินคงเหลือ 9,661,608 บาท

ลำดับ	รหัสโครงการ	องค์กรชุมชน	คงเหลือสุทธิ
1	PT116869-00126	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนหลังแฟลตร่วมพัฒนา จำกัด	8,837,700
2	PT116869-01824	สหกรณ์เคหสถานทำนบสตรีเหล็กร่วมพัฒนา จำกัด	221,998
3	PT116869-01578	สหกรณ์เคหสถานตาลคู่สมบูรณ์พูนทรัพย์ จำกัด	601,910
			9,661,608

2.2.4 สถานะการดำเนินงานในระบบโปรแกรมสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

สำนักฯ ดำเนินการสนับสนุนการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านโปรแกรม จำนวน 2 โปรแกรม ได้แก่ โปรแกรมบริหารงานบ้านมั่นคง CodiBMOS และ โปรแกรมบริหารจัดการโครงการ CodiPMS มีโครงการที่ยกมาดำเนินการในปี พ.ศ. 2569 จำนวน 155 โครงการ ซึ่งมีการปิดโครงการระหว่างปี รวม 28 โครงการ ดังนี้

โปรแกรม	ยกมาจากปี 2568	ดำเนินการปิดโครงการ ปี 2569				ปิดโครงการรวม	คงเหลือดำเนินการ / Active
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
CodiBMOS	54	-	-	1	1	2	52
CodiPMS	101	17	1	4	4	26	75
รวม	**155**	**17**	**1**	**5**	**5**	**28**	**127**

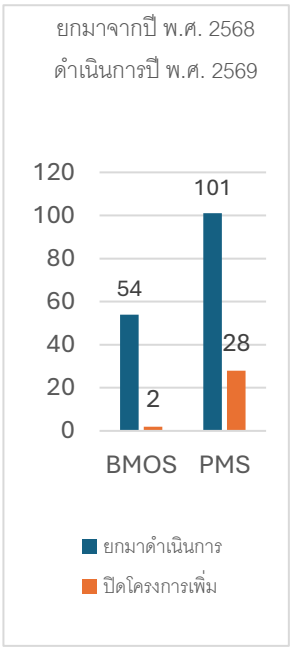

ทั้งนี้โครงการที่มีสถานะ "ดำเนินการ / Active" จำนวน 127 โครงการ

- มีการเบิกจ่ายงบประมาณครบทั้งวงเงินแล้ว 98 โครงการ โดยอยู่ระหว่างการติดตามสถานะด้านการก่อสร้างบ้าน สรุปผลการดำเนินงานและติดตามการรายงานผลการดำเนินงานและปิดโครงการ โดยจะได้มีการสนับสนุนให้องค์กรชุมชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
- คงเหลือโครงการที่คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 29 โครงการ โดยอยู่ระหว่างการติดตามสถานะงานเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับการก่อสร้างบ้าน

2.4 ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลต่อเรื่องการบริหารโครงการและการเบิกจ่าย

จากการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร พบปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการบริหารโครงการและการเบิกจ่ายที่สำคัญ ดังนี้

(1) กรณีโครงการในพื้นที่คลองลาดพร้าว โครงการส่วนใหญ่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ครบถ้วนแล้ว คงเหลือเฉพาะโครงการที่ยังมีแผนดำเนินการก่อสร้างบ้านต่อเนื่อง ส่วนโครงการที่ไม่มีการก่อสร้างบ้านต่อ ชุมชนได้หารือร่วมกับสมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาคืนงบประมาณบางส่วน เนื่องจากสมาชิกหลายรายยังรอความชัดเจนเกี่ยวกับแผนการก่อสร้างเขื่อนของสำนักการระบายน้ำ ซึ่งหยุดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของสมาชิกและการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้ จากการประสานการดำเนินงานและข้อมูลจากการประชุมระหว่างหน่วยงาน พบว่าสำนักการระบายน้ำอยู่ในขั้นตอนการจัดจ้างผู้รับจ้าง ดังนั้น หากมีความชัดเจนเกี่ยวกับแผนและกรอบระยะเวลาการก่อสร้างเขื่อน อาจส่งผลให้สมาชิกมีความเชื่อมั่นและกลับมาเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสามารถดำเนินการก่อสร้างบ้านต่อได้ ซึ่งจะช่วยให้การบริหารโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

(2) กรณีโครงการในพื้นที่คลองเปรมประชากร โครงการส่วนใหญ่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกเพื่อดำเนินการได้แล้ว ส่วนงบประมาณที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้เป็นงบประมาณสำหรับการดำเนินงานในงวดที่สองและงวดที่สาม ซึ่งการเบิกจ่ายมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความก้าวหน้าของงานก่อสร้างบ้านในระดับพื้นที่ ทั้งนี้ ในบางชุมชนการก่อสร้างบ้านมีความล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด เนื่องจากมีข้อขัดข้องหลายประการ อาทิ บ้านของสมาชิกหรือผู้ที่ไม่เข้าร่วมโครงการยังไม่ได้รื้อย้ายออกจากพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างบ้านในพื้นที่ต่อเนื่องได้ รวมทั้งการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบางส่วนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดร่วมกัน ส่งผลให้ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างล่าช้า และกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณในงวดที่สองและงวดที่สามตามลำดับ

ดังนั้นอาจสรุปได้ว่าปัญหาหลักที่ส่งผลต่อการบริหารโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ คือ **ความไม่ชัดเจนของแผนงานที่เกี่ยวข้อง การประสานงานระหว่างหน่วยงาน ความพร้อมของพื้นที่ก่อสร้าง และความพร้อมของสมาชิกในการเข้าร่วมโครงการ** ซึ่งล้วนส่งผลต่อความต่อเนื่องของงานก่อสร้าง และทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่สามารถดำเนินการได้ตามกรอบเวลาที่วางไว้ในบางโครงการ

3. รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

3.1 รายงานผลความคืบหน้าด้านการก่อสร้างบ้าน

การดำเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองกำหนดพื้นที่เป้าหมายดำเนินการตามแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลอง **มีผลความคืบหน้างานก่อสร้างบ้าน** ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2569 ดังนี้

3.1.1 คลองลาดพร้าว กลุ่มเป้าหมายการดำเนินการ 50 ชุมชน 7,069 ครัวเรือน **สามารถดำเนินการพัฒนาได้แล้ว** 35 ชุมชน 3,758 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 53.16 ของกลุ่มเป้าหมาย

ตารางแสดงความคืบหน้าผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2569

(สิ้นเดือนกันยายน 2568 ถึงปัจจุบัน สามารถดำเนินการได้เพิ่มขึ้นรวม 7 ครัวเรือน)

ผลการดำเนินงาน (ครัวเรือน)	พ.ศ. 2568				พ.ศ.2569								
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ก่อสร้างแล้วเสร็จ	3,444	3,444	3,485	3,485	3,485	3,485	3,485	3,502	3,502	3,502	3,502	3,502	3,502
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	67	67	26	26	26	26	26	24	24	24	24	24	24
พื้นที่พร้อมก่อสร้าง	240	240	240	240	240	240	240	232	232	232	232	232	232
รวม	**3,751**	**3,751**	**3,751**	**3,751**	**3,751**	**3,751**	**3,751**	**3,758**	**3,758**	**3,758**	**3,758**	**3,758**	**3,758**
คิดเป็นร้อยละ	53.06	53.06	53.06	53.06	53.06	53.06	53.06	53.16	53.16	53.16	53.16	53.16	53.16
เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-




3.1.2 คลองเปรมประชากร กลุ่มเป้าหมายการดำเนินการ จำนวน 38 ชุมชน 6,386 ครัวเรือน **สามารถดำเนินการพัฒนาได้แล้ว** 25 ชุมชน 2,619 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 41.01 ของกลุ่มเป้าหมาย

ตารางแสดงความคืบหน้าผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2569

(สิ้นเดือนกันยายน 2568 ถึงปัจจุบัน สามารถดำเนินการได้เพิ่มขึ้นรวม 124 ครัวเรือน)

ผลการดำเนินงาน (ครัวเรือน)	พ.ศ. 2568				พ.ศ.2569								
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ก่อสร้างแล้วเสร็จ	1,764	1,764	1,842	2,194	2,211	2,211	2,239	2,251	2,251	2,263	2,263	2,263	2,263
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	628	628	550	206	276	276	215	203	225	217	225	225	225
พื้นที่พร้อมก่อสร้าง	103	103	103	95	73	95	143	143	126	126	131	131	131
รวม	**2,495**	**2,495**	**2,495**	**2,495**	**2,560**	**2,582**	**2,597**	**2,597**	**2,602**	**2,606**	**2,619**	**2,619**	**2,619**
คิดเป็นร้อยละ	39.07	39.07	39.07	39.07	40.09	40.43	40.67	40.67	40.75	40.81	41.01	41.01	41.01
เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า		0	0	0	65	22	15	0	5	4	13	0	0

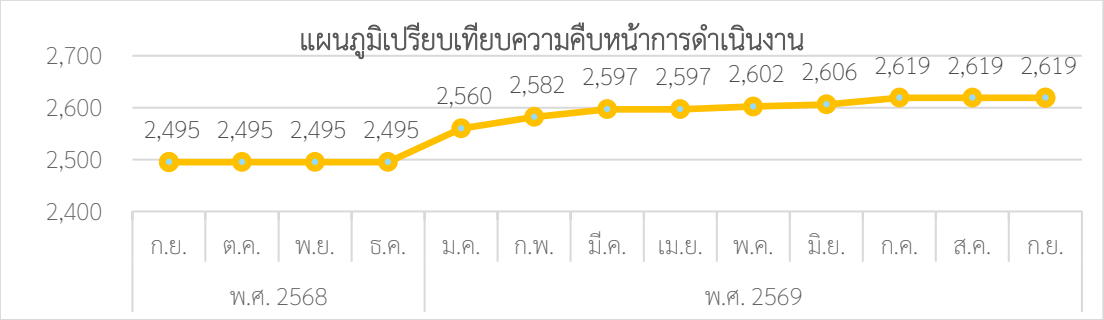



ชุมชน	เขต	จำนวน (ครัวเรือน) รับรองสิทธิ	สร้างเสร็จ (ครัวเรือน)	กำลังก่อสร้าง (ครัวเรือน)	พร้อมสร้าง=รื้อแล้วมีพื้นที่สร้าง	พร้อมสร้าง = รื้อย้ายแล้วไม่มีพื้นที่สร้าง	พร้อมรื้อย้าย/ไม่มีพื้นที่สร้าง (แผนงานต่อไป)	ผู้ไม่เข้าร่วม+ยังดำเนินการไม่ได้
			รวม	รวม	รวม			
10	สายไหม	1,454	1,216	-	-	-	73	165
15	ดอนเมือง	3,031	928	95	20	33	596	1,359
18	หลักสี่	3,132	1,233	109	83	43	407	1,257
8	บางเขน	1,469	664	-	24	24	175	582
16	จตุจักร	1,907	1,053	15	105	28	216	490
15	ห้วยขวาง	1,506	375	-	-	3	785	343
6	ปทุมธานี	956	304	22	-	-	454	176
88	รวม	13,455	5,773	241	232	131	2,706	4,372
50	ลาดพร้าว	7,069	3,502	24	146	86	1,301	2,010
38	เปรมประชากร	6,386	2,271	217	86	45	1,405	2,362

3.1.3 ข้อค้นพบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

ทีมออกแบบและก่อสร้าง รับมอบหมายหน้าที่ประสานการทำงานระหว่างสมาชิกคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ หน่วยงานภาคี รวมถึงผู้รับจ้างก่อสร้างบ้านที่ได้รับการคัดเลือกจากสหกรณ์และ

สมาชิก การกำกับควบคุม การก่อสร้างให้เป็นไปตาม BOQ กฎหมายด้านการก่อสร้าง/สิ่งแวดล้อม โดยจากการปฏิบัติงานปรากฏข้อค้นพบ ดังนี้

1. งานก่อสร้างจำเป็นต้องปรับให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละชุมชน แต่ละพื้นที่มีข้อจำกัดและศักยภาพแตกต่างกัน ทั้งด้านสภาพพื้นที่ รูปแบบที่อยู่อาศัย เศรษฐกิจของครัวเรือน ความพร้อมของสมาชิก และศักยภาพของชุมชน จึงไม่สามารถกำหนดรูปแบบการดำเนินงานหรือแนวทางทางช่างที่เป็นมาตรฐานเดียวกันได้ทั้งหมด

2. คุณภาพงานก่อสร้างขึ้นอยู่กับการควบคุมงานและความรู้ด้านช่างของผู้เกี่ยวข้อง พบว่างานก่อสร้างบางส่วนมีรายละเอียดทางเทคนิคที่ชุมชนหรือผู้รับจ้างบางรายยังขาดความรู้และประสบการณ์ ทำให้จำเป็นต้องมีการให้คำแนะนำ ตรวจสอบ และติดตามงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้งานเป็นไปตามแบบ BOQ มาตรฐานการก่อสร้าง และข้อกำหนดด้านกฎหมายและสิ่งแวดล้อม

3. การบริหารงานก่อสร้างต้องอาศัยการประสานงานหลายฝ่ายและการเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นระบบการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย ได้แก่ คณะกรรมการสหกรณ์ สมาชิก ผู้รับจ้าง ทีมออกแบบและก่อสร้าง และหน่วยงานภาคี จึงอาจเกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลหรือความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะกรณีที่ต้องอาศัยการตัดสินใจหรือการประสานงานจากหลายหน่วยงาน

4. การติดตามงานอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของโครงการ จากข้อจำกัดด้านจำนวนเครือข่ายช่างชุมชน/เครือข่าย ทำให้การลงพื้นที่และติดตามงานบางแห่งไม่สามารถดำเนินการได้อย่างใกล้ชิดเท่าที่ควร โดยทีมออกแบบและก่อสร้าง ร่วมกับทีมช่างชุมชนได้จัดลำดับความสำคัญของพื้นที่ การติดตามงานตามระยะสำคัญของการก่อสร้าง และการใช้เครื่องมือหรือระบบติดตามงาน จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับงานได้

5. บทบาทของทีมออกแบบและก่อสร้างไม่ได้จำกัดเฉพาะการควบคุมงาน แต่เป็นกลไกสนับสนุนการบริหารโครงการของชุมชน การให้คำปรึกษาทางเทคนิค การประสานผู้เกี่ยวข้อง การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการสนับสนุนให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการงานก่อสร้างได้ด้วยตนเอง ดังนั้นจึงควรพัฒนาระบบสนับสนุนและองค์ความรู้ด้านช่างให้ชุมชนมีศักยภาพเพิ่มขึ้นอย่าง

3.2 รายงานผลการพัฒนาเครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลองปี 2569

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้มีการสนับสนุนการดำเนินงานขบวนองค์กรชุมชนในการขับเคลื่อนงานพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้นำในพื้นที่ เพื่อให้องค์กรชุมชนรับรู้และทราบถึงแนวทางงานนโยบายในการทำงานการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนที่ได้รับผล กระทบจากการสร้างเขื่อนระบายน้ำคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร ได้มีการขับเคลื่อนงานภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง และได้มีการรวมตัวกันสร้างเป็นเครือข่ายองค์กรชุมชนในการขับเคลื่อนงานพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ในนาม “เครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง” (คพสค.) ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนชุมชนริมคลอง เพื่อหนุนเสริมและรวมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน ต่อมาได้มีการจดจัดตั้งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ในแต่ละพื้นที่เพื่อสามารถแลกเปลี่ยนและช่วยกันหนุนเสริมเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากรโดยประกอบไปด้วย 8 พื้นที่ ได้แก่ เขตสายไหม เขตดอนเมือง เขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตจตุจักร เขตห้วยขวาง เขตคลองสามวา และจังหวัดปทุมธานี ตลอดจนเพื่อให้มีความเข้าใจอันดีต่อกัน

เกิดความร่วมมือในการทำงาน โดยที่ผ่านมาทางขบวนองค์กรชุมชนได้มีทีมทำงานการขับเคลื่อนสนับสนุนด้านการพัฒนาองค์กรการเงินและผู้ใช้สินเชื่อ ด้านการก่อสร้าง ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเชื่อมโยงการทำงาน หนุนเสริม ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีตลอดพื้นที่สายคลอง โดยเครือข่ายฯ มีแผนงานการขับเคลื่อนงานปี 2569 ดังนี้

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณ
1.หมวดงานบริหารยุทธศาสตร์เครือข่าย		**320,648**
1.1	การประชุมกรรมการบริหารเครือข่าย	177,000
1.2	การเชื่อมโยงเครือข่ายพื้นที่ 8 พื้นที่	168,000
1.3	สนับสนุนการเปิดเวที/พัฒนาโครงการ/การสื่อสารประชาสัมพันธ์	35,648
2.หมวดบริหารจัดการและการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ		**155,000**
2.1	การประชุมคณะทำงานตรวจงวดงาน	15,000
2.2	ลงพื้นที่ติดตาม/ตรวจงานก่อสร้าง	140,000
3.หมวดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและสมาชิก		**150,000**
3.1	การประชุมทีมพัฒนาคุณภาพชีวิต	50,000
3.2	การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตอยอดด้านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้	100,000
4.หมวดการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชนริมคลอง		**224,500**
4.1	งานสัมมนาเครือข่าย	150,000
4.2	อบรมการบริหารจัดการโครงการ	34,500
4.3	อบรมพัฒนาศักยภาพทีมช่างชุมชน	40,000
	รวม	**850,148**

3.2.1 การขับเคลื่อนระดับนโยบาย

(1) เครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง ร่วมเดินรณรงค์การขับเคลื่อนเรื่องที่อยู่อาศัยในงานวันที่อยู่อาศัยโลก **ปี 2568 (World Habitat Day 2025)** เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2568 เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้ตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหาที่ดิน ที่อยู่อาศัย และยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยอย่างมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน เครือข่ายท้องถิ่น และหน่วยงานภาคี ที่จะทำให้เกิดการผลักดันสิทธิที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้มีรายได้น้อยหรือคนจน ร่วมกับเครือข่ายอีก 11 เครือข่ายภาคประชาชน







6 ตุลาคม 2568 เครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง ร่วมเดินรณรงค์กับเครือข่ายภาคประชาชน 11 เครือข่าย ในงานวันที่อยู่อาศัยโลก ปี 2568 (World Habitat Day 2025)

(2) เครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง ได้ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายอัครา พรหมเผ่า) ยังไม่ได้รับความยุติธรรม ยังคงมี

ชาวบ้านที่มีบ้านล้ำแนวเขื่อนริมคลองเปรมประชากร และยังได้รับทางเลือกพิเศษ “ตัดบ้านคืนคลอง” และยังได้รับการซ่อมแซมบ้านให้เรียบร้อยโยที่ไม่ต้องเข้าร่วมกับโครงการบ้านมั่นคง ไม่ถูกดำเนินคดี หรือไล่ออกจากพื้นที่ จึงมายื่นหนังสือติดตามความคืบหน้าจากผู้ว่าฯ กทม. การบังคับใช้กฎหมายกับชาวบ้านที่ไม่เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงแล้วหรือไม่ หากยังไม่บังคับใช้กฎหมายชาวบ้านชาวบ้านก็จะไม่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และนโยบายการพัฒนาชุมชนริมคลอง ก็จะดำเนินการไปต่อไม่ได้ อีกทั้งปัญหาอื่นๆ ก็จะตามมาอย่างแน่นอน



8 ธ.ค.68 เครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลองยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ชุมชนมิตรประชาพัฒนา เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

(3) เครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง ได้ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายนิกร โสมกลาง) เพื่อยกระดับการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ชุมชนริมคลอง โดยเสนอให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สนับสนุนให้เกิดกลไกผู้ช่วยผู้พิการผู้สูงอายุในชุมชน รวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือการเข้าถึงสิทธิที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเปราะบาง และที่อยู่อาศัย



20 เมษายน 2569 ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการ พม. ณ ชุมชนตลาดหลักสี่ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


(4) ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานกับหน่วยงานที่ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ประกอบด้วย กรมธนารักษ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการทำงานร่วมกัน และคลี่คลายปัญหาการทำงานในพื้นที่ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้



31 มีนาคม 2569 ประชุมคณะทำงานภาคีเครือข่ายโครงการบ้านมั่นคง ณ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)

3.2.2 การพัฒนาและฟื้นฟูเครือข่ายระดับพื้นที่

สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองร่วมกับคณะทำงานเครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง ร่วมประชุมจัดระบบการทำงานโดยมุ่งเน้นการฟื้นฟูคนทำงานและขับเคลื่อนงานระดับพื้นที่เขตทั้งหมด 8 เขตพื้นที่ เชื่อมโยงการทำงานกับขบวนเครือข่ายภาคกรุงเทพฯ เพื่อสร้างการทำงานในพื้นที่ให้เข้มแข็ง ทบทวนข้อมูลสมาชิกชุมชนริมคลอง

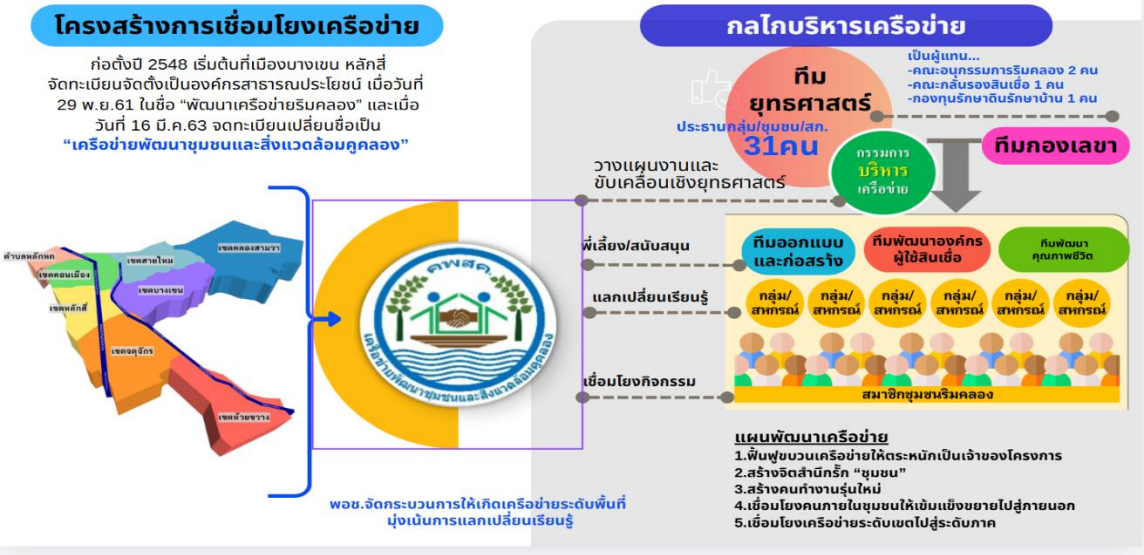



3 ต.ค.68 ประชุมทีมยุทธศาสตร์เครือข่ายทำความเข้าใจโครงการฟื้นฟูเครือข่ายเมือง

โดยเครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง (คพสค.) และเครือข่ายขบวนองค์กรชุมขน เกิดการฟื้นฟูเครือข่ายระดับชุมชน เชื่อมโยงมาทำงานในระดับเขตพื้นที่ นำไปสู่การรวมตัวของเครือข่ายชุมชนริมคลอง คพสค. ในระดับพื้นที่เขตดังนี้

(1) <u>คพสค.เขตสายไหม</u>

- วันที่ 20 ม.ค. 69 ประชุมเครือข่ายเขตสายไหม หารือแนวทางการพัฒนาโครงการและวางแผนการแก้ไขปัญหาร่วมกับคณะกรรมการชุมชนริมคลองเขตสายไหม
- วันที่ 28 ก.พ. 69 ประชุมวางแผนและติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค รายงานความคืบหน้าการปรับโครงสร้างหนี้ NPL ของแต่ละชุมชนในพื้นที่เขตสายไหม
- วันที่ 8 ส.ค. 69 เพื่อประชุมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่และเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนงานร่วมกัน
- วันที่ 20 มิ.ย. 69 เพื่อสนับสนุนการจัดแฟ้มเอกสารและตรวจสอบสัญญาของสมาชิกสหกรณ์

(2) <u>คพสค.เขตดอนเมือง</u>

- วันที่ 17 ต.ค. 68 ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนงานงบประมาณองค์กรการเงิน 9 สหกรณ์ และติดตามสถานการณ์แต่ละชุมชน
- วันที่ 10 พ.ย. 68 ประชุมแลกเปลี่ยน ติดตามสถานการณ์ความคืบหน้า การเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรผู้ใช้สินเชื่อ และการปิดโครงการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขร่วมกันในพื้นที่
- วันที่ 31 ม.ค. 69 ประชุมสถานการณ์ปัจจุบันของชุมชนในพื้นที่เขตดอนเมือง แลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานรายชุมชนและหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
- วันที่ 7 มี.ค. 69 ติดตามความคืบหน้าปัจจุบันในพื้นที่ รายงานสถานการณ์โครงการและแผนการปิดโครงการงบสนับสนุนที่ได้รับจากรัฐ ความคืบหน้าการใช้งบ
- วันที่ 20 ก.ค. 69 ประชุมแลกเปลี่ยนพูดคุยและเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนงานร่วมกัน แลกเปลี่ยนพูดคุยติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ รวมทั้งสะท้อนปัญหา อุปสรรค และแนวทางการเร่งรัดติดตามแก้ไขปัญหาร่วมกัน

(3) <u>คพสค.เขตหลักสี่</u>

- วันที่ 31 ต.ค. 68 ติดตามความคืบหน้าปัจจุบันในพื้นที่ รายงานสถานการณ์โครงการและแผนการปิดโครงการงบสนับสนุนที่ได้รับจากรัฐ ความคืบหน้าการใช้งบ
- วันที่ 28 พ.ย. 68 ประชุมสถานการณ์ปัจจุบันของชุมชนในพื้นที่เขตหลักสี่ แลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานรายชุมชนและหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
- วันที่ 19 ม.ค. 69 ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนงานงบประมาณองค์กรการเงิน 14 สหกรณ์ และติดตามสถานการณ์แต่ละชุมชน
- วันที่ 13 มี.ค. 69 ประชุมสถานการณ์ปัจจุบันของชุมชนในพื้นที่เขตหลักสี่ แลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานรายชุมชนและหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
- วันที่ 16 พ.ค. 69 ประชุมผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของชุมชน
- วันที่ 13 ก.ค. 69 ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนงานงบประมาณองค์กรการเงิน 14 สหกรณ์ และติดตามสถานการณ์แต่ละชุมชน

(4) <u>คพสค.เขตบางเขน</u>

- วันที่ 20 ม.ค. 69 ประชุมการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ชี้แจงงบประมาณเดิมขององค์กรผู้ใช้สินเชื่อ พร้อมทั้งหารือการนำงบประมาณไปใช้ในพื้นที่ การลงพื้นที่หนุนเสริมฟื้นฟูกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนสามัคคีร่วมใจ กลุ่มที่ 2
- วันที่ 23 ก.พ. 69 ประชุมวางแผนและติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค รายงานความคืบหน้าการปรับโครงสร้างหนี้ NPL
- วันที่ 10 มี.ค. 69 ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนงานงบประมาณองค์กรการเงิน 4 สหกรณ์ และติดตามสถานการณ์แต่ละชุมชน

(5) <u>คพสค.เขตจตุจักร</u>

- วันที่ 29 ม.ค. 69 ประชุมวางแผนร่วมกับชุมชนในพื้นที่เขตจตุจักร ออกแบบการทำงานและทบทวนการทำงานในเขตพื้นที่ร่วมกัน
- วันที่ 27 ก.พ. 69 ประชุมผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ปัญหาข้อติดขัดและวางแผนการดำเนินงานต่อของแต่ละสหกรณ์ การจัดทำแผนรายละเอียดการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักทุนและองค์กรการเงิน
- วันที่ 24 มี.ค. 69 ติดตามความคืบหน้าปัจจุบันในพื้นที่ รายงานสถานการณ์โครงการและแผนการปิดโครงการงบสนับสนุนที่ได้รับจากรัฐ ความคืบหน้าการใช้งบขององค์กรผู้ใช้สินเชื่อ
- วันที่ 28 เม.ย. 69 ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนงาน งบประมาณองค์กรการเงิน 6 สหกรณ์ และติดตามสถานการณ์แต่ละชุมชน
- วันที่ 30 พ.ค. 69 ร่วมกับสำนักตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อจัดเวทีศึกษาเรียนรู้กระบวนการการบริหารจัดการที่ดีของสหกรณ์เพื่อนำไปสู่การปิดปีบัญชีให้เป็นปัจจุบัน

- วันที่ 22 มิ.ย. 69 เพื่อประชุมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ และการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2569

(6) <u>คพสค.เขตห้วยขวาง</u>

- วันที่ 6 ธ.ค. 68 ประชุมเครือข่ายเพื่อชี้แจงงบประมาณองค์กรผู้ใช้สินเชื่อ การวางแผนการดำเนินงานของแต่ละสหกรณ์
- วันที่ 8 มี.ค. 69 ประชุมติดตามสถานการณ์ของแต่ละชุมชนในพื้นที่เขตห้วยขวาง ติดตามสำนักตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบบัญชีงบการเงิน
- วันที่ 17 พ.ค. 69 เพื่อรายงานสถานการณ์ชุมชนและสถานการณ์การก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าวที่ล่าช้า

(7) <u>คพสค.เขตคลองสามวา</u>

- วันที่ 21 ธ.ค. 68 ประชุมวางแผนการฟื้นฟูองค์กรวางแผนการเชื่อมโยงเครือข่าย สลัม 4ภาค แผนการประชุมสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงสิทธิชุมชนคนริมคลอง จำกัด ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
- วันที่ 24 ม.ค. 69 ประชุมเพื่อหารือการแก้ไขปัญหาระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการ
- วันที่ 28 ก.พ. 69 ประชุมเพื่อติดตามผลการพัฒนาโครงการ การเชื่อมโยงเครือข่ายเมือง
- วันที่ 28 มี.ค. 69 ประชุมเครือข่ายเพื่อวางแผนการดำเนินตามโครงการและงบประมาณ
- วันที่ 3 เม.ย. 69 ประชุมวางแผนร่วมกับชุมชนในพื้นที่เขตคลองสามวา ออกแบบการทำงานและทบทวนการทำงานในเขตพื้นที่ร่วมกัน
- วันที่ 21 มิ.ย. 69 ประชุมเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนปัญหาของกลุ่มเปราะบางพร้อมให้คำแนะนำแนวทางสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในพื้นที่บึงนายพล
- วันที่ 10 ก.ค. 69 ประชุมกับฝ่ายโยธาเขตคลองสามวา เพื่อหารือเรื่องการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในพื้นที่ บึงนายพล

(8) <u>คพสค.หลักหก ปทุมธานี</u>

- วันที่ 22 ก.พ. 69 ประชุมเครือข่ายหลักหก ปทุมธานี ทำความเข้าใจรายละเอียดการสนับสนุนงบประมาณระดับพื้นที่ของเครือข่ายคลองหลักหก ปัญหาอุปสรรค วางแผนการดำเนินงานในระยะถัดไปของแต่ละสหกรณ์
- วันที่ 24 พ.ค. 69 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง
- วันที่ 21 มิ.ย. 69 ประชุมขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายเมืองหลักหก และผู้แทนเครือข่าย คพสค. เข้าร่วมด้วย โดยการประชุมได้มีการรายงานสถานการณ์ภาพรวมการขับเคลื่อนเมืองหลักหก
- วันที่ 8 ส.ค. 69 ลงพื้นที่ครั้งนี้ เป็นการสำรวจและทบทวนข้อมูลครัวเรือน ตั้งแต่บริเวณโค้งสะพานวัดรังสิต หมู่ 5 ต่อเนื่องไปจนถึงครัวเรือนเดิมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ 13-0-39 ไร่

คพสค.เขตสายไหม



คพสค.เขตดอนเมือง



คพสค.เขตหลักสี่



คพสค.เขตจตุจักร



คพสค.เขตบางเขน



คพสค.เขตห้วยขวาง



คพสค.เขตคลองสามวา



คพสค.หลักหก



3.2.3 การพัฒนาและออกแบบแนวทางการทำงานระดับเครือข่าย

เครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง ได้มีการหารือแนวทางในการขับเคลื่อนงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และวางทิศทางจังหวะก้าวของการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ชุมชนริมคลอง โดยมีทีมยุทธศาสตร์ และงานประเด็นอื่นๆเข้าร่วมหารือ




22 พ.ย.68 ประชุมทีมยุทธศาสตร์เครือข่าย คพสค. ณ พอช.




18 ก.พ. 69 ประชุมทีมยุทธศาสตร์เครือข่าย คพสค. ณ พอช.




31 มี.ค. 69 ประชุมทีมยุทธศาสตร์เครือข่ายคพสค. ณ พอช.






3 สิงหาคม 2569 ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง ณ พอช.

3.2.4 การจัดโครงสร้างการทำงานเครือข่ายองค์กรชุมชน

เพื่อให้เกิดทีมทำงานสนับสนุนชุมชนริมคลองเปรมประชากรและคลองลาดพร้าว มีการกำหนดประเด็นการทำงานทั้ง 5 ประเด็นงาน ดังนี้

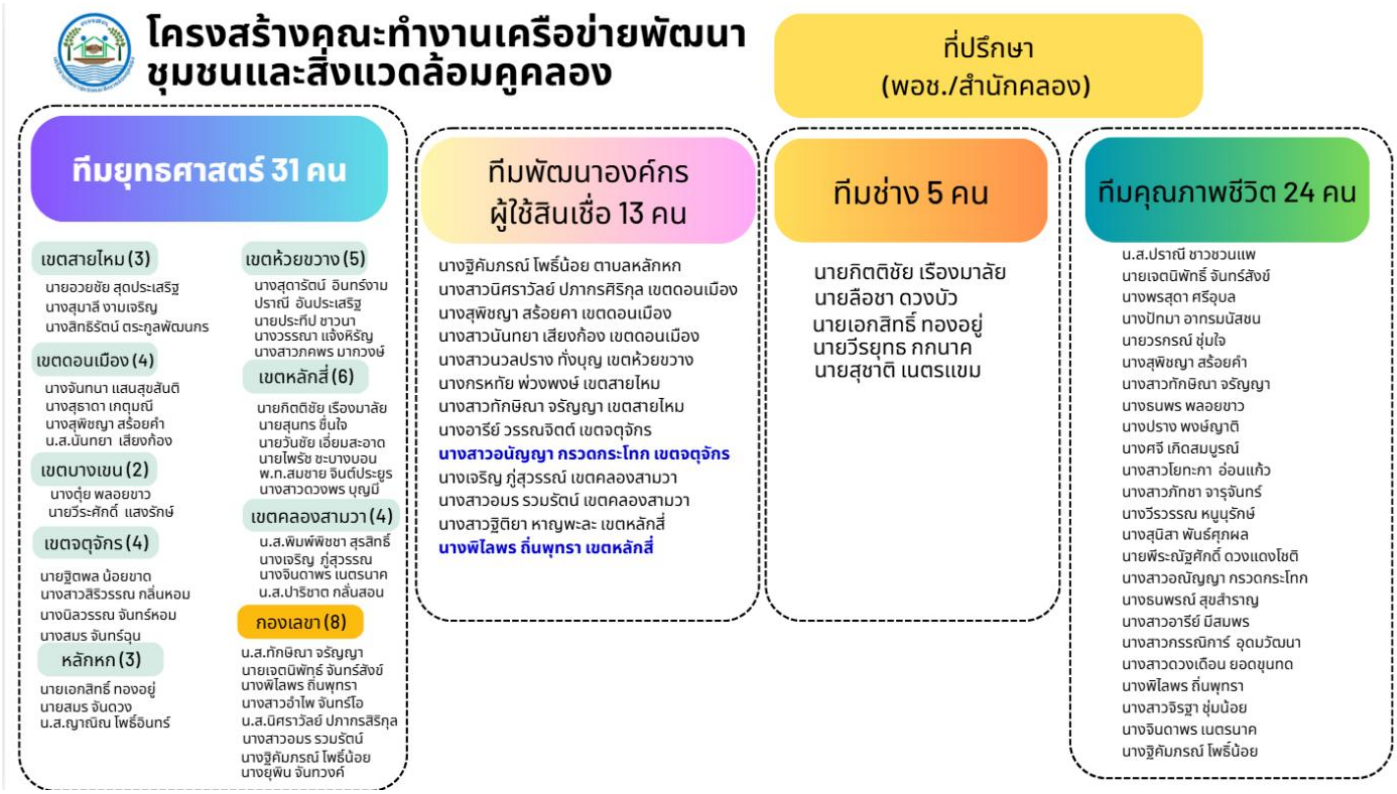

(1) **<u>ทีมยุทธศาสตร์เครือข่าย</u>** มีทีมทำงาน 31 คน มีบทบาทหน้าที่

- เสนอแนะนโยบายและแนวทางการดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองต่อเครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
- บริหาร กำกับ ดูแลการดำเนินงานให้บรรลุตามภารกิจของการพัฒนาที่อยู่อาศัย
- กำหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน แนวทาง และหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนทีมทำงานเพื่อดำเนินการการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
- ประสานความร่วมมือกับชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน ภาคีพัฒนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ตลอดจนช่วยคลี่คลายปัญหาข้อติดขัดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง



โดยมีข้อตกลง ให้มีการประชุมกรรมการเครือข่ายเป็นประจำทุก ๆ สองเดือน โดยให้มีการคัดเลือกผู้แทนคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานเพื่อดำเนินการประชุมครั้งนั้น ๆ มีรายชื่อดังนี้

คลองเปรมประชากร 12 คน		**คลองลาดพร้าว 19 คน**	
เขตจตุจักร	1.นางสมร จันทร์ฉุน 2.นางนิลวรรณ จันทร์หอม	เขตจตุจักร	1.นายฐิตพล น้อยจาด 2.นางสาวสิริวรรณ กลิ่นหอม
เขตหลักสี่	1.นายสุนทร ชื่นใจ 2.นายวันชัย เอี่ยมสะอาด 3.นายกิตติชัย เรืองมาลัย 4.นายไพรัช ชะบางบอน	เขตหลักสี่	1.นางสาวดวงพร บุญมี 2.พ.ท.สมชาย จินต์ประยูร
เขตดอนเมือง	1.น.ส.นันทยา เสียงก้อง 2.นางจันทนา แสนสุขสันติ 3.นางสุธาดา เจตมณี 4.นางสาวสุพิชญา สร้อยคำ	ปทุมธานี	1.น.ส.ญาณิณ โพธิ์อินทร์
ปทุมธานี	1.นายเอกสิทธิ์ ทองอยู่ 2.นายสมร จันทร์ดวง	เขตบางเขน	1.นายวีระศักดิ์ แสงรักษ์ 2.นางธนากร พลอยขาว
		เขตสายไหม	1.นายอวยชัย สุดประเสริฐ 2.นางสุมาลี งามเจริญ 3.นางสิทธิรัตน์ ตระกูลพัฒนกร
		เขตห้วยขวาง	1.นางสุดารัตน์ อินทร์งาม 2.นายประทีป ชาวนา 3.นางปราณี อันประเสริฐ 4.นางวรรณา แจ้งหิรัญ 5.นางสาวภคพร มากวงษ์
		เขตคลองสามวา	1.นางพิมพิชา สรุสิทธิ 2.นางเจริญ ภู่สุวรรณ 3.นางจินดาพร เนตรนาค 4.นางสาวปาริชาต กลั่นสอน

(2) <u>ทีมบริหารจัดการ(กองเลขานุการ)</u> มีทั้งหมด 8 คน มีบทบาทหน้าที่

- ทำงานกองเลขา ควบคุม ดูแลงบประมาณของแต่ละทีมงานตามแผนงานตามมติของกรรมการบริหารเครือข่าย ทีมเลขา ทีมสอบทาน ทีมตรวจงวดงาน ทีมพัฒนาคุณภาพชีวิต และอื่น ๆ ตามความเหมาะสมจำเป็น โดยให้สอดคล้องกับเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พร้อมทั้งติดตามการทำงาน จัดทำสรุปเอกสารการใช้งบประมาณ และการเก็บรักษาเงิน/ดูแลการใช้จ่ายตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
- ประสานงานและการจัดทำหนังสือ เพื่อติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน ชุมชน และทีมงานเครือข่าย
- บริหาร จัดการ ดูแล และอำนวยการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเครือข่าย อาทิ ประชุม การสัมมนา การศึกษาดูงานและเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดนิทรรศการหรือการเข้าร่วมงานพิธีต่าง ๆ

- รวบรวมสรุปผลการดำเนินงาน แผนงาน ปัญหาอุปสรรคในการทำงานของเครือข่าย ต่อกรรมการบริหารเครือข่าย และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
- ประสานงานหน่วยงานภายนอก สื่อสารประชาสัมพันธ์การทำงานของเครือข่าย

โดยมีข้อตกลง

- ให้มอบหมายผู้แทนคนหนึ่งทำหน้าที่เลขา เพื่อบันทึกการประชุม อำนวยการประชุม ประสานการทำงานของทีมเลขาเครือข่าย รวมไปถึงของกรรมการบริหารเครือข่าย
- ให้มีการประชุมทีมเลขาเครือข่ายเป็นอย่างน้อยเดือนละครั้ง โดยให้มีการคัดเลือกผู้แทนคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานเพื่อดำเนินการประชุมครั้งนั้น ๆ มีรายชื่อดังนี้

คลองเปรมประชากร 3 คน		**คลองลาดพร้าว 4 คน**		**ที่ดินใหม่ 1 คน**	
หลักสี่	นางพิไลพร ถิ่นพุทรา	จตุจักร	นางสาวอำไพ จันทร์โอ	คลองสามวา	นางสาวอมร รวมรัตน์
ดอนเมือง	น.ส.นิศราวัลย์ ปภากรศิริกุล	สายไหม	น.ส.ทักษิณา จรัญญา		
ปทุมธานี	นางฐิคัมภรณ์ โพธิ์น้อย	บางเขน	นายเจตนิพัฒน์ จันทร์สังข์		
		ห้วยขวาง	นางยุพิน จันทวงค์		

(3) <u>ทีมพัฒนาองค์กรการเงินผู้ใช้สินเชื่อ</u> มีทั้งหมด 13 คน มีบทบาทหน้า

- วางแผน ติดตาม และสอบทานการใช้งบประมาณการดำเนินการของชุมชนริมคลองให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
- ให้ความเห็นและสนับสนุนการทำงานของสหกรณ์และระบบการเงินบัญชีของสหกรณ์ชุมชนให้สอดคล้องกับการตรวจสอบของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อนำไปสู่การปิดบัญประจำปีของสหกรณ์ รวมถึงใช้ประกอบในการเบิกจ่ายงบประมาณงวดต่อไปตามแผนงานที่เสนอสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเห็นชอบไว้
- กรณีตรวจพบว่าไม่เป็นไปตามแผนงานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชีไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จะต้องมีการแจ้งให้สหกรณ์ชุมชนดำเนินการแก้ไขโดยทันที
- สนับสนุนให้เกิดระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสในการบริหารโครงการระดับชุมชน และส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีของระบบสหกรณ์ชุมชน
- ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานระดับชุมชน
- รวบรวมสรุปผลการดำเนินงาน แผนงาน ปัญหาอุปสรรคในการทำงานของเครือข่ายต่อกรรมการบริหารเครือข่าย และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนผ่านที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง

โดยมีข้อตกลง

- ให้มีการประชุมทีมสอบทานและสนับสนุนการบริหารจัดการเป็นอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
- ให้มีการคัดเลือกผู้แทนคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานเพื่อดำเนินการประชุมครั้งนั้น ๆ
- ให้มีผู้แทนเครือข่ายมาจากทุกเขตพื้นที่ในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยให้มีวาระการทำงาน 1 ปีหรือตามความเหมาะสม

รายชื่อคณะทำงาน ดังนี้

คลองเปรมประชากร 6 คน		**คลองลาดพร้าว 7 คน**	
เขตดอนเมือง	1.นางสาวนิศราวัลย์ ปภากรศิริกุล 2.นางสุพิชญา สร้อยคำ 3.นางสาวนันทยา เสียงก้อง	เขตจตุจักร	1.นางอารีย์ วรรณจิตต์ 2.นางสาวอนัญญา กรวดกระโทก
เขตหลักสี่	1.นางพิไลพร ถิ่นพุทรา 2.นางสาวฐิติยา หาญพะละ	เขตสายไหม	1.น.ส.ทักษิณา จรัญญา 2.นางกรหทัย พ่วงพงษ์
ปทุมธานี	1.นางฐิคัมภรณ์ โพธิ์น้อย	เขตคลองสามวา	1.นางเจริญ ภู่สุวรรณ์ 2.นางสาวอมร รวมรัตน์
		เขตห้วยขวาง	1.นางสาวนวลปราง ทั่งบุญ

(4) <u>ทีมช่างชุมชน</u> มีทั้งหมด 5 คน มีบทบาทหน้า

- วางแผน ติดตาม และตรวจสอบเกี่ยวกับการก่อสร้างบ้านมั่นคงชุมชนริมคลองให้เป็นไปตามแผนก่อสร้างที่ได้รับการอนุญาตจากหน่วยงาน และเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
- เป็นทีมตรวจงวดงาน ให้ความเห็นเกี่ยวกับการก่อสร้างของสหกรณ์ชุมชน เพื่อใช้ประกอบในการเบิกจ่ายงบประมาณงวดต่อไปตามสัญญาจ้างให้กับผู้รับเหมาก่อสร้าง
- กรณีตรวจพบว่าไม่เป็นไปตามแผนงานหรือแบบก่อสร้างจะต้องมีการแจ้งให้ผู้รับเหมาและสหกรณ์ดำเนินการแก้ไขโดยทันที
- สนับสนุนให้เกิดระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสในการบริหารโครงการระดับชุมชน และส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีของระบบการก่อสร้างของสหกรณ์ชุมชน
- ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานระดับชุมชน
- รวบรวมสรุปผลการดำเนินงาน แผนงาน ปัญหาอุปสรรคในการทำงานของเครือข่าย ต่อกรรมการบริหารเครือข่าย และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนผ่านที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง

โดยมีข้อตกลง

- ให้มีการประชุมทีมตรวจงวดงานและสนับสนุนการก่อสร้างเป็นอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง โดยให้มีการคัดเลือกผู้แทนคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานเพื่อดำเนินการประชุมครั้งนั้น ๆ
- ให้มีผู้แทนเครือข่ายทำหน้าที่ทีมตรวจทีมตรวจงวดงานและสนับสนุนการก่อสร้าง โดยให้มาจากการคัดเลือกของที่ประชุมกรรมการเครือข่าย มีองค์ประกอบจำนวนคนในทีมตรวจงวดงานและสนับสนุนการก่อสร้างมาจากทุกเขตพื้นที่ในสัดส่วนที่เหมาะสม
- ให้มีวาระการทำงาน 1 ปีหรือตามความเหมาะสม
- ให้มีการมอบหมายผู้แทนคนหนึ่งทำหน้าที่เลขา เพื่อบันทึกการประชุม อำนวยการประชุม ประสานการทำงานของทีมตรวจงวดงานและสนับสนุนการก่อสร้างด้วย

มีรายชื่อคณะทำงาน ดังนี้

คลองเปรมประชากร 3 คน		คลองลาดพร้าว 2 คน	
เขตจตุจักร	1.นายสุชาติ เนตรแขม	เขตสายไหม	1.นายวีรยุทธ กกนาค
เขตหลักสี่	1.นายกิตติชัย เรืองมาลัย	เขตห้วยขวาง	1.นายลือชา ดวงบัว
ปทุมธานี	1.นายเอกสิทธิ์ ทองอยู่		

(5) <u>ทีมพัฒนาคุณภาพชีวิต</u> 24 คน มีบทบาทหน้าที่

- ประสานงานหน่วยงานภาคี เข้ามาสนับสนุนชุมชนให้เกิดการพัฒนาต่อยอดจากการสร้างบ้าน
- สนับสนุนให้เกิดกลุ่มกิจกรรม ระดับชุมชน ระดับเขต เพื่อสมาชิกในชุมชนริมคลองเกิดการมีส่วนร่วม สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
- สนับสนุนให้องค์กรชุมชนเกิดการพัฒนาในมิติที่มากว่าคำว่าบ้าน เช่น พัฒนาอาชีพ รายได้ รวมถึง เชื่อมโยงสมาชิกกลุ่ม เด็กเยาวชน กลุ่มเปราะบาง ให้มีการดูแลกันในชุมชน
- พัฒนาโครงการให้สอดรับกับงานนโยบาย

โดยมีข้อตกลง

- ให้มีผู้แทนเครือข่ายเพื่อทำหน้าที่ทีมพัฒนาคุณภาพชีวิต มีองค์ประกอบจำนวนคนในทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตมาจากทุกเขตพื้นที่ในสัดส่วนที่เหมาะสม

คณะทำงานทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตและกองทุนรักษาดินรักษาบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2569 ได้รับการแต่งตั้งจากชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 24 คน ครอบคลุมการทำงานใน 7 เขตพื้นที่ 1 จังหวัด ได้แก่

1. เขตสายไหม
2. เขตดอนเมือง
3. เขตจตุจักร
4. เขตหลักสี่
5. เขตห้วยขวาง
6. เขตคลองสามวา
7. เขตบางเขน
8. จังหวัดปทุมธานี

รายชื่อคณะทำงาน ดังนี้

ที่	ชื่อ-สกุล			บทบาท/หน้าที่	พื้นที่เขต
1	นางสาว	ปราณี	ชาวสวนแพ	ผู้ประสานงานหลัก	สายไหม
2	นาย	เจตนิพัทธิ์	จันทร์สังข์	ทีมข้อมูล	บางเขน
3	นาง	พรสุดา	ศรีอุบล	ผู้ช่วยเลขานุการ	ดอนเมือง
4	นาง	ปัทมา	อาทรมนัสชน	ประชาสัมพันธ์	จตุจักร
5	นาย	วรกรณ์	ชุ่มใจ	เลขานุการ	หลักสี่
6	นาง	สุพิชญา	สร้อยคำ	คณะทำงานกองทุนชาติ	ดอนเมือง
7	นางสาว	ทักษิณา	จรัญญา	คณะทำงานกองทุนชาติ	สายไหม
8	นาง	ธนพร	พลอยขาว	ผู้ประสานงานเขต	บางเขน
9	นาง	ปราง	พงษ์ญาติ	ผู้ประสานงานเขต	สายไหม
10	นาง	ศจี	เกิดสมบูรณ์	ผู้ประสานงานเขต (คลองลาดพร้าว)	ดอนเมือง
11	นางสาว	โยทะกา	อ่อนแก้ว	ผู้ประสานงานเขต (คลองเปรมประชากร)	
12	นางสาว	ภัทชา	จารุจันทร์	ผู้ประสานงานเขต (คลองเปรมประชากร)	
13	นาง	วีรวรรณ	หนูนุรักษ์	ผู้ประสานงานเขต (คลองลาดพร้าว)	

ที่	ชื่อ-สกุล			บทบาท/หน้าที่	พื้นที่เขต
14	นาง	สุนิสา	พันธ์ศุภผล	ผู้ประสานงานเขต (คลองเปรมประชากร)	
15	นาย	พีระณัฐศักดิ์	ดวงแดงโชติ	ผู้ประสานงานเขต (คลองเปรมประชากร)	
16	นางสาว	อณัญญา	กรวดกระโทก	ผู้ประสานงานเขต (คลองลาดพร้าว)	จตุจักร
17	นาง	ธนพร	สุขสำราญ	ผู้ประสานงานเขต (คลองลาดพร้าว)	
18	นางสาว	อารีย์	มีสมพร	ผู้ประสานงานเขต (คลองลาดพร้าว)	
19	นางสาว	กรรณิการ์	อุดมวัฒนา	ผู้ประสานงานเขต (คลองเปรมประชากร)	
20	นางสาว	ดวงเดือน	ยอดขุนทด	ผู้ประสานงานเขต (คลองเปรมประชากร)	
21	นาง	พิไลพร	ถิ่นพุทรา	ผู้ประสานงานเขต (คลองเปรมประชากร)/ทีมข้อมูล	หลักสี่
22	นางสาว	จิรฐา	ชุ่มน้อย	ผู้ประสานงานเขต (คลองลาดพร้าว)	ห้วยขวาง
23	นาง	จินดาพร	เนตรนาค	ผู้ประสานงานเขต/ประชาสัมพันธ์	คลองสามวา
24	นาง	ฐิคัมภรณ์	โพธิ์น้อย	ผู้ประสานงานเขต	ปทุมธานี

3.2.5 การเชื่อมโยงการขับเคลื่อนงาน

(1) ศึกษาดูงานโครงการบ้านมั่นคง ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครือข่ายฯได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานโครงการบ้านมั่นคงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา โดยได้แลกเปลี่ยนกระบวนการทำงาน และรับฟังแนววิธีคิด วิธีการทำงานของพี่น้องเครือข่ายบ้านมั่นคงจาก 77 จังหวัด






17-19 ตุลาคม 2568 ร่วมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนการทำงาน
ณ โครงการบ้านมั่นคงในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา

(2) สัมมนาคณะทำงานพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน 5 ภาค (คพท.) เครือข่ายฯ ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนกระบวนการทำงาน และรับฟังแนววิธีคิด วิธีการทำงานของพี่น้องเครือข่าย คพท. 5ภาค และรับฟังแนวทางนโยบายการพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน เพื่อนำมาปรับใช้กับการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองในเขต กรุงเทพมหานคร



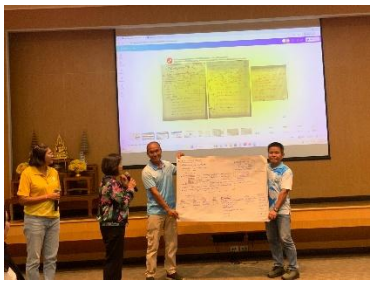

21 ตุลาคม 2568 สัมมนาคณะทำงานพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน 5 ภาค (คพท.) ณ พอช.

(3) ร่วมงานสัมมนาเครือข่ายสหกรณ์บ้านมั่นคง เครื่องมือการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง โดยเครือข่ายฯริมคลองได้เข้าร่วมงานเพื่อรับมอบรางวัลสหกรณ์ดีเด่น โดยมีนายธรรมนัส พรมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการมอบและให้แนวนโยบายการทำงานของสหกรณ์บ้านมั่นคงทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นให้เกิดเป็นสหกรณ์ประเภทที่ 8 คือ สหกรณ์ประเภท “เคหสถาน”




17 พฤศจิกายน 2568 ร่วมรับมอบรางวัลสหกรณ์บ้านมั่นคงดีเด่น
จำนวน 11 สหกรณ์ ณ อิมแพคเมืองทองธานี จ.นนทบุรี

(4) ร่วมแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนงานให้กับเจ้าหน้าที่ใหม่ของสถาบันฯ เครือข่ายฯ ได้ส่งผู้แทนงานประเด็นต่างๆ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนการทำงานของเครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลองให้กับเจ้าหน้าที่ พอช. ที่เริ่มการทำงาน เพื่อสร้างความเข้าใจกลไกการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานกับชุมชน




7 มกราคม 2569 ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานของเครือข่าย
ณ ชุมชนประชาร่วมใจ 1 เขตจตุจักร

(5) ร่วมรับมอบสุขภัณฑ์จากภาคีเอกชน ภายใต้โครงการ มอบสุขภัณฑ์เพื่อบ้านมั่นคง โดยเครือข่ายเข้าร่วมรับมอบสุขภัณฑ์ในห้องน้ำของ American Standard เพื่อนำไปติดตั้งให้กับโครงการบ้านมั่นคงริมคลอง และเป็นการผสานความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและชุมชนที่ดำเนินโครงการบ้านมั่นคง





28 มกราคม 2569 ร่วมรับมอบสุขภัณฑ์ American Standard ณ พอช.

(6) <u>ร่วมเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการ รับฟังสถานการณ์และข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของกลุ่มคนจนเมือง</u> เครือข่ายฯได้ร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนและเสนอแนะเกี่ยวกับการเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาภายใต้นโยบายของรัฐที่พึงมีต่อคนจนเมือง และร่วมสะท้อนปัญหาที่เกิดจากความเหลื่อมล้ำในพื้นที่



28-30 มกราคม 2569 ร่วมแลกเปลี่ยนเวทีสิทธิคนจนเมือง ณ โรงแรมเบสเวสเทิร์น นนทบุรี

(7) <u>เครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนการดูแลสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง</u> โดยได้แลกเปลี่ยนแนวทางในการดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีทาง SCG และ พอช. ร่วมกันรับฟังและร่วมออกแบบโครงการ ภายใต้การแนวคิดเสนองบประมาณโครงการผ่านกองทุนสิ่งแวดล้อม




27 กุมภาพันธ์ 2569 รวมรับฟังและแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม ณ พอช.

(8) <u>เครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง</u> ร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการการจัดการน้ำประเทศไทย พ.ศ. 2569 (Water as Leverage Academy Bangkok 2026: เมื่อ ‘คลอง’ คืออนาคตของกรุงเทพฯ) ณ สถานทูตเนเธอร์แลนด์ เพื่อแลกปลี่ยนและเสนอแนวทางการขับเคลื่อนเกี่ยวกับการจัดการน้ำในประเทศไทย ท่ามกลางความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ น้ำท่วม และการขยายตัวของเมือง Water as Leverage Academy Bangkok 2026 ชวนกรุงเทพมหานครมอง ‘น้ำ’ ในมิติใหม่ ไม่ใช่เพียงปัญหาที่ต้องจัดการ แต่เป็นโอกาสในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ภายใต้หัวข้อ The Bangkok Canals Regeneration มุ่งฟื้นฟูคลองกรุงเทพฯ ให้กลับมามีบทบาทมากกว่าทางระบายน้ำ โดยมองคลองเป็นทั้งพื้นที่สาธารณะ ระบบนิเวศเมือง โครงสร้างพื้นฐานสีเขียว และกลไกสำคัญในการรับมือกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ หัวใจสำคัญของโครงการคือการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ นักวิชาการ นักออกแบบ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำ ภาคเอกชน และชุมชน เพื่อร่วมออกแบบอนาคตของเมืองผ่านแนวคิด Nature-based Solutions และการพัฒนาเมืองที่อยู่ร่วมกับน้ำได้อย่าง

สมดุล และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำระดับโลกจากเนเธอร์แลนด์แล้ว โครงการยังมุ่งสร้างต้นแบบ แนวทาง และเครือข่ายความร่วมมือที่สามารถนำไปต่อยอดสู่การพัฒนาคลองและพื้นที่ชุมชนทั่วกรุงเทพมหานคร



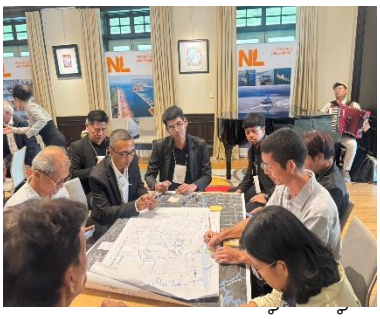

11 มิถุนายน 2569 ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการน้ำประเทศไทย ณ สถานทูตเนเธอร์แลนด์

(9) <u>เครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง</u> ร่วมกิจกรรมโครงการ “เวทีพลังองค์กรชุมชน สร้างสังคมไทยไปด้วยกัน” วันที่ 29- 30 มิถุนายน 2569 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อรับฟังนโยบาย ร่วมแลกเปลี่ยนและออกแบบอนาคตเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน โดยมีนายนิกร โสมกลาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในงาน





29-30 มิถุนายน 2569 ร่วมรับฟังนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านที่อยู่อาศัย ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์

(10) <u>เครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง</u> ร่วมกิจกรรมรับมอบเรือให้ชุมชนมิตรประชาพัฒนา ชุมชนแจ้งวัฒนะ 5 เพื่อประกอบการวิสาหกิจชุมชนริมคลองเปรมประชากร ณ ชุมชนมิตรประชาพัฒนา เขตหลักสี่ โดยมี มูลนิธิพุทธรักษา มูลนิธิโลตัส ร่วมกับภาคีหน่วยงาน สำนักงานเขตหลักสี่ สก. เขตหลักสี่ สถาบันอาศรมศิลป์ มูลนิธิธนินท์เทวี เจียรวนนท์ Urban Action เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน





8 สิงหาคม 2569 ร่วมรับมอบเรือเพื่อวิสาหกิจชุมชนคลองเปรมประชากร

(11) <u>เครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง</u> ร่วมกิจกรรมโครงการ “การจัดการระบบการเงินรายครัวเรือน เพื่อส่งเสริมการบริหารของกลุ่ม/สหกรณ์ชุมชนริมคลองอย่างมีธรรมาภิบาล” ณ โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อวางแผนการเงินครัวเรือนจะมุ่งสู่การจัดการระบบสหกรณ์ได้ ทั้ง 52 องค์กรในพื้นที่ชุมชนริมคลอง พอช.ให้ความสำคัญกับการสร้างทุนและวินัยการ

ออมทรัพย์ ระบบการบริหารของชุมชน ซึ่งเป็นหลักประกัน และเครื่องพิสูจน์ให้กับชุมชน ในการช่วยเหลือ ทั้งนี้ เมื่อที่อยู่อาศัยมั่นคงจะทำอย่างไรให้ชุมชนมีระบบการบริหารที่ดี มีการจัดสวัสดิการและสร้างคุณภาพชีวิตให้มั่นคง ยั่งยืนได้จะขึ้นอยู่กับระบบการบริหารของกลุ่มองค์กร



19 กรกฎาคม 2569 รวมกิจกรรมโครงการ “การจัดการระบบการเงินรายครัวเรือน เพื่อส่งเสริมการบริหารของกลุ่ม/สหกรณ์ชุมชนริมคลองอย่างมีธรรมาภิบาล” ณ โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

(12) <u>เครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง ร่วมกิจกรรมการสัมมนาสรุปบทเรียนและออกแบบทิศทางการพัฒนาสหกรณ์บ้านมั่นคง "นักบัญชีอาสา"</u> ณ ห้องประชุมไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)รายงานผลการดำเนินงาน พร้อมพร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนการดำเนินงานที่ผ่านมา รายภาคโดยนักบัญชีอาสา 24 คน เข้าสถานการณ์พื้นที่ที่มีปัญหาข้อติดขัด 5 ภาค / 3 เครือข่ายโดยแต่ละภาคจะทำข้อมูลสถานการณ์ปัญหารายพื้นที่ โดยผู้แทนเครือข่ายแต่ละภาคแบ่งกลุ่มย่อยออกแบบแผนปฏิบัติการรายภาค / เครือข่าย พร้อมนำเสนอ โดยกำหนดพื้นที่ปฏิบัติการนำร่องให้น้ำหนักพื้นที่ที่สามารถปฏิบัติการได้ทันที/ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงปัญหารายเคสพร้อมทำแผนรายเคสและระบุคนทำงาน และระยะเวลาการดำเนินงาน ตั้งเป้าหมายทั้งหมด 3 เดือน โดยมีวิธีการดำเนินงานและแผนพัฒนาศักยภาพประกอบ



17 กรกฎาคม 2569 แลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนงาน “นักบัญชีอาสา” กับเครือข่ายภาคกรุงเทพฯ

(13) <u>เครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง</u> ร่วมกิจกรรมประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง พร้อมมอบบ้านแก่สมาชิกโครงการบ้านมั่นคงริมคลองจำนวน 89 หลัง ภายใต้แนวคิด “Better Home Better Life : บ้านที่มากกว่าบ้าน” มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อยและเติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาเมืองได้อย่างมั่นคง



22 กรกฎาคม 2569 ร่วมแลกเปลี่ยนและแสดงความยินดีในการมอบบ้านชุมชนสามัคคีเทวสุนทร

(14) <u>เครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง</u> ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง ณ ห้องประชุมไพบูลย์ศิริวัฒนธรรม ชั้น 1 พอช. เพื่อทิศทางการขับเคลื่อนงานหลัก นโยบาย 8 ด้าน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ ทิศทางการขับเคลื่อนงานของ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) แผน 5 ปี และทบทวนการทำงานในเขตพื้นที่ดำเนินการของชุมชนริมคลอง 8 พื้นที่ และการขับเคลื่อนงานเครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคู่ครองปี 2569



3 สิงหาคม 2569 กิจกรรมทบทวนและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานเครือข่าย คพสค.ปี 2570

(15) <u>เครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง ร่วมกิจกรรมสัมนาพัฒนาศักยภาพ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง เครือข่ายภาคกทม.ปริมณฑลและตะวันออก และเครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง</u> ณ อง ประชุมอาจารย์ไพบูลย์ ชั้น 1 พอช. แลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนงานด้านที่อยู่อาศัย เพื่อการพัฒนาในมิติต่างๆ โดยชุดข้อมูล ได้มาจากการขับเคลื่อนงานในพื้นที่และเวทีสรุปผลดำเนินงานพัฒนาองค์กรผู้ใช้สินเชื่อ และการดำเนินงานด้านองค์กรการเงินในชุมชน



9 สิงหาคม 2569 ร่วมแลกปลี่ยนและเสนอแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านสหกรณ์

(16) <u>เครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง ร่วมกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ"การวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน"</u> ณ สหกรณ์เคหสถานคลองลัดภาชีร่วมพัฒนา จำกัด เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ




10 สิงหาคม 2569 ร่วมแสดงความยินดีและรับมอบโครงการพลังงานทดแทน

(17) <u>เครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง ร่วมกิจกรรมเตรียมข้อมูลเวทีปลดล็อคเมืองเหลื่อมล้ำพลิกนโยบายคืนสิทธิที่อยู่อาศัยคนจนเมือง</u> ซึ่งจัดในวันที่ 18 สิงหาคม ณ ชั้น 1 พอช. โดยมีเป้าหมายเพื่อทบทวนและเสนอแนวทางการพัฒนาเรื่องที่อยู่อาศัยของคนจนในเมือง โดยมีเครือข่ายจากทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 200 คน




11 สิงหาคม 2569 ร่วมหารือยกร่างแนวนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยุ่อาศัยของกลุ่มคนจนเมือง

(18) <u>เครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง ได้เข้าร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขับเคลื่อนประเด็นด้านที่อยู่อาศัยและการพัฒนาชุมชน</u> โดยมีการนำเสนอและแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านที่อยู่อาศัย การสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมของตนเอง รวมทั้งการเชื่อมโยงข้อเสนอจากภาคประชาชนไปสู่การพัฒนานโยบายและการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคีที่เกี่ยวข้อง





18 สิงหาคม 2569 “Unlock เมืองเหลื่อมล้ำ พลิกนโยบาย คืนสิทธิ์ที่อยู่อาศัยให้คนจนเมือง”

3.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลอง

เป้าหมายการดำเนินงาน

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เกิดกลุ่มกิจกรรม ระดับชุมชน ระดับเขต โดยมีการจัดกิจกรรมสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้
2. ประสานงานหน่วยงานภาคี เข้ามาสนับสนุนชุมชนให้เกิดการพัฒนาต่อยอดจากการสร้างบ้าน
3. สร้างหลักประกันความเสี่ยง และความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย ในการใช้เป็นทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือสมาชิก
4. เสริมสร้างทักษะและศักยภาพของผู้นำและสมาชิกชุมชนผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ
5. สร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี และความร่วมมือระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์กร หรือชุมชน

<u>แผนกิจกรรมการดำเนินงาน</u>

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)
1	แผนที่จุดเช็คพ้อย ของดีในชุมชน/เส้นทาง	มีนาคม 2569	20,000
2	พัฒนาอาชีพการเชื่อมโยงเครือข่าย (ดอกไม้จันท์ ยาหม่อง ปลูกผักฯลฯ)	เมษายน 2569	25,000
3	กิจกรรมช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง/ติดตามเคสเดิม	พฤษภาคม 2569	25,000
4	กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์กีฬาสี	กรกฎาคม 2569	30,000
5	ศึกษาดูงาน วิสาหกิจชุมชน/ท่องเที่ยวชุมชน	สิงหาคม 2569	ร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายฯ
6	กิจกรรมประชาสัมพันธ์ (กองทุนรักษาดินรักษาบ้าน)	พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม 68	บริหาร 20 บาท จากสมาชิก
7	กิจกรรมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ	กันยายน 68 ถึงกรกฎาคม 69	งบจากสำนักทุนฯ
8	เปิดพื้นที่รูปธรรม	กันยายน 2568 ถึงกรกฎาคม	งบจากสำนักทุนฯ
9	การประชุมทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตและกองทุน	กุมภาพันธ์ ถึง กันยายน 69	50,000
รวมทั้งสิ้น (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)			**150,000**

3.3.1 ผลการดำเนินกิจกรรมยกระดับคุณภาพชีวิต

(1) ทีมงานพัฒนาคุณภาพชีวิตนวัตกรรมสื่อ และกองทุน มีการดำเนินการร่วมกับเครือข่ายการดำเนินงาน 8 เขตพื้นที่ โดยขณะนี้ผู้ประสานงานของทุกเขตพื้นที่ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดเตรียมทำข้อมูลการท่องเที่ยว ของดีในชุมชนแล้ว จำนวน 86 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 40 ชุมชน และมีแผนในการดำเนินงานต่อเนื่องในปี 2570 จำนวน 46 ชุมชน



พื้นที่	ภาพรวมชุมชน	ดำเนินการแล้ว ปี 69	แผนดำเนินงาน ปี 70	ชุมชนที่ต้องดำเนินการ
หลักสี่	18	11	7	ชช.ก้าวหน้า, ชช.เปรมประชาพัฒนา, ชช.คนรักถิ่น, ชช.เปรมสุขสันต์ ชช.อยู่ดีมีสุข ชช.ร่วมพัฒนา ชช.อยู่แล้วรวย
ดอนเมือง	15	13	2	ชช.ร่วมมิตรแรงศรัทธา, ชช.ประชากร 4
บางเขน	8	5	3	ชช.พัฒนาเหนือ ชช.พัฒนาใต้ ชช.ร่วมใจพัฒนาเหนือ
สายไหม	10	1	9	ชช.เพิ่มสินร่วมใจ, ชช.กสบ. 3 กลุ่ม, ชช.ศาลเจ้าพ่อสมบุญ 54, ชช.พัฒนาหมู่ 1 และ 2, ชช.ประชานุกูล, ชช.สนามมวย กอ.พัฒนา, ชช.ริมคลองสอง, ชช.เลียบคลองสองสามัคคี
คลองสามวา	6	4	2	ชช.บ้านใหม่พัฒนา ชช.โรงช้าง
จตุจักร	14	5	9	ชช.ประชาร่วมใจ 1, ชช.สามัคคีเกวสุนทร, ชช.วัดบางบัว, (ชุมชนภายใต้สหกรร์เพื่อที่อยู่อาศัย 8 ชุมชน)
ปทุมธานี	3	1	2	ชช.ตำบลหลักหก, ชช.คลองสามแสนสุข
ห้วยขวาง	12	0	12	ทุกชุมชน
สรุป	86	40	46	

(2) ทีมงานพัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมสื่อ และกองทุนได้ดำเนินโครงการสร้างพื้นที่เศรษฐกิจในชุมชน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการสร้างรายได้ของชุมชนและออกแบบพื้นที่ให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมไปถึงเป็นการบริหารพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งในชุมชนริมคลอง (คลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร) ได้ดำเนินการโครงการบ้านมั่นคง มีการก่อสร้างบ้าน พัฒนาพื้นที่ชุมชนแล้วเสร็จในหลายชุมชน และมีความพร้อมในการพัฒนาพื้นที่ที่มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชน การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ จึงเป็นอีกกิจกรรมที่มีการออกแบบและประสงค์ที่จะทำในหลายชุมชน เนื่องจากชุมชนแต่ละชุมชนมีศักยภาพด้านภูมิศาสตร์ที่ตั้ง ไม่ว่าจะติดกับวัด โรงเรียน ตลาด รวมไปถึงสถานีรถไฟฟ้า โรงแรม ย่านเศรษฐกิจต่างๆ ทำให้แนวคิดเรื่องการพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้เป็นสวนผัก และการทำดอกไม้จันท์ ยาหม่อง เพื่อลดรายจ่ายสร้างรายได้ เพื่อยกระดับชุมชนต่อไป

ภาพถ่ายการดำเนินกิจกรรม

1.การจัดทำดอกไม้จันทน์










2.การทำยาหม่องสมุนไพร






3.การปลูกผักในชุมชน








(3) การติดตามช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง โดยการดำเนินการสำรวจกลุ่มผู้เปราะบางในชุมชน โดยทีมคุณภาพชีวิต นวัตกรรมสื่อ และกองทุน การลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเปราะบาง เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือเยียวยา กลุ่มผู้เปราะบาง และจะมีการเชื่อมโยงร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติม โดยในปัจจุบันได้มีการจัดทำข้อมูลกลุ่มเปราะบางทั้งในคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร เพื่อเป็นฐานการจัดเก็บข้อมูลและส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การขอรับการช่วยเหลือ รวมไปถึงออกแบบการหนุนเสริมให้เกิดกิจกรรมพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้เปราะบางในชุมชนริมคลอง









(4) การจัดการเชื่อมโยงกีฬาสีสัมพันธ์ เครือข่าย คพสค. กีฬาสัมพันธ์เครือข่าย คพสค คัพ ครั้งที่ 2 ร่วมกับสำนักงานภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก โดยมีแผนจัดกิจกรรมในวันที่ 30 สิงหาคม 2569 ณ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง เขตดอนเมือง ซึ่งมีรายละเอียด คือ




(5) การประชาสัมพันธ์กองทุนรักษาดินรักษาบ้าน โดยทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตและกองทุนรักษาดินรักษาบ้าน ได้กำหนดกระบวนการดำเนินงานประจำปีอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. การประชาสัมพันธ์ ในช่วงเดือน ตุลาคม ของทุกปี คณะทำงานจะดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้สมาชิกชุมชนริมคลองและองค์กรชุมชนต่าง ๆ ทราบถึงเกณฑ์การสนับสนุนของกองทุนรักษาดินรักษาบ้าน รวมถึงสิทธิประโยชน์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง


2. การรับสมัครและรวบรวมเอกสาร ในช่วงเดือน มกราคม คณะทำงานจะเปิดรับสมัครและดำเนินการเก็บรวบรวมเอกสารใบสมัครจากองค์กรชุมชนที่ประสงค์เข้าร่วมกองทุน

3. การบันทึกและจัดทำข้อมูลหลังจากได้รับเอกสารสมัครครบถ้วน คณะทำงานจะดำเนินการตรวจสอบและคีย์ข้อมูลเข้าสู่ระบบของกองทุนรักษาดินรักษาบ้าน เพื่อความถูกต้องและครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด

4. การส่งข้อมูลและเงินสมทบคณะทำงานจะดำเนินการจัดส่งข้อมูลพร้อมเงินสมทบไปยังกองทุนระดับชาติ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด

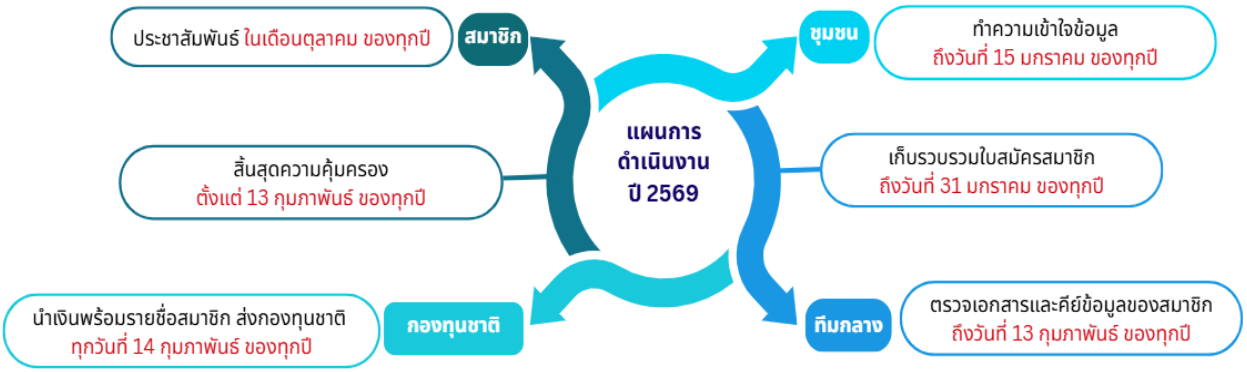

โดยมีระบบการประสานงาน และการจัดส่งเอกสาร ดังนี้

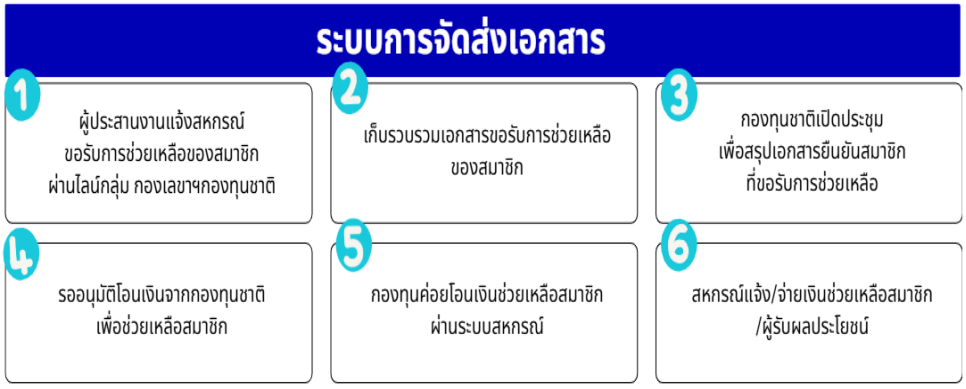

จากการเปิดรับสมัครสมาชิกในปี พ.ศ. 2569 พบว่ามีผู้เข้าร่วมจากชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร รวมทั้งสิ้น 22 องค์กรชุมชน ครอบคลุมพื้นที่ดำเนินงาน 8 เขตพื้นที่ โดยมีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 518 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

- สมาชิกที่ใช้สินเชื่อกับ พอช. จำนวน 454 คน
- สมาชิกที่ไม่ใช้สินเชื่อกับ พอช. จำนวน 64 คน

ซึ่งการเข้าร่วมของสมาชิกในปี 2569 มากขึ้นจากปี 2568 แสดงให้เห็นถึงความความร่วมมือของชุมชนในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนรักษาดินรักษาบ้าน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกันอย่างยั่งยืน การให้ความช่วยเหลือกองทุนรักษาดินรักษาบ้าน ณ.มกราคม - กรกฎาคม 2569 มีการพิจารณาอนุมัติการเบิกเงินช่วยเหลือแก่สมาชิกกองทุนรักษาดินรักษาบ้านจากกองทุนชาติ รวมทั้งสิ้น 7 ราย



3.4 การพัฒนาคุณภาพองค์กรผู้ใช้สินเชื่อ

สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ได้จัดทำแผนบริหารและพัฒนาองค์กรผู้ใช้สินเชื่อ ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ปี 2569 ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีปัญหาและการพัฒนาองค์กรผู้ใช้สินเชื่อ โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพองค์กรผู้ใช้สินเชื่อเป็นไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนที่ดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลอง สร้างความสามารถในการบริหารจัดการสินเชื่อภายในองค์กรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้มีความมั่นคง โดยมีแผนงานดังนี้

ลำดับ	กิจกรรม	องค์กรกลุ่มเป้าหมาย/	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	ประชุมคณะทำงานฯ วิเคราะห์สถานะองค์กรผู้ใช้สินเชื่อที่มีปัญหาการชำระคืนและรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาสินเชื่อ ปี 2569	52 องค์กร	**52,000.-**	มกราคม-กันยายน 2569
2	<u>สนับสนุนแผนการบริหารจัดการที่ดี</u> 2.1 สนับสนุนการแก้ไขปัญหา NPL (เพื่อฟื้นฟูองค์กรผู้ใช้สินเชื่อ)	22 องค์กร/8 พื้นที่	**208,000.-** 55,500.-	มกราคม-กันยายน 2569
	2.2 สอบทานบัญชี สนับสนุนพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้สินเชื่อ(หนุนเสริมการบริหารจัดการที่ดี)	24 องค์กร/8 พื้นที	70,000.-	มกราคม-กันยายน 2569
	2.3 ประชุมสร้างความเข้าใจ / วิเคราะห์	52 องค์กรๆละ 2 คน	71,200.-	กุมภาพันธ์-มีนาคม 2569
	2.4 สรุป และประมวลผล	คณะทำงาน 13 คน	11,300.-	กันยายน 2569
รวมทั้งสิ้น (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)			260,000.-	

3.4.1 ประชุมคณะทำงานฯ วิเคราะห์สถานะองค์กรผู้ใช้สินเชื่อที่มีปัญหาการชำระคืนและรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาสินเชื่อ ปี 2569

การขับเคลื่อนการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนริมคลองได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ผ่านการทำงานของคณะทำงานติดตาม สอบทาน และตรวจงวดงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ซึ่งคณะอนุกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ได้เสนอผู้อำนวยการแต่งตั้งขึ้น ทำหน้าที่กำกับ ดูแล ตรวจสอบ และสอบทานการใช้งบประมาณ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด กลไกดังกล่าวนับเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองอย่างเข้มแข็ง โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้สินเชื่อ ได้มีการจัดตั้งทีมฟื้นฟูคุณภาพองค์กรในระดับเครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง จำนวน 13 คน เพื่อปฏิบัติงานร่วมกับสถาบัน และคณะทำงาน โดยมีการกระจายบทบาทความรับผิดชอบไปยังเครือข่ายคลองระดับเขตทั้ง 8 เขต เพื่อทำหน้าที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูคุณภาพองค์กร ทั้งในด้านทุน อาชีพ และเศรษฐกิจ ครอบคลุมองค์กรผู้ใช้สินเชื่อกลุ่มเป้าหมายตามตัวชี้วัด จำนวน 52 องค์กร รวมถึงองค์กรที่ยังไม่ได้เสนอขอใช้วงเงินสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพ จำนวน 4 องค์กร ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าวมีการประชุมวางแผนและติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ จำนวน 8 ครั้ง



3.4.2 สนับสนุนการแก้ไขปัญหา NPL (เพื่อฟื้นฟูองค์กรผู้ใช้สินเชื่อ)

การจัดประชุมคณะทำงานฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการปรับโครงสร้างหนี้และวางแนวทางการฟื้นฟูองค์กรผู้ใช้สินเชื่อในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม เพื่อให้การฟื้นฟูสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คณะทำงานฯ ได้ลงพื้นที่สนับสนุนชุมชน/องค์กร ในพื้นที่ จำนวน 2 องค์กร ประกอบด้วย ชุมชนสามัคคีร่วมใจ เขตบางเขน กลุ่มออมทรัพย์เคหะชุมชนคลองบางเขน เขตสายไหม โดยได้ประสานความร่วมมือจากชุมชน เครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง ร่วมดำเนินการด้วย





3.4.3 สอบทานบัญชี สนับสนุนพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้สินเชื่อ (หนุนเสริมการบริหารจัดการที่ดี)

สนับสนุนกลไกการบริหารและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้สินเชื่อให้กับกลุ่ม/สหกรณ์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี สนับสนุนการติดตาม สอบทานบัญชี การดำเนินการโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน จำนวน 5 องค์กร ประกอบด้วย 1) สหกรณ์เคหสถานริมคลองพัฒนา จำกัด เขตสายไหม 2) สหกรณ์เคหสถานบ้านเราสายไหม 50 จำกัด เขตคลองสามวา 3) สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงบ้านใหม่พัฒนา จำกัด เขตคลองสามวา 4) สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนหลังแฟลตร่วมพัฒนา จำกัด เขตหลักสี่ และ 5) สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงรัชดาร่วมใจ จำกัด เขตห้วยขวาง โดยมุ่งเน้นการติดตามและฟื้นฟูองค์กรผู้ใช้สินเชื่อที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งการติดตามสถานะองค์กรที่มีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL การชำระคืนอย่างต่อเนื่อง โดยมีการดำเนินงานทั้งในเชิงป้องกันและแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำระบบและรายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะ ทั้งในส่วนของการบริหารจัดการหนี้ การพัฒนาศักยภาพองค์กร การให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการและสมาชิกองค์กรผู้ใช้สินเชื่อ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการด้านการเงินและการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล













3.4.4 ประชุมสร้างความเข้าใจ / วิเคราะห์ชุมชนและองค์กรผู้ใช้สินเชื่อ







การดำเนินงานในปี พ.ศ. 2569 ได้มีการจัดประชุมหารือและวางแผนการดำเนินงานของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2569 ณ สหกรณ์เคหสถานประชากร 3 จำกัด เขตดอนเมือง โดยมีความร่วมมือจากการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง สำนักสินเชื่อ สำนักตรวจสอบ และสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงิน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานในเชิงระบบ โดยเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูล การประสานความร่วมมือ และการแผนการติดตามผลร่วมกัน ซึ่งมุ่งหวังเพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงให้มีความเข้มแข็ง โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล

- วันที่ 31 มีนาคม 2569 มีเวที “โครงการประชุมคณะทำงานภาคีเครือข่ายสหกรณ์บ้านมั่นคงระดับจังหวัดและประชุมเครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง” รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์
- วันที่ 6 มิถุนายน 2569 การประชุมประเมินผลการดำเนินงานและจัดทำแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีของกลุ่มออมทรัพย์และสหกรณ์
- วันที่ 9 สิงหาคม 2569 การประชุม "สัมมนาพัฒนาศักยภาพ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเครือข่ายภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก และเครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง"

3.4.5 สรุป และประมวลผล

สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ได้ดำเนินการพัฒนาองค์กรผู้ใช้สินเชื่อ ร่วมกับสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงิน โดยมีการจัดกลุ่มความเข้มแข็งขององค์กรตามเกณฑ์ด้านการบริหารจัดการและการปิดบัญชี โดยมีเป้าหมาย 52 องค์กร แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

ระดับ	การประเมินความเข้มแข็งขององค์กร
A	**องค์กรที่มีความเข้มแข็งมาก ปิดบัญชีได้เป็นปัจจุบัน** โดยเป็นชุมชนที่มีระบบการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง มีคนทำงาน มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการมีบทบาทและสมาชิกมีส่วนร่วมกับโครงการ โดยการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ผลประกอบการสหกรณ์มีกำไร และจัดสวัสดิการให้สมาชิก
B	**องค์กรที่มีความเข้มแข็งกลาง ปิดบัญชีได้ แต่มีปัญหาในการบริหารจัดการองค์กร** คนทำงาน/คณะกรรมการมีบทบาทน้อย สมาชิกบางส่วนขาดการมีส่วนร่วม การประชุมสมาชิกเป็นครั้งคราว โดยสามารถแก้ไขปัญหาได้
C	**องค์กรที่มีความเข้มแข็งน้อย ปิดบัญชีไม่ได้ มีหนี้ผิดนัดชำระ** เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการองค์กร โดยเป็นชุมชนที่ไม่มีคนทำงาน ขาดการมีส่วนร่วมของสมาชิก ระบบบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน และไม่สามารถปิดบัญชีได้ต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลจากการจัดกลุ่มความเข้มแข็งองค์กร เป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการวางแผนสนับสนุนการจัดทำบัญชี การพัฒนาผู้นำด้านความรู้ทางบัญชีและทักษะอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการองค์กร การเชื่อมโยงผู้นำที่มีความรู้และประสบการณ์สูงไปสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการชุมชนอื่น ๆ ภายในโครงการ เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพองค์กรผู้ใช้สินเชื่อเป็นไปอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

ตารางรายงานระดับความเข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้สินเชื่อ

ระดับความเข้มแข็ง		องค์กรผู้ใช้สินเชื่อ 52 องค์กร		พื้นที่
ด้านการจัดทำบัญชี	ด้านการบริหารจัดการ			
ระดับ A	A	1	สหกรณ์เคหสถานร่มไทรงามพัฒนา จำกัด	ดอนเมือง
ระดับ A	A	2	สหกรณ์เคหสถานชุมชนปู่เจ้าสมิงพรายสะพานปูนดอนเมือง จำกัด	ดอนเมือง
ระดับ A	B	3	สหกรณ์เคหสถานวัดดอนเมืองด้านเหนือ จำกัด	ดอนเมือง
ระดับ A	A	4	สหกรณ์เคหสถานเทวมั่นคง จำกัด	หลักสี่
ระดับ A	A	5	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองลาดพร้าวจตุจักร จำกัด	จตุจักร
ระดับ A	A	6	สหกรณ์เคหสถานประชาร่วมใจ 2 จำกัด	จตุจักร
ระดับ A	A	7	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนพหลโยธิน 32 จำกัด	จตุจักร
ระดับ A	A	8	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงห้วยขวาง จำกัด	ห้วยขวาง
ระดับ A	A	9	สหกรณ์เคหสถานบ้านเราสายไหม 50 จำกัด	คลองสามวา
ระดับ A	A	10	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงลาดพร้าวสามัคคี จำกัด	คลองสามวา
ระดับ A	A	11	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จำกัด	ปทุมธานี
ระดับ A	B	12	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนหลักหก จำกัด	ปทุมธานี
ระดับ A	B	13	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองสามแสนสุข จำกัด	ปทุมธานี
ระดับ B	B	14	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเพิ่มทรัพย์สินสมบุญ จำกัด	สายไหม
ระดับ B	B	15	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงริมคลองพัฒนา จำกัด	สายไหม
ระดับ B	B	16	กลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยบางบัว (หลังกองการภาพ)	บางเขน
ระดับ B	C	17	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงยิ่งเจริญก้าวหน้า จำกัด	บางเขน
ระดับ B	B	18	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนสามัคคีร่วมใจ 2	บางเขน
ระดับ B	A	19	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา จำกัด	ดอนเมือง
ระดับ B	A	20	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเปรมประชาสมบูรณ์ จำกัด	ดอนเมือง
ระดับ B	A	21	สหกรณ์เคหสถานประชากร 3 จำกัด	ดอนเมือง
ระดับ B	A	22	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงประเสริฐเปรมประชา จำกัด	ดอนเมือง

ระดับความเข้มแข็ง		องค์กรผู้ใช้สินเชื่อ 52 องค์กร		พื้นที่
ด้านการจัดทำบัญชี	ด้านการบริหารจัดการ			
ระดับ B	A	23	สหกรณ์เคหสถานตาลคู่สมบูรณ์พูนทรัพย์ จำกัด	ดอนเมือง
ระดับ B	A	24	สหกรณ์เคหสถานทำนบสตรีเหล็กร่วมพัฒนา จำกัด	ดอนเมือง
ระดับ B	B	25	สหกรณ์เคหสถานสะพานไม้ 2 จำกัด	หลักสี่
ระดับ B	B	26	สหกรณ์เคหสถานเพื่อที่อยู่อาศัยบางบัวเชิงสะพานไม้ 1 จำกัด	หลักสี่
ระดับ B	C	27	สหกรณ์เคหสถานชายคลองบางบัว จำกัด	หลักสี่
ระดับ B	B	28	สหกรณ์เคหสถานศิษย์หลวงปู่ขาว จำกัด	หลักสี่
ระดับ B	B	29	สหกรณ์เคหสถานพัฒนา 99 มีสุขร่วมใจ จำกัด	หลักสี่
ระดับ B	B	30	สหกรณ์เคหสถานตลาดหลักสี่ จำกัด	หลักสี่
ระดับ B	B	31	สหกรณ์เคหสถานชุนชนมิตรประชาพัฒนา จำกัด	หลักสี่
ระดับ B	B	32	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนหลังแฟลตร่วมพัฒนา จำกัด	หลักสี่
ระดับ B	B	33	สหกรณ์เคหสถานคลองเปรมประชาพัฒนา จำกัด	หลักสี่
ระดับ B	B	34	สหกรณ์เคหสถานแจ้งวัฒนะ 5 จำกัด	หลักสี่
ระดับ B	B	35	สหกรณ์เคหสถานชุมชนประชาร่วมใจ 1 จำกัด	จตุจักร
ระดับ B	B	36	กลุ่มออมทรัพย์ริมคลองพัฒนาบางบัว	จตุจักร
ระดับ B	B	37	สหกรณ์เคหสถานสามัคคีเทวสุนทร จำกัด	จตุจักร
ระดับ B	A	38	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา	ห้วยขวาง
ระดับ B	B	39	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงสิทธิชุมชนคนริมคลอง จำกัด	คลองสามวา
ระดับ B	B	40	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงบ้านใหม่พัฒนา จำกัด	คลองสามวา
ระดับ C	C	41	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงริมคลองสอง จำกัด	สายไหม
ระดับ C	C	42	กลุ่มออมทรัพย์เคหะชุมชนคลองบางเขน	สายไหม
ระดับ C	C	43	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเลียบคลองสองสามัคคี จำกัด	สายไหม
ระดับ C	B	44	สหกรณ์เคหสถานเพื่อที่อยู่อาศัยคลองบางบัว จำกัด	บางเขน
ระดับ C	C	45	กลุ่มออมทรัพย์ร่วมใจพัฒนาใต้	บางเขน
ระดับ C	C	46	กลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยสามัคคีร่วมใจ	บางเขน
ระดับ C	C	47	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนร่วมใจพัฒนาเหนือ	บางเขน
ระดับ C	C	48	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนก้าวหน้า	หลักสี่
ระดับ C	C	49	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนชายคลองบางบัว	หลักสี่
ระดับ C	B	50	สหกรณ์เคหสถานชุมชนร่วมพัฒนา จำกัด	หลักสี่
ระดับ C	C	51	สหกรณ์เคหสถานเพื่อที่อยู่อาศัย จำกัด	จตุจักร
ระดับ C	B	52	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงรัชดาร่วมใจ จำกัด	ห้วยขวาง

ผลการดำเนินงาน

(1) ผลเชิงปริมาณ

องค์กรผู้ใช้สินเชื่อได้รับการพัฒนา 52 องค์กร จำแนกตามเกณฑ์ได้ 2 ประเภทคือ

- ➢ **เกณฑ์ด้านการจัดทำบัญชี (การปิดบัญชี)** จำแนกเป็น

1) ระดับ A (ปิดบัญชีได้เป็นปัจจุบัน) จำนวน 13 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 25.00

2) ระดับ B (อยู่ระหว่างการจัดทำบัญชีหรือการรับรองงบจากผู้ตรวจ โดยประเมินว่าสามารถปิดบัญชีได้ในเวลาที่กำหนด) จำนวน 27 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 51.92

3) ระดับ C (ไม่สามารถปิดบัญชีได้และมีความยุ่งยากซับซ้อนในการแก้ไขอบกพร่อง) จำนวน 12 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 23.08


➢ **เกณฑ์ด้านการบริหารจัดการองค์กร** โดยพิจารณาจากมาตรฐานในการบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมของสมาชิก การใช้งบประมาณตามวัตถุประสงค์ จำแนกเป็น


1) ระดับ A จำนวน 17 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 32.69

2) ระดับ B จำนวน 24 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 46.15

3) ระดับ C จำนวน 11 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 21.16

ระดับความเข้มแข็งกลุ่มเป้าหมาย 52 องค์กร

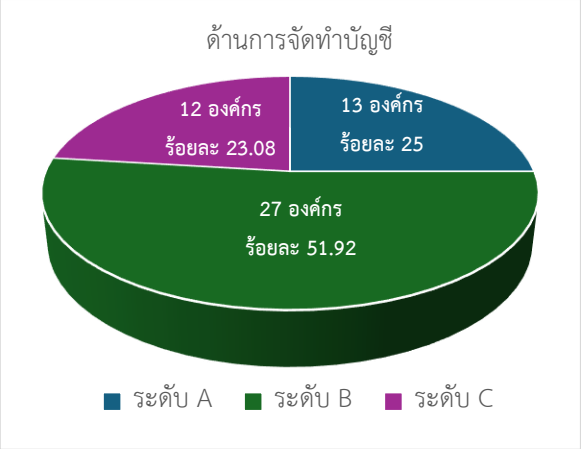

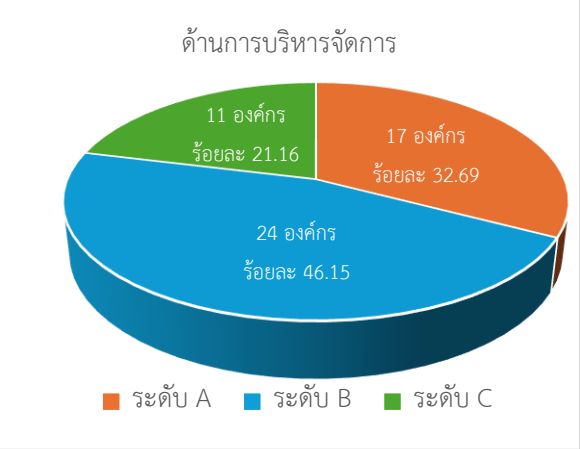

(2) ผลเชิงคุณภาพ

- เกิดคณะทำงานฟื้นฟูคุณภาพองค์กรผู้ใช้สินเชื่อ ระดับเครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง (คพสค.) ร่วมออกแบบวางแผนการทำงานและลงสนับสนุนการทำงานเครือข่ายระดับเขต 8 เขต และกลุ่มองค์กรผู้ใช้สินเชื่อ

- สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองมีการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างสำนักงานภาคกรุงเทพ ปริมณฑลและตะวันออก สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงิน และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี ในการสนับสนุนกลุ่มองค์กรผู้ใช้สินเชื่อ

- องค์กรผู้ใช้สินเชื่อได้รับการฟื้นฟูกระบวนการทำงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร และมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีมาตรฐานมากขึ้น โดยกรรมการหรือเจ้าหน้าที่จัดทำบัญชีมีทักษะด้านบัญชีในทุกองค์กร นำไปสู่การปิดบัญชีได้หรือสามารถวางแผนการปิดบัญชีสหกรณ์ได้ในเวลาที่กำหนด

- องค์กรมีการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจและการบริหารจัดการทุนชุมชนอย่างเป็นระบบ โดยส่งเสริมให้สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ สามารถเข้าถึงแหล่งทุนจากทุกภาคส่วน มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเพิ่มรายได้ ลดภาระค่าใช้จ่าย และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่องค์กร สมาชิก และชุมชน อันจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนในระยะยาว

สรุปผลการประเมิน

จากการติดตามและประเมินผลการพัฒนาองค์กรผู้ใช้สินเชื่อภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ในปี 2569 พบว่า มีองค์กรผู้ใช้สินเชื่อที่ได้รับการพัฒนาแล้วทั้งสิ้น 52 องค์กร

1) ด้านการจัดทำบัญชี (การปิดบัญชี) พบว่า องค์กรที่มีความสามารถในการปิดบัญชีได้อย่างเป็นปัจจุบัน หรือ**ระดับ A** มีจำนวน 13 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 25 ส่วนใหญ่เป็นองค์กรที่มีระบบการจัดทำบัญชีที่เข้มแข็งและมีบุคลากรที่สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบ องค์กร**ระดับ B** อยู่ระหว่างการจัดทำบัญชีหรือการรอการรับรองงบจากผู้ตรวจสอบบัญชี โดยประเมินว่ามีศักยภาพเพียงพอที่จะปิดบัญชีได้ตามเวลาที่กำหนด จำนวน 27 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 51.92 ซึ่งถือเป็นสัดส่วนสูงที่สุด แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการพัฒนาศักยภาพด้านการบัญชีขององค์กร มีองค์กรใน**ระดับ C** ซึ่งไม่สามารถปิดบัญชีได้ และมีความยุ่งยากซับซ้อนในการแก้ไขข้อบกพร่อง จำนวน 12 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 23.08

2) ด้านการบริหารจัดการองค์กร พบว่า องค์กรที่มีความเข้มแข็งสูงสุด หรือ**ระดับ A** มีจำนวน 17 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 32.69 ซึ่งเป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ และสมาชิกมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน องค์กรส่วนใหญ่จัดอยู่ใน**ระดับ B** จำนวน 24 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 46.15 ซึ่งพื้นฐานการบริหารจัดการที่พอใช้ได้ แต่ยังมีข้อจำกัดที่จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม ส่วนองค์กรที่อยู่ใน**ระดับ C** มีจำนวน 11 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 21.16 ซึ่งเป็นกลุ่มที่ยังมีความอ่อนแอในการบริหารจัดการ ทั้งในด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกและการใช้งบประมาณตามวัตถุประสงค์

ในภาพรวมองค์กรผู้ใช้สินเชื่อส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะสามารถพัฒนาตนเองได้ โดยมีจุดแข็งอยู่ในกลุ่มที่อยู่ระหว่างพัฒนาการด้านการจัดทำบัญชีและการบริหารจัดการ ซึ่งหากได้รับการสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง จะสามารถยกระดับพัฒนาเป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งได้

ข้อสังเกต/ข้อค้นพบจากการดำเนินงาน

จากการดำเนินการพัฒนาองค์กรผู้ใช้สินเชื่อในปี พ.ศ. 2569 กลุ่มเป้าหมายจำนวน 52 องค์กร พบว่าทุกองค์กรจำเป็นต้องมีการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ ทั้งการดำเนินงานด้านการประชุมกรรมการและสมาชิก การจัดเก็บและดูแลระบบเอกสารของสหกรณ์ การจัดทำและปิดบัญชี

รวมถึงการวางมาตรการติดตามสอบทานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพองค์กรอย่างยั่งยืน

1) ด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ พบว่ามีหลายองค์กรที่มีการจัดทำเอกสารที่ไม่สมบูรณ์ การมีส่วนร่วมของสมาชิกที่ยังไม่เพียงพอ และสถานะทางการเงินบัญชีที่ไม่เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้มีองค์กรจำนวนถึง 21 แห่ง ที่ต้องเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้

2) ด้านการจัดทำบัญชี จากเป้าหมาย 52 องค์กร มีเพียง 13 องค์กรที่สามารถปิดบัญชีสหกรณ์ได้เป็นปัจจุบัน ขณะที่อีก 27 องค์กรอยู่ระหว่างการจัดทำบัญชี และอีก 12 องค์กรกำลังรอการรับรองงบจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายด้านระบบบัญชีที่ต้องเร่งแก้ไขและพัฒนาให้การปิดปีบัญชีของสหกรณ์เป็นปัจจุบัน

3) ด้านการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและกลไกการทำงานที่เกี่ยวข้อง มีความจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องการพัฒนาระบบบริหารสหกรณ์ การติดตามองค์กรที่อยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหา การเร่งรัดการรับรองงบการเงิน รวมถึงการพัฒนาระบบบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์ให้มีมาตรฐาน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความโปร่งใสในการบริหารจัดการ โดยมีการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงิน สำนักสินเชื่อ สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองและชนบท สำนักงานภาคกรุงเทพ ปริมณฑลและตะวันออก เครือข่ายพัฒนาที่อยู่อาศัย 5 ภาค (คพท.) เครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง (คพสค.) สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

1) ระดับองค์กรชุมชน

คณะกรรมการและสมาชิก บางชุมชนยังขาดความพร้อมและทักษะในการบริหารจัดการโครงการ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนยังมีน้อย เนื่องจากมีภารกิจในการประกอบอาชีพ และขั้นตอนในการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ จึงมีความล่าช้าในกระบวนการดำเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัยของชุมชน จำแนกได้ดังนี้

- ขาดคนทำงานเฉพาะด้าน เช่น ด้านบัญชี ระบบเอกสาร การประชาสัมพันธ์ งานก่อสร้าง ทำให้ระบบการทำงานขององค์กรขาดความเข้มแข็ง
- ขาดความเข้าใจในการดำเนินโครงการและการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน
- เอกสารประกอบการดำเนินงานยังไม่ครบถ้วน การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นหมวดหมู่
- ทักษะการทำงานของแกนนำ/คณะทำงานยังไม่เชี่ยวชาญ รวมถึงคณะกรรมการยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่และทำให้การทำงานไม่ต่อเนื่อง

2) ระดับคณะทำงานพัฒนาองค์กรผู้ใช้สินเชื่อ

- คณะทำงานฯ บางส่วน ยังไม่สามารถดำเนินการประสานงานในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การขับเคลื่อนงานขาดความต่อเนื่องและไม่สามารถเชื่อมโยงกับบริบทของพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม
- การรวบรวมข้อมูลและสะท้อนปัญหายังไม่ตรงกับประเด็นสำคัญ ทำให้ข้อมูลที่ได้รับไม่สามารถนำไปใช้วางแผนหรือกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผล

- คณะทำงานฯ ยังขาดทักษะและความเชี่ยวชาญด้านการจัดทำบัญชี โดยเฉพาะความสามารถในการดำเนินงานจนถึงขั้นปิดบัญชีสหกรณ์ ส่งผลให้การพัฒนาระบบบัญชียังไม่เกิดความต่อเนื่อง
- คณะทำงานฯ ยังไม่ได้รับการยอมรับ แม้บุคลากรบางส่วนจะมีความพร้อมและความมุ่งมั่น บางส่วนมีความตั้งใจแต่ยังขาดทักษะที่จำเป็น ส่งผลให้สามารถสร้างผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมได้เพียง 4–5 พื้นที่
- คณะทำงานฯ บางส่วน ยังไม่สามารถดำเนินการปิดบัญชีในองค์กรของตนเองได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสมาชิกที่มีต่อการบริหารจัดการและระบบการเงินของสหกรณ์

3) ระดับส่วนงานภายในองค์กร

- เสนอให้มีการประชุมออกแบบการจัดทำแผนงานแบบมีส่วนร่วมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ยกระดับประสิทธิภาพการประสานงาน ลดความซ้ำซ้อน และสนับสนุนให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรมขับเคลื่อนงานให้มีประสิทธิภาพ
- เสนอให้มีการทบทวนงบประมาณ ให้สอดคล้องกับขนาด โครงสร้าง และภารกิจของกลุ่มองค์กร เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม
- ควรเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน

1. คณะกรรมการและสมาชิกสหกรณ์ต้องปฏิบัติตามระเบียบ/ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาทักษะความรู้ในการบริหารจัดการโครงการ รวมทั้งพัฒนาคนทำงานขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญที่จะสนับสนุนการทำงานในระยะต่อไป

2. สหกรณ์ต้องจัดทำบัญชีและเอกสารให้เป็นปัจจุบันให้สอดคล้องตามแผนงาน และมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปิดบัญชีได้

3. ประสานความร่วมมือการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ในขั้นตอนการดำเนินงานบริหารงานสหกรณ์ให้มีความคล่องตัว สนับสนุนและคลี่คลายข้อติดขัดการบริหารงานสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4. หนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มทักษะของคนทำงานอย่างต่อเนื่อง และตรงตามความต้องการของกลุ่มองค์กรผู้ใช้สินเชื่อ

5. ทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานพัฒนาคุณภาพองค์กรผู้ใช้สินเชื่อ เพื่อไปสนับสนุนในระดับเครือข่ายเขตและกลุ่มองค์กร โดยมีระบบการติดตามผลการทำงานรวมถึงการรายงานผลของการทำงานอย่างสม่ำเสมอ

3.5 การสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่รูปธรรมองค์กรผู้ใช้สินเชื่อ ปี 2569

จากการดำเนินงานในข้างต้น นำไปสู่การเกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ชุมชน โดยมีการดำเนินงานใน 7 พื้นที่สำคัญ ซึ่งปัจจุบันได้มีการดำเนินการตามแผนงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ลำดับ	ชื่อองค์กร	ที่อยู่	กิจกรรม/ประเด็นที่จะดำเนินการ
1.	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเพิ่มทรัพย์สินสมบุญ จำกัด	แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม.	การปลูกผักสวนครัว
2.	สหกรณ์เคหสถานริมคลองพัฒนา จำกัด	แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.	ดอกไม้จันทร์ชุมชนริมคลอง สร้างงานสร้างรายได้
3.	สหกรณ์เคหสถานชุมชนมิตรประชาพัฒนา จำกัด	แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.	การปลูกผักสวนครัว (ต่อยอด)
4.	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนพหลโยธิน 32 จำกัด	แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.	-การบริหารจัดการที่ดีของสหกรณ์ -การปลูกผักสวนครัว
5.	สหกรณ์เคหสถานประชาร่วมใจ 2 จำกัด	แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.	การเพาะเห็ด นางฟ้าภูฐาน (ต่อยอด)
6.	สหกรณ์เคหสถานประชากร 3 จำกัด	แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม.	การปลูกผักสวนครัว (ต่อยอด)
7.	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงลาดพร้าวสามัคคี จำกัด	ซอยประชาร่วมใจ 43 แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กทม.	โครงการการบริหารจัดการภายในที่ดี การทำพิมเสนน้ำ และการแปรรูปอาหาร “ผักดอง”

ในการดำเนินงานเครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง โดยคณะทำงานพัฒนาองค์กรผู้ใช้สินเชื่อ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) รวม 7 พื้นที่ พื้นที่ละ 45,000 บาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 315,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งจากการดำเนินงานตามแผนงานข้างต้น ถือเป็นต้นแบบสำคัญของการพัฒนาองค์กรผู้ใช้สินเชื่อที่สามารถยกระดับศักยภาพในการบริหารจัดการทางการเงินและการดำเนินธุรกิจชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยกระบวนการดังกล่าว ได้มีการส่งเสริมการจัดทำระบบบัญชีและการบริหารจัดการทางการเงินที่โปร่งใส สนับสนุนการสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่การพัฒนากลไกการบริหารงานของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง สามารถสร้างรายได้และเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ และส่งเสริมการสร้างรายได้ใหม่และการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนฐานรากอย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดรายได้เสริมแก่สมาชิกจากการปลูกผักสวนครัวผลิตและจำหน่ายวัสดุการเกษตร เช่น ดินถุงพร้อมปลูกและต้นกล้าผักสวนครัว ส่งผลให้สมาชิกมีทักษะเพิ่มขึ้น ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และการจัดการตลาด สามารถนำไป ต่อยอดเป็นอาชีพได้จริง นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ผักดองและพิมเสนน้ำ ซึ่งช่วยลดความสูญเสียจากผลผลิตส่วนเกินและเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากรในชุมชนสร้างความมั่นคงทางอาหารและลดรายจ่ายในครัวเรือน โดยมีครัวเรือนสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก ภายใต้การสนับสนุนจากคณะกรรมการสหกรณ์ ซึ่งได้

จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น ต้นกล้าผักสวนครัว กระถางปลูก และดินคุณภาพดี โดยได้สนับสนุนให้เกิดการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้สมาชิกได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ครอบคลุมเรื่องการปลูกผักสวนครัว การบำรุงรักษา และการป้องกันแมลงศัตรูพืชอย่างปลอดภัย หลังการอบรม สมาชิกที่เข้าร่วมได้รับการสนับสนุนต้นกล้า กระถาง และดิน เพื่อนำกลับไปปลูกที่บ้านของตนเอง โดยสหกรณ์มีการติดตามผลการปลูกอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างแรงจูงใจและให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการเพาะปลูก

นอกจากนั้น ยังมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในชุมชน เพื่อสร้างเครือข่ายการปลูกผัก การแบ่งปันผลผลิต และการแลกเปลี่ยนเทคนิคการเพาะปลูกระหว่างครัวเรือน กิจกรรมนี้ไม่เพียงส่งเสริมการพึ่งพาตนเองด้านอาหาร แต่ยังช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวในชุมชน เพิ่มบรรยากาศที่น่าอยู่ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก ซึ่งผลการดำเนินงานพบว่า ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้และอุปกรณ์ที่ได้รับไปต่อยอดการปลูกผักสวนครัวที่บ้านได้จริง ส่งผลให้มีผักปลอดสารพิษไว้บริโภคในชีวิตประจำวัน ลดค่าใช้จ่ายด้านอาหาร และยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านความปลอดภัยทางโภชนาการ ทำให้ชุมชนมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น และเกิดการแบ่งปันผลผลิต ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็ง ความสามัคคี และเพิ่มทักษะการพึ่งพาตนเอง

3.6 งานช่างชุมชน

3.6.1 ภาพรวมการดำเนินงาน งานติดตามและตรวจงวดงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง

ทีมทำงานฯ ทำหน้าที่สนับสนุนกระบวนการพัฒนาที่อยู่อาศัย ตั้งแต่การสำรวจพื้นที่ การให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะด้านการออกแบบ การตรวจสอบงานก่อสร้าง การติดตามความก้าวหน้า การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง ตลอดจนการประสานงานกับชุมชน ผู้รับเหมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดำเนินงานในปี พ.ศ. 2569 จึงมุ่งเน้นการทำงานเชิงพื้นที่และการทำงานร่วมกับชุมชน โดยให้ความสำคัญกับการสนับสนุนให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการงานด้านช่างได้ด้วยตนเองมากขึ้น รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของช่างชุมชนให้มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับลักษณะงานและปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงาน จำนวน 26 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนริมคลองลาดพร้าว จำนวน 11 ชุมชน และชุมชนริมคลองเปรมประชากร จำนวน 15 ชุมชน และมีวัตถุประสงค์สำคัญ ดังนี้

1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการก่อสร้างและพัฒนาที่อยู่อาศัยของชุมชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะด้านงานช่างแก่ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง
3. เพื่อติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าและคุณภาพของงานก่อสร้าง
4. เพื่อประสานงานระหว่างชุมชน ทีมช่าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และศักยภาพของช่างชุมชน

6. เพื่อรวบรวมข้อมูล ปัญหา และบทเรียนจากการดำเนินงาน เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนางานในระยะต่อไป

การดำเนินงาน งานติดตามและตรวจงวดงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองในปี พ.ศ. 2569 ครอบคลุมการดำเนินงานสำคัญ ดังนี้

- **การติดตามงานก่อสร้าง** ทีมทำงานฯ ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง ตรวจสอบสภาพพื้นที่และองค์ประกอบของอาคาร รวมทั้งให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาที่พบ โดยการติดตามงานเน้นการทำงานร่วมกับชุมชนและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยกระบวนการติดตาม ประกอบด้วย การวางแผนการลงพื้นที่ การสำรวจและตรวจสอบสภาพหน้างาน การบันทึกข้อมูลและปัญหา การให้คำแนะนำ การประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหา และการติดตามผลหลังการแก้ไข
- **การอบรมและพัฒนาศักยภาพช่างชุมชน** มีการจัดกิจกรรมอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพช่างชุมชน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านงานก่อสร้าง การตรวจสอบคุณภาพงาน ความปลอดภัยในการทำงาน การบริหารจัดการงานช่าง การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และการจัดการด้านเอกสารการตรวจงานก่อสร้าง
- **การประชุมสรุปผลและประเมินผลการดำเนินงาน** มีการประชุมสรุปผลและประเมินผลการดำเนินงาน ทุกๆ 2 เดือน โดยรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ รวมถึงนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงรูปแบบการทำงานของทีมช่างในระยะต่อไป
- **การสนับสนุนภารกิจส่วนกลางและการพัฒนาองค์ความรู้ของสถาบัน** ทีมทำงานฯ ร่วมสนับสนุนภารกิจส่วนกลางของสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย งานก่อสร้าง และการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานและชุมชน ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสนับสนุนการจัดแสดงผลงานของสถาบัน โดยการดำเนินงานครอบคลุมการเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการก่อสร้าง การพัฒนาแนวทางออกแบบที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับบริบทชุมชนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ทั้งนี้ เพื่อนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการติดตามงานก่อสร้าง ให้ข้อเสนอแนะด้านเทคนิคและสนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่

กิจกรรม	จำนวนครั้ง	ผลการดำเนินงาน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การก่อสร้างบ้านระบบโมดูลาร์	1 ครั้ง	ศึกษาเรียนรู้นวัตกรรมวัสดุ Micro Precast จุดเด่นด้านกระบวนการก่อสร้าง เพื่อนำไปใช้เป็นทางเลือกสำหรับงานก่อสร้างบ้านในโครงการมั่นคง
Social Development Expo 2025	1 ครั้ง	สนับสนุนการจัดทำรูปแบบนิทรรศการของ พอช. สำหรับจัดแสดง
ประชุม Work shop Cooling Project ร่วมกับเครือข่ายองค์กรชุมชน ภาคีทางการศึกษา ภาคีองค์กรเอกชน และภาคีNGO	1 ครั้ง	แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางพัฒนา “บ้านเย็น” โดยเน้นการออกแบบที่เหมาะสมกับบริบทชุมชน การลดความร้อนและการใช้พลังงาน ,เรียนรู้การเลือกใช้วัสดุ พื้นที่สีเขียว และแนวทางสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมถึงการส่งเสริมบทบาทช่างชุมชนในการพัฒนาที่อยู่อาศัย สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองและต่อยอดสู่การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้
“โครงการบ้านมั่นคงพลัส” เสริมคุณภาพชีวิตชุมชนเมืองผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม	1 ครั้ง	เรียนรู้แนวคิด “บ้านมั่นคงพลัส” ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนในทุกมิติ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและการวิเคราะห์บริบทพื้นที่, แลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน และการจัดทำแผนความร่วมมือระหว่าง กทม. พอช. สำนักงานเขต ภาคีเครือข่าย และชุมชน สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม







การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การก่อสร้างบ้านระบบโมดูลาร์





Social Development Expo 2025







ประชุม Work shop Cooling Project ร่วมกับเครือข่ายองค์กรชุมชน ภาคีทางการศึกษา ภาคีองค์กรเอกชน และภาคีNGO







“โครงการบ้านมั่นคงพลัส” เสริมคุณภาพชีวิตชุมชนเมือง ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม

- **โครงสร้าง และบทบาทหน้าที่ ของทีมทำงานฯ** ทีมช่างชุมชนดำเนินงานภายใต้การสนับสนุนของทีมออกแบบและก่อสร้าง โดยกำหนดบทบาทให้สอดคล้องกับความรู้ ประสบการณ์ และบริบทของแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ขอบเขตการตรวจสอบหรือให้ความเห็นของช่างชุมชนต้องไม่เกินหน้าที่และคุณสมบัติทางวิชาชีพ และประเด็นที่มีผลต่อความมั่นคงแข็งแรงหรือความปลอดภัยต้องส่งให้วิศวกรหรือผู้รับผิดชอบตามสัญญาพิจารณา

กลไก/ผู้เกี่ยวข้อง	บทบาทและหน้าที่
ทีมออกแบบและก่อสร้าง	กำหนดแนวทาง สนับสนุนด้านวิชาการ ตรวจสอบประเด็นทางเทคนิค และประสานการแก้ไข

กลไก/ผู้เกี่ยวข้อง	บทบาทและหน้าที่
ทีมช่างชุมชน	ติดตามหน้างาน รวบรวมข้อมูล แจ้งข้อสังเกต ประสานสมาชิก และรายงานปัญหา
คณะกรรมการชุมชน	กำกับการบริหารโครงการ รับรองข้อมูล และประสานสมาชิก
ผู้รับเหมา	ดำเนินงานตามแบบ สัญญา แผนงาน มาตรฐาน และแก้ไขข้อบกพร่อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ เช่น สาธารณูปโภค เขต และงานเขื่อน

- **การติดตามงานก่อสร้าง** รวม 64 ครั้ง

เขตพื้นที่	คลองลาดพร้าว	คลองเปรมประชากร
1. เขตห้วยขวาง	1. ชุมชนลาดพร้าว 80 2. ชุมชนหลังสมาคมไทย-ญี่ปุ่น	-
2. เขตจตุจักร	1. ชุมชนพหลโยธิน 32 2. ชุมชนหลังกรมวิทยาศาสตร์	1. ชุมชนสามัคคีเทวสุนทร
3. เขตหลักสี่	1. ชุมชนชายคลองบางบัว	1. ชุมชนเทวสุนทร 2. ชุมชนหลังแฟลตร่วมพัฒนา 3. ชุมชนแจ้งวัฒนะ 5 4. ชุมชนคลองเปรมประชาพัฒนา
4. เขตดอนเมือง	-	1. ชุมชนทำนบร่วมใจ 2. ชุมชนสตรีเหล็กพัฒนา 3. ชุมชนร่มไทรงาม 4. ชุมชนตาลคู่พัฒนา 5. ชุมชนวัดดอนเมืองด้านเหนือ
5. เขตสายไหม	1. ชุมชนพัฒนา หมู่ 2	-
6. เขตคลองสามวา	1. ชุมชนบ้านใหม่พัฒนา	-
7. จ.ปทุมธานี	-	1. ชุมชนวัดรังสิต








การลงพื้นที่ติดตามและตรวจงวดงานก่อสร้าง

- **การอบรมและพัฒนาศักยภาพช่างชุมชน** จำนวน 1 ครั้ง






การอบรม/พัฒนาศักยภาพ

- **การประชุมสรุปผลและประเมินผลการดำเนินงาน** จำนวน 3 ครั้ง




การประชุมทีมทำงานฯ

4. รายงานผลการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน และภาคี

สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ขอรายงานผลการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีที่สำคัญในภารกิจการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าว และคลองเปรมประชากร ในช่วงเดือนตุลาคม 2568 ถึงเดือนสิงหาคม 2569 ดังนี้

4.1 โครงการได้รับความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ 2569

4.1.1 ระดับนโยบาย/กระทรวง

- **หน่วยราชการในพระองค์ (ศอญ.)** ติดตามความก้าวหน้าและสนับสนุนการพัฒนาคลองเปรมประชากร รวมถึงการลงพื้นที่ติดตามโดยราชเลขานุการในพระองค์ฯ
- **สำนักนายกรัฐมนตรี** สนับสนุนการประสานงานและจัดการประชุมสภากาแฟเพื่อติดตามโครงการสำคัญ
- **กระทรวงมหาดไทย** (กรมที่ดิน, กรมโยธาธิการฯ) สนับสนุนการรังวัดที่ดินและร่วมก่อสร้างเขื่อน/ถนน
- **กระทรวงเกษตรและสหกรณ์** (กรมส่งเสริมสหกรณ์, กรมตรวจบัญชีสหกรณ์) สนับสนุนการจัดตั้งและติดตามการบริหารจัดการสหกรณ์เคหสถานของชุมชนริม และจัดทำบัญชีสหกรณ์ตามปีบัญชี รวมถึงสนับสนุนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
- **กระทรวงการคลัง** (กรมธนารักษ์) อนุญาตให้สหกรณ์เคหสถานเช่าที่ดินราชพัสดุและอนุญาตก่อสร้างรวม 192 ครัวเรือน ในไตรมาส 3
- **กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์** สนับสนุนการพัฒนาชุมชนริมคลอง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง

โดยการขับเคลื่อน เร่งรัด ติดตาม ของกลไกระดับนโยบาย หรือผู้บริหารของหน่วยงานร่วมเปิดเวทีสาธารณะในระดับเขต เพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นต่อประชาชนในวงกว้าง ในปี 2569 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร และคณะทำงานสร้างความเข้าใจโครงการพัฒนาคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร โดยปัจจุบันมีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามโครงการพระราชดำริ ตามพระบรมราโชบาย ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 121/2569 โดยผู้บริหารของหน่วยงานร่วมลงพื้นที่ติดตาม และสำรวจความต้องการของประชาชน ซึ่งอาจส่งผลให้การดำเนินการคลี่คลายปัญหา ข้อติดขัดต่างๆ สามารถคลี่คลายได้ในทิศทางที่ดีขึ้น โดยมีการจัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าและแก้ไขข้อพิพาทที่สำคัญ ดังนี้

- การประชุมสภากาแฟเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร ครั้งที่ 6/2568 (9 ต.ค. 68) โดยมีการหารือและพิจารณาเร่งด่วนเกี่ยวกับการทบทวนแผนแม่บทฯ ให้เป็นปัจจุบัน และกรณีการใช้ที่ดินสาธารณะ

เพื่อรองรับประชาชนในพื้นที่ตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี คลองเปรมประชากร

- การประชุมสภากาแฟเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร (20 ต.ค. 68) เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการพัฒนาคลองเปรมประชากร ในพื้นที่ชุมชนแจ้งวัฒนะ 5 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
- การลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลองเปรมประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับประชาชน เขตจตุจักร - เขตดอนเมือง
- การลงพื้นที่ลงสำรวจสภาพปัญหา ข้อติดขัดการดำเนินงาน และติดตามความคืบหน้าโครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลองเปรมประชากรในพื้นที่ ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
- การประชุมสภากาแฟเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร ครั้งที่ 1/2569 (23 ม.ค. 69) โดยมีการหารือและพิจารณาเร่งด่วนติดตามการดำเนินงานกรณีพื้นที่ชุมชนแจ้งวัฒนะ 5 เขตหลักสี่ การหาพื้นที่รองรับสมาชิกชุมชนประชากร 4 และ การใช้ที่ดินสาธารณะเพื่อรองรับประชาชนในพื้นที่ตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี คลองเปรมประชากร
- การลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการในพระราชดำริ “การพัฒนาคลองเปรมประชากร” ณ หน่วยเรือคลองบ้านใหม่ เขตดอนเมือง และสวนเปรมประชาวนารักษ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2569 ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และคณะ ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร โดยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่สีเขียว การปลูกต้นไม้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเน้นความสำคัญเรื่องการบูรณาการทำงานของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง
- การประชุมโครงการพระราชดำริ ตามพระบรมราโชบาย “การพัฒนาคลองเปรมประชากร” เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 69 เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และวางแผนการดำเนินงานการบริหารจัดการชุมชนบริเวณคลองเปรมประชากร โดยมุ่งเน้นการจัดระเบียบหน้าบ้านริมคลองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวชุมชนริมคลองเปรมประชากร
- การประชุมโครงการพระราชดำริ ตามพระบรมราโชบาย “การพัฒนาคลองเปรมประชากร” เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 69 ณ อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และวางแผนการลงพื้นที่ขับเคลื่อนงาน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนคลองเปรมประชากร
- คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ตามพระบรมราโชบาย การลงพื้นที่ลงสำรวจสภาพปัญหา ข้อติดขัดการดำเนินงาน และติดตามความคืบหน้าโครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลองเปรมประชากรในพื้นที่เขตดอนเมือง เขตหลักสี่ และเขตจตุจักร
- การประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ตามพระบรมราโชบาย เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 69 ณ อาคารเอนโก้ เทอร์มินอล (เอนเทอร์) ถนนกำแพงเพชร 6 เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

4.1.2 ระดับหน่วยงานปฏิบัติการ

- **กรุงเทพมหานคร** (สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา สำนักงานเขต) สนับสนุนการทำงาน การแก้ไขปัญหาในระดับชุมชน การอนุญาตก่อสร้างบ้าน การวางแผนและรื้อย้ายบ้านเดิม รวมถึงการประชุมติดตามงานในระดับเขตอย่างสม่ำเสมอ
- **จังหวัดปทุมธานี** ให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
- **การไฟฟ้านครหลวง/ส่วนภูมิภาค และ การประปานครหลวง/ส่วนภูมิภาค** สนับสนุนการรื้อย้ายและติดตั้งระบบไฟฟ้า-ประปา
- **เครือข่ายองค์กรชุมชน (คพสค.)** เกิดการฟื้นฟูและรวมตัวของเครือข่าย การติดตามตรวจงวดงานก่อสร้าง สอบทานระบบบริหารจัดการ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตต่างๆ สร้างพื้นที่เศรษฐกิจ พื้นที่แหล่งเรียนรู้ รวมถึงเชื่อมโยงไปสู่ระบบกองทุนของเครือข่ายกับกองทุนรักษาดินรักษาบ้านระดับชาติ
- **ภาคเอกชนและภาคีอื่นๆ** มีการแลกเปลี่ยนการทำงาน ติดตามความคืบหน้าโครงการ และสนับสนุนการพัฒคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลอง เช่น SCG CP ALL Big-Cมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สสส. AIT บริษัท วงษ์พาณิชย์ รีไซเคิล จำกัด สถาบันอาศรมศิลป์ มูลนิธิพุทธรักษา มูลนิธิโลตัส Urban Action เป็นต้น

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองในปีงบประมาณ 2569 ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะในด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการก่อสร้างที่อยู่อาศัยในคลองเปรมประชากร อย่างไรก็ตาม ความท้าทายสำคัญ คือ การจัดการกับข้อมูลบิดเบือน ความล่าช้าเชิงโครงสร้างการทำงานของหน่วยงานปฏิบัติการ และการขาดกลไกติดตามระดับนโยบาย หากสามารถเร่งรัดการประสานงานและเสริมสร้างความเข้าใจในระดับชุมชนได้ โครงการจะมีศักยภาพในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น และสามารถยกระดับขยายผลไปยังสมาชิกหรือชุมชนอื่น ๆ ที่ยังไม่ดำเนินโครงการได้

5. ภาคผนวก

5.1 ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข



ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
1. กลุ่มแกนนำต่อต้านโครงการให้ข้อมูลบิดเบือนไม่เป็นความจริง เช่น ที่ดินริมคลองไม่ใช่ที่ดินราชพัสดุ กรมธนารักษ์และกรมที่ดินสามารถออกโฉนดได้ การรื้อย้ายบ้านเดิมจะต้องได้รับความชดเชยจากภาครัฐ เป็นต้น ทำให้ชาวบ้านเกิดความลังเลไม่มั่นใจที่จะเข้าร่วมการพัฒนาโครงการ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันชี้แจงข้อเท็จจริง และสร้างความเข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง เช่น กรมธนารักษ์ชี้แจงเรื่องขอบเขตที่ดินราชพัสดุ กรมที่ดินชี้แจงยืนยันเรื่องการไม่สามารถออกโฉนดพื้นที่ริมคลอง โดยทุกหน่วยงานให้ข้อมูลกับประชาชนตรงกันเรื่องแนวทางการดำเนินโครงการตามแผนแม่บทฯ ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไปพร้อมกับการจัดระเบียบที่อยู่อาศัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
2. แกนนำและประชาชนที่ต่อต้านโครงการมีการรวมกลุ่มกันเพื่อขัดขวางการทำงานของทั้งเจ้าหน้าที่และของชุมชน เช่น การปิดล้อมการประชุมสร้างความเข้าใจของหน่วยงาน การประชุมของสหกรณ์ชุมชน การปิดล้อมพื้นที่ก่อสร้างและขัดขวางผู้รับเหมาทำให้ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ อาทิ ชุมชนศิษย์หลวงปู่ขาว ชุมชนร่วมพัฒนา เขตหลักสี่	- หน่วยงานที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมาย อาทิ กทม. โดยสำนักงานเขตพื้นที่ กรมธนารักษ์ ควรพิจารณาการใช้กฎหมายเพิ่มเติม - สน. ในพื้นที่ควรให้การสนับสนุนการทำงานของชุมชนอย่างจริงจัง

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
3. แกนนำต่อต้านโครงการ และกลุ่มประชาชนที่ยังไม่มั่นใจในโครงการ ไม่รื้อย้ายบ้านเดิมออกจากพื้นที่ทำให้ไม่สามารถเปิดพื้นที่เพื่อก่อสร้างบ้านใหม่ได้ตามแผนงานหรือในบางชุมชนไม่สามารถก่อสร้างได้ทั้งชุมชน ต้องดำเนินการตามระยะที่สามารถรื้อย้ายบ้านเดิมได้เท่านั้น	หน่วยงานที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมาย อาทิ กทม.โดยสำนักงานเขตพื้นที่ กรมธนารักษ์ ควรพิจารณาการใช้กฎหมายเพิ่มเติม
4. การดำเนินการของหน่วยงานร่วมบูรณาการล่าช้ากว่ากรอบระยะเวลาที่กำหนดร่วมกันไม่สอดคล้องเท่าทันต่อสถานการณ์ชุมชนที่เกิดขึ้น อาทิ - การอนุญาตให้เช่าที่ดินและก่อสร้างบ้านของกรมธนารักษ์ - การลงพื้นที่เพื่อกำหนดขอบเขตที่ดินของกรมที่ดินและกรมธนารักษ์ - การอนุญาตก่อสร้างเขื่อนโดยกรมชลประทานล่าช้า ทำให้ไม่สอดคล้องกับการก่อสร้างบ้าน เกิดปัญหาดินสไลด์ลงในคลอง - การดำเนินการเรื่องรื้อย้าย-ติดตั้งไฟฟ้า/ประปา เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างชุมชนใหม่	หน่วยงานดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้ทันกับระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งจะทำให้การรื้อย้ายบ้านเดิมและการก่อสร้างเขื่อนดำเนินการไปได้ตามแผนงาน รวมถึงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการรับรู้ของผู้อยู่อาศัยบริเวณข้างเคียงทั้งที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโครงการและกลุ่มประชาชนทั่วไป อันจะนำไปสู่การต่อต้านโครงการ
5. การขับเคลื่อน เร่งรัด ติดตาม ของกลไกระดับนโยบาย ปัจจุบันมีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามโครงการพระราชดำริ ตามพระบรมราโชบาย ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 121/2569 โดยผู้บริหารของหน่วยงานร่วมลงพื้นที่ติดตาม และสำรวจความต้องการของประชาชน โดยอาจส่งผลให้การดำเนินการคลี่คลายปัญหา ข้อติดขัดต่างๆ ได้	- การขับเคลื่อน เร่งรัด ติดตาม ของกลไกระดับนโยบาย หรือผู้บริหารของหน่วยงานร่วมเปิดเวทีสาธารณะในระดับเขตเพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นต่อประชาชนในวงกว้าง - เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะทำงาน หรือ คณะอนุกรรมการ เพื่อขับเคลื่อนการทำงานและคลี่คลายปัญหาด้านกฎหมายและการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
6. การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งได้ยึดแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร ปี พ.ศ. 2562 ซึ่งในแผนแม่บทฯทำให้มีการปรับแนวการก่อสร้างเขื่อนโดยมีการขยับแนวก่อสร้างเข้าหาตลิ่งจากแนวก่อสร้าง ส่งผลให้ สมาชิกไม่สามารถก่อสร้างบ้านใน	- กทม.ดำเนินการปรับแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจและหาพื้นที่รองรับสมาชิกที่ไม่สามารถก่อสร้างบ้านในที่ดินเดิมได้

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
ที่ดินเดิมได้ เนื่องจากพื้นที่ไม่เพียงพอ จึงต้องหาที่ดินรองประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปรับผังชุมชนใหม่ อาทิ ชุมชนประชากร 4 เขตดอนเมือง	








5.2 กิจกรรมสำคัญ

5.2.1 กิจกรรมการลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน การเจรจาสร้างความเข้าใจ การทบทวนข้อมูล และร่วมคลี่คลายปัญหาข้อติดขัดต่าง ๆ



รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พอช. **ติดตามความคืบหน้าโครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลองเปรมประชากร** เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2569 โดยล่องเรือจากวัดเสมียนนารี เขตหลักสี่ ถึงชุมชนประชากร 3 เขตดอนเมือง



รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานระดับกรม รวมถึงสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานพัฒนาคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร เมื่อวันที่ 8

ตุลาคม 2568 โดยได้มอบหมายแนวทางการดำเนินงานให้มีกลไกไปทำความเข้าใจกับผู้ที่ยังไม่เข้าใจและไม่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงกลุ่มบุคคลที่มีความเห็นต่างในการพัฒนาคลองเปรมประชากร การเตรียมพื้นที่รองรับผู้ที่จะต้องขยับย้ายออกจากลำคลองให้เพียงพอและไม่ไกลจากแหล่งที่อยู่เดิม







ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กรมธนารักษ์ อธิบดีอัยการสำนักการระบายน้ำ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง SCG และผู้แทนฝ่ายทหาร เข้าร่วมการประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2568 ณ อาคารสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมได้พิจารณาปัญหาข้อติดขัดที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินงานพัฒนาคลองเปรมประชากรขอให้ทุกหน่วยยึดถือการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน





เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ผู้แทนจากหน่วยงานเกี่ยวข้อง ร่วมคณะลองเรือ **ตรวจติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคลองเปรมประชากร** เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2568 ณ ท่าเรือหลังวัดเสมียนนารี เขตจตุจักร **ตามที่ได้มีข้อสั่งการจาก รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในโครงการฯ มุ่งเป้าแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด จัดการที่อยู่อาศัยที่รุกล้ำแนวลำคลอง และคลี่คลายข้อติดขัดต่าง ๆ**





ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการสำนักงานจิตอาสาภาครัฐ สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง **ร่วมลงพื้นที่ชุมชนประชากร 4** เขตดอนเมือง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2569 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดตั้งสหกรณ์และออกแบบการก่อสร้างบ้าน โดยพื้นที่บางส่วนที่ไม่สามารถก่อสร้างที่อยู่อาศัยในที่ดินเดิมได้ จึงอยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดแนวทางการพัฒนาและการจัดหาที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมธนารักษ์ สำนักการระบายน้ำ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง SCG ผู้แทนฝ่ายทหาร สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เข้าร่วม “การประชุมสภากาแฟ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร” ครั้งที่ 1/2569 วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมได้พิจารณาปัญหาข้อติดขัดที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินงานพัฒนาคลองเปรมประชากร ขอให้ทุกหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาข้อติดขัดต่างๆ





ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง (พอช.) เข้าร่วมการ**ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง** เขตดอนเมือง โดยที่ประชุมสรุปให้หน่วยงานที่เกี่ยวดำเนินการลงพื้นที่เจรจา กำหนดแผนเปิดเวที ดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตเช่าที่ดิน และความคืบหน้าการขอไฟฟ้า ประปา





ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569 ณ ชุมชนประชาร่วมใจ 1 เขตจตุจักร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทการพัฒนาและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน โดยนั่งเรือจากท่าเรือวัดเสมียนนารี ไปยังชุมชนตลาดหลักสี่ เขตหลักสี่





ผู้แทนจังหวัดปทุมธานี พอช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายกรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ หน่วยงานท้องถิ่น เครือข่ายคพสค. และคณะกรรมการสหกรณ์ ลงพื้นที่พัฒนาโครงการ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2569 ณ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงตำบลหลักหก เพื่อทบทวนสิทธิสมาชิก และจัดทำแผนรองรับการก่อสร้างเขื่อน พร้อมกำหนดแนวทางการพัฒนาโครงการในระยะถัดไป




ผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมธนารักษ์ สำนักงานเขตดอนเมือง สำนักการระบายน้ำ และ พอช. ลงพื้นที่ติดป้ายประกาศแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินราชพัสดุของกรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569 ณ ชุมชนร่วมใจรักคลองเปรมประชากร เขตดอนเมือง เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับประชาชน ในการคืนพื้นที่ให้กับกรมธนารักษ์ ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม โครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร




พอช.ร่วมกับ สำนักงานเขตดอนเมือง กองทัพภาคที่ 1 และคณะฯ ลงพื้นที่ให้การสนับสนุนข้อมูลการตรวจเยี่ยม ติดตามการโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 ณ คลองเปรมประชากร เขตดอนเมือง นำโดยรวมถึงความคืบหน้าในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการก่อสร้างเขื่อนในช่วงเขตดอนเมือง ทั้งนี้ได้รับทราบสถานะการดำเนินงานรวมถึงปัญหาข้อติดขัดในการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงาน และวางแผนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ต่อไป




ราชเลขานุการในพระองค์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริ ภายใต้พระบรมราโชบาย “พัฒนาคลองเปรมประชากร” และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลอง เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเอนโก้ เทอร์มินอล (เอ็นเทอร์) เขตดอนเมือง โดยได้รับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 120/2569 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ตามพระบรมราโชบาย รวมถึงได้กำหนดจัดงาน “ริมคลองแฟร์” ในช่วงเดือนธันวาคม 2569



ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร และที่ปรึกษาสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเขตดอนเมือง สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง



พอช. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ร่วมติดตามความคืบหน้าการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 69 ณ พื้นที่เขตดอนเมือง ในพื้นที่เขตดอนเมืองบริเวณชุมชนทำนบร่วมใจ ชุมชนสตรีเหล็ก และชุมชนประชากร 3 พร้อมทั้งสำรวจความต้องการของชุมชนด้านต่าง ๆ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน





ราชเลขานุการในพระองค์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการลงสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองเปรมประชากร ภายใต้โครงการพระราชดำริ ตามพระบรมราโชบาย เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 ณ ชุมชนสตรีเหล็ก เขตดอนเมือง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา





ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเขตดอนเมือง สำนักการระบายน้ำสำนักสิ่งแวดล้อม กรมธนารักษ์ การประปานครหลวง มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ฯลฯ ลงพื้นที่ 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหน้าท่าอากาศยานด้านใต้ ชุมชนเปรมประชาสมบูรณ์ ชุมชนตาลคู่พัฒนา เมื่อวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 69 ณ พื้นที่เขตดอนเมือง เพื่อติดตามความคืบหน้าการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากรในพื้นที่เขตดอนเมือง และสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเพื่อออกแบบแผนพัฒนาชุมชน โดยมีแนวทางพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัย การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การจัดการขยะ รวมถึงปรับปรุงทางเดินและระบบแสงสว่างในชุมชน



ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงพลังงาน สำนักพัฒนาสังคม สำนักสิ่งแวดล้อม พอช. ร่วมลงพื้นที่สำรวจปัญหา ความต้องชุมชน โดยมีการลงพื้นที่ 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนคลองเปรมประชาพัฒนา ชุมชนศิษย์หลวงปู่ขาว และชุมชนหลักสี่พัฒนา 99 เมื่อวันที่ พฤษภาคม 2569 ณ พื้นที่เขตหลักสี่ โดยมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบปัญหา และร่วมกันหาหรือแนวทางช่วยเหลือต่อไป





ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการเขตจตุจักร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กรมธนารักษ์ สถานีตำรวจในพื้นที่ สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักพัฒนาสังคม การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ พอช. ร่วมลงพื้นที่สำรวจปัญหาและความต้องชุมชน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 ณ พื้นที่เขตจตุจักร โดยหารือแนวทางช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหา ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่





หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานเขตหลักสี่ สำนักการระบายน้ำ กรมธนารักษ์ สำนักงานประปาสาขาประชาชื่น การไฟฟ้านครหลวง กองพันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์ สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง และ พอช. ประชุมติดตามวางแผนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการรุกล้ำลำน้ำสาธารณะและการพัฒนาพื้นที่คลองเปรมประชากร เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2569 ณ ห้องประชุมหลักสี่ทวีสุข ชั้น 4 สำนักงานเขตหลักสี่ โดยมีการหารือแนวทางการช่วยเหลือ กำหนดการเปิดเวทีรับรองสิทธิ รวมถึงติดตามความคืบหน้าการรังวัดที่ดิน





สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 จัดการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1 สหกรณ์เคหสถานชุมชนประชากร 4 ร่วมใจรักคลองเปรม จำกัด เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2569 ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร สำนักงานเขตดอนเมือง โดยได้มีการประชุมได้ออกแผนดำเนินงานการดำเนินงานของสหกรณ์ กำหนดวงเงินกู้ยืม สรรหาคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ และจัดสรรตำแหน่งเพื่อวางแผนการพัฒนาโครงการต่อไป



หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเขตหลักสี่ สำนักการระบายน้ำ กรมธนารักษ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 2 พอช. และคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ สมาชิกชุมชนคนรักถิ่น ร่วมประชุมทบทวนและพิจารณาสิทธิสมาชิกชุมชนคนรักถิ่น เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2569 ณ สำนักงานเขตหลักสี่ เขตหลักสี่ โดยมีการชี้แจงบทบาท ภารกิจ และแนวทางการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการแก้ไขปัญหาชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจสมาชิกชุมชน และจัดกระบวนการทบทวนสิทธิสมาชิกชุมชนเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลรายชื่อผู้มีสิทธิให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง



หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานชลประทานที่ 11 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานที่ดิน สำนักงานธนารักษ์ กรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ เทศบาลตำบลหลักหก พอช. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลหลักหก และคณะกรรมการสหกรณ์ชุมชนวัดรังสิต สหกรณ์ชุมชนหลักหก วันที่ 10 มิถุนายน 2569 ณ ห้องประชุมข้าวหอมปทุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ได้เข้าร่วมร่วมประชุมหารือการแก้ปัญหา และแนวทางการดำเนินงานพร้อมข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ตำบลหลักหก การดำเนินการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ 13-0-39 ไร่ การเจราขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ที่ดินราชพัสดุ 10 ไร่ และติดตามเร่งรัดการก่อสร้างเขื่อน







สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เข้าร่วมใจจัดงาน “คนไทยคลองเปรมสายน้ำเดียวกัน” การจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2569 ณ ชุมชนประชากร 3 เขตดอนเมือง ซึ่งได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาเป็นประธานในพิธี โดยมีการร่วมใจปลูกต้นไม้บริเวณหน้าบ้านและพื้นที่ส่วนร่วมรวมกว่า 4,949 ต้น เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้ร่มรื่นน่าอยู่

พอช. และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม "ประชุมสร้างความเข้าใจการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร ตามแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลอง" โดยมีผู้อำนวยการเขตดอนเมือง เป็นประธาน ทั้งนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนสำนักปลัดนายกรัฐมนตรี ผู้แทนกรมธนารักษ์ สำนักการระบายน้ำ สถานีตำรวจ นครบาลดอนเมือง กลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้นำชุมชนริมคลองเปรมประชากร เขตดอนเมือง จำนวน 12 ชุมชน











นิกร โสมกลาง ลงพื้นที่มอบบ้านมั่นคงริมคลองเปรมประชากร ชู “Better Home Better Life: บ้านที่มากกว่าบ้าน”กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งกรมธนารักษ์, สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร และเทศบาลตำบลหลักหก ในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนนโยบายในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม



ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์การชุมชน (พอช.) กรมธนารักษ์ สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร และสถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปรมประชากร ของชุมชนประเสริฐเปรมประชา เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2569 การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปรมประชากร โดยเฉพาะการดำเนินโครงการ บ้านมั่นคง และการก่อสร้าง เขื่อนริมคลองเปรมประชากร ซึ่งเป็นโครงการสำคัญในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เป็นระเบียบ พร้อมเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น และบูรณาการการดำเนินงาน

ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง เปิดเวทีประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปรมประชากร ณ ที่ทำการชุมชนร่วมใจรักคลองเปรมประชากร เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2569 โดยสถาบันพัฒนาองค์การชุมชน กรมธนารักษ์ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร และสถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปรมประชากร ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลและหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่เป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของประชาชน



5.2.2. กิจกรรมการประสานความร่วมมือกับภาคี เครือข่าย





“บ้านอยู่เย็น เป็นสุข” รับมือวิกฤตน้ำทวมและภัยความร้อน บ้านริมคลองเปรมฯ พอช. พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ **“เสริมสร้างขีดความสามารถในการปรับตัวต่อภัยน้ำท่วมและภัยความร้อน”** เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยริมคลองเปรมประชากรภายใต้วิกฤตการณ์โลก ณ ห้องประชุมเปรมประชากร สำนักงานเขตหลักสี่ โดยโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย รศ.ดร.วิจิตรบุษบา มารมย์ และ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) รวมถึงสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

"ยกระดับบ้านมั่นคงประหยัดพลังงาน"
ประหยัด – ทำได้ - ทำร่วม





ณ ชุมชนริมคลอง/ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 **พอช. ร่วมประชุมหารือแนวทางการปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมริมคลอง ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิจัยจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์** โดยลงเรือจากท่าเรือชุมชนมิตรประชาฯ ถึง ชุมชประชาร่วมใจ 1 เพื่อศึกษาบริบทและวิเคราะห์พื้นที่ ในด้านของการพัฒนคุณภาพชีวิต และการดำเนินงานร่วมกับ SCG ในการจัดการขยะ การจัดการไขมันจากบ่อดักไขมัน และแผนการพัฒนาของ พอช.ด้านการจัดพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ ทั้งนี้ทางทีมออกแบบได้มีการจัดทำข้อมูลการพัฒนารูปแบบที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองสำหรับการออกแบบและติดตั้งระบบ Solar Cell และตัวอย่างรูปแบบการจัดพื้นที่สีเขียว พร้อมนวัตกรรมที่อาจเป็นแนวทางการพัฒนาร่วมกัน



“พื้นที่รูปธรรม คุณภาพชีวิต”

ผู้แทนคณะทำงานคุณภาพองค์กรผู้ใช้สินเชื่อ ร่วมกิจกรรมพื้นที่รูปธรรม “การพัฒนาอาชีพ ทำพิมเสนน้ำ” ของสก.ลาดพร้าวสามัคคี จำกัด โดยได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้จากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี และวิทยากรจาก ม.ราชภัฏพระนคร

“START Canal Creative Space”

ณ ชุมชนมิตรประชาพัฒนา เขตหลักสี่ **สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พร้อมด้วยทีมปฏิบัติการพื้นที่เขตหลักสี่ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์** ผู้แทนสำนักงานเขตหลักสี่ และคณะกรรมการสหกรณ์,คณะกรรมการชุมชนมิตรประชาพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะและสร้างอัตลักษณ์ชุมชน ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การออกแบบพื้นที่ส่วนกลางเพื่อจัดทำตลาดนัดชุมชน การปรับปรุงทัศนียภาพ "หน้าบ้าน น่ามอง" และการบริหารจัดการงบประมาณสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เช่น พลังงานทดแทน และกองทุนแรงจูงใจ









พอช.ลงพื้นที่สำรวจชุมชนเพื่อจัดทำข้อมูล ร่วมกับสำนักงานธนานุเคราะห์"

พอช. ร่วมลงพื้นที่สำนักงานธนานุเคราะห์ เพื่อสำรวจพื้นที่และความต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลอง โดยลงพื้นที่ 3 ชุมชนได้แก่ ชุมชนวัดรังสิต ปทุมธานี/ชุมชนเปรมประชาสมบูรณ์ ดอนเมือง และชุมชนมิตรประชา หลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อหารือและสำรวจข้อมูลชุมชน ประชากร กลุ่มเปราะบาง อาชีพ และกิจกรรมคุณภาพชีวิตที่ชุมชนดำเนินการ พร้อมสอบถามความต้องการการต่อยอดคุณภาพชีวิต อาชีพ รายได้ เพื่อทำแผนการสนับสนุนชุมชน โดย พอช. ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนโครงการพื้นที่สร้างสรรโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ และสนับสนุนพื้นที่รูปธรรม

“เชื่อมคน เชื่อมเมือง เชื่อมโอกาส” ร่วมหารือพัฒนาการสัญจรทางน้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลอง





ตัวแทนสำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ลงพื้นที่ชุมชนสามัคคีเทวสุนทร เขตจตุจักร ร่วมกับ บริษัท The Watertaxi Company เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาระบบขนส่งทางน้ำ และการเชื่อมต่อการเดินทางแบบบูรณาการระหว่าง “ล้อ–ราง–เรือ” เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงได้สำหรับประชาชนในพื้นที่ การหารือครั้งนี้มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ริมคลองให้เป็นมากกว่าพื้นที่สัญจร โดยเชื่อมโยงการพัฒนาระบบคมนาคมเข้ากับการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนริมคลอง ทั้งในด้านเศรษฐกิจชุมชน การสร้างโอกาสด้านอาชีพ และการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างรอบด้าน







ธนาคารโลก สมาชิกรัฐสภานานาชาติ ยลโฉม “บ้านมั่นคงมิตรประชา” ความสำเร็จบ้านมั่นคงริมคลองเปรมประชากร

พอช. นำคณะ สมาชิกรัฐสภานานาชาติ ธนาคารโลก ลงพื้นที่ศึกษาดูงานชุมชนมิตรประชา โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร บ้านมั่นคง พอช. (CODI’s Baan Mankong Community)” นำโดย นายกฤษดา สมประสงค์ ผู้อำนวยการ พอช. นางทิพย์รัตน์ นพลดารมย์ ที่ปรึกษา พอช. สำหรับคณะผู้แทนระดับสูงจากสมาชิกรัฐสภานานาชาติ ธนาคารโลก เข้าร่วมการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้แก่ Hon. Sven Clement สมาชิกรัฐสภาและประธาน Parliamentarian Network (PN) จากประเทศลักเซมเบิร์ก, Hon. Estelle Youssouffa รองผู้แทนแห่งสภาแห่งชาติฝรั่งเศส, Hon. He Ting Ru สมาชิกรัฐสภาสิงคโปร์, Hon. Federica Onori สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอิตาลี, Hon. Neil Coyle สมาชิกรัฐสภาสหราชอาณาจักร, Hon. Vlad Voiculescu สมาชิกสภายุโรป, Hon. Mariam Lashkhi สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจอร์เจีย ณ โรงแรมอัศวิน และชุมชนมิตรประชาพัฒนา เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

5.2.3 กิจกรรมการสนับสนุนเครือข่ายชุมชนริมคลอง

สร้างวินัยการเงินคนริมคลอง หนุนองค์กรผู้ใช้สินเชื่อ เน้นธรรมาภิบาลและการจัดการหนี้

QR CODE รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง เคาะงบประมาณปี 69 กว่า 5 แสนบาท จัดตั้งคณะทำงานใหม่ สร้างระบบบริหารจัดการหนี้และวินัยออมทรัพย์ใน 7 ชุมชนต้นแบบ เพื่อรากฐานบ้านมั่นคงที่เข้มแข็ง



กรุงเทพฯ/19 พฤศจิกายน 2568 –สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ **พอช.** ประชุม **"เครือข่ายทีมพัฒนาองค์กรผู้ใช้สินเชื่อชุมชนริมคลอง"** เพื่อออกแบบยุทธศาสตร์และเตรียมความพร้อมแผนงานประจำปี 2569 มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพด้านการเงินให้แก่ชุมชนริมคลองที่ได้รับสินเชื่อที่อยู่อาศัย ณ ห้องประชุม คปอ. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน บางกะปิ กรุงเทพฯ

วางแผนรุกปี69 ดีไซน์ 'บ้านมั่นคงริมคลอง' ครบวงจร เล็งพัฒนาทีมช่างและองค์กรการเงินชุมชน"

QR CODE รายละเอียดเพิ่มเติม



คณะทำงานทีมยุทธศาสตร์ฯ ประชุมวางแผนขับเคลื่อนชุมชนริมคลอง เตรียมมอบทะเบียนบ้าน "มิตรประชาพัฒนา" เขตหลักสี่ เป็นของขวัญให้ชาวบ้าน สนับสนุนงบประมาณพัฒนาองค์กรการเงินและกลุ่มช่างชุมชน เสริมรากฐานคุณภาพชีวิตคนริมคลอง

กรุงเทพฯ/22 พฤศจิกายน 2568 – สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ **พอช.** จัดประชุมคณะทำงานทีมยุทธศาสตร์ร่วมกับเครือข่ายคณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนคนริมคลอง (คพสค.) เพื่อติดตามความคืบหน้าและออกแบบ **"แผนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง"** ประจำปีงบประมาณ 2569 ณ ห้องประชุมไพบูลย์ วัลยศิริธรรม พอช. กรุงเทพฯ

สรุปผลประชาพิจารณ์ถอนสภาพที่ดิน 13 ไร่ ของผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย โครงการบ้านมั่นคงริมคลองเปรมฯ

QR CODE รายละเอียดเพิ่มเติม



เทศบาลตำบลหลักหก พอช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ณ วัดรังสิต เพื่อหารือการขอใช้และถอนสภาพพื้นที่สาธารณประโยชน์ 13 ไร่ 39 ตารางวา สำหรับโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร หลังพบครัวเรือนกว่า 200 รายได้รับผลกระทบจากการปรับแนวเขื่อน พอช. จึงเร่ง จัดสร้างบ้านแถว 2 ชั้น ภายใต้การบริหารจัดการของสหกรณ์ฯ ตั้งเป้าแล้วเสร็จปี 2570 พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมริมคลอง

QR CODE
รายละเอียดเพิ่มเติม

ปั้น ‘ของดีริมคลอง’ เสริมอาชีพ-ดูแลกลุ่มเปราะบาง หนุนกองทุน ‘รักษาดินรักษาบ้าน’ ยกระดับคุณภาพชีวิต

กรุงเทพฯ/12 ธันวาคม 2568 – สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. จัดประชุมเครือข่ายคุณภาพชีวิตและกองทุน เพื่อติดตามความก้าวหน้าและจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายชุมชนริมคลองประจำปี 2569 โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชนควบคู่ไปกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย ณ ห้องสินเชื่อ ชั้น 5 พอช. กรุงเทพฯ

ที่ประชุมได้ข้อสรุปในการขับเคลื่อนกิจกรรมหลัก 6 ด้าน เพื่อสร้างระบบนิเวศชุมชนริมคลองที่สมบูรณ์ ดังนี้ **1.ปักหมุด “ของดีริมคลอง”** วิเคราะห์ทุนและศักยภาพพื้นที่ผ่านระบบ Google Forms เพื่อจัดทำโปสเตอร์ “จุดเช็คพอยต์” ประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ชุมชนสู่สาธารณะ **2.การพัฒนาอาชีพ** จัดกิจกรรมพาชาวบ้านออกไปเรียนรู้อาชีพใหม่ๆ นอกพื้นที่ เพื่อนำมาปรับใช้และสร้างรายได้เสริมภายในเครือข่าย **3.ก๊ฟ้าเชื่อมสัมพันธ์** เตรียมจัดมหกรรมก๊ฟ้าชุมชนริมคลองในเดือนพฤษภาคม 2569 เพื่อสร้างความสามัคคีและพลังเครือข่าย **4.ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง** วางระบบสำรวจผู้ทุพพลภาพและกลุ่มเปราะบางรายกรณี เพื่อพิจารณาความช่วยเหลือเร่งด่วนและติดตามผลอย่างใกล้ชิด **5.ท่องเที่ยวชุมชน & วิสาหกิจ** ศึกษาดูงานวิสาหกิจต้นแบบ เพื่อยกระดับชุมชนริมคลองเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 6.**กองทุนรักษาดินรักษาบ้าน** เร่งประชาสัมพันธ์และรับสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบกองทุนเพื่อคุ้มครองสิทธิในที่อยู่อาศัย โดยตั้งเป้าคีย์ข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2569



“บ้านมั่นคงริมคลอง” ดอนเมือง ชูธรรมาภิบาลองค์กรผู้ใช้สินเชื่อ ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวชุมชน

ยกระดับธรรมาภิบาลองค์กรการเงินชุมชน ที่ประชุมได้ให้ความสำคัญกับการ “พัฒนาองค์กรผู้ใช้สินเชื่อ” เพื่อให้กลุ่มหรือสหกรณ์เคหสถานในชุมชนริมคลองมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ โดยมีการร่วมกันประเมินคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี (รอบ 6 เดือน) เพื่อวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งวางระบบคิดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ร่วมกันอย่างใกล้ชิด



ออกแบบกลไกขับเคลื่อนงาน 5 มิติ นอกจากมิติด้านการเงินแล้ว เครือข่ายฯ ยังได้ร่วมกันออกแบบทีมทำงานในระดับเขต เพื่อขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์บ้านมั่นคงริมคลองอย่างรอบด้าน ประกอบด้วย

1. **งานยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา** กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนในภาพรวมระดับเขต
2. **งานพัฒนาองค์กรผู้ใช้สินเชื่อ** สร้างวินัยทางการเงินและระบบบัญชีที่เข้มแข็ง
3. **งานช่างและก่อสร้าง** ควบคุมมาตรฐานการสร้างบ้านให้มั่นคงและปลอดภัย
4. **งานพัฒนาคุณภาพชีวิต** ดูแลสวัสดิการและสิ่งแวดล้อมชุมชนริมคลอง
5. **งานกองทุนและสวัสดิการ** บริหารจัดการทุนภายในชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเอง

QR CODE
รายละเอียดเพิ่มเติม

“กลไกสหกรณ์” หัวใจหลักสร้างความมั่นคงชุมชน “บ้านมั่นคงริมคลอง”





QR CODE
รายละเอียดเพิ่มเติม

อัปเกรดความรู้การเงิน หนุนสหกรณ์ชุมชนริมคลองก้าวสู่ธรรมาภิบาล



ดอนเมือง/19 กรกฎาคม 2569 — **สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช.** จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ **"การจัดการระบบการเงินรายครัวเรือน เพื่อส่งเสริมการบริหารของกลุ่ม/สหกรณ์ชุมชนริมคลองอย่างมีธรรมาภิบาล"** โดยมีเครือข่ายชุมชนริมคลองและผู้ปฏิบัติงาน พอช. กว่า 100 คนเข้าร่วม ณ โรงแรม เอเซีย แอร์พอร์ต ดอนเมือง

QR CODE
รายละเอียดเพิ่มเติม

Workshop เครือข่ายคลองลาดพร้าว-เปรมประชากร ทบทวนผลงานปี 69 พร้อมวางจังหวะก้าวปี 2570



QR CODE
รายละเอียดเพิ่มเติม

จัดทำโดย สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
(Community Organizations Development Institute (CODI))
912 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ : 0-2378-8300 ต่อ 8626
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@codi.or.th
E-mail : codi@codi.or.th
Web site : www.codi.or.th
Facebook : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน-CODI
