รายงานสถานะโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ วันที่ 21 กันยายน 2569


ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จในการบริหารโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด

1. รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง งบประมาณปี พ.ศ. 2569 (กลุ่มโครงการใหม่)

1.1 การพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง งบประมาณปี พ.ศ. 2569 มีเป้าหมายดำเนินการตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายปีในพื้นที่คลองเปรมประชากร จำนวน 151 ครัวเรือน วงเงินรวม 26,576,000 บาท (ยี่สิบหกล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็นงบบริหารจัดการโครงการ 2,258,960 บาท และงบสนับสนุนให้กับองค์กรชุมชน 24,317,040 บาท

การดำเนินการ ณ วันที่ 21 กันยายน 2569 มีการพิจารณาและเห็นชอบงบประมาณโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากรให้กับองค์กรชุมชน จำนวน 4 โครงการ 151 ครัวเรือน งบประมาณ 24,317,040 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 14,843,682 บาท คงเหลือ 9,473,358 บาท ดังนี้

องค์กรชุมชน	อนุมัติ		เบิกจ่าย	คงเหลือ รอเบิกจ่าย
	ครัวเรือน	จำนวนเงิน		
1.สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนหลังแฟลตร่วมพัฒนา จำกัด	122	19,306,000.00	10,620,800.00	8,685,200.00
2.สหกรณ์เคหสถานทำนบสตรีเหล็กร่วมพัฒนา จำกัด	11	1,644,500.00	1,429,502.00	221,998.00
3.สหกรณ์เคหสถานตาลคู่สมบูรณ์พูนทรัพย์ จำกัด	18	2,703,500.00	2,130,340.00	573,160.00
4.สหกรณ์เคหสถานแจ้งวัฒนะ 5 จำกัด	-	663,040.00	663,040.00	-
รวม	**151**	**24,317,040.00**	**14,843,682.00**	**9,473,358.00**

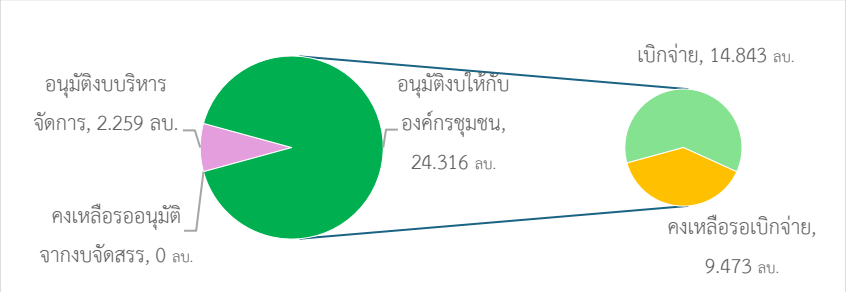

ทั้งนี้ อนุมัติงบประมาณสนับสนุนให้กับองค์กรชุมชนครบถ้วนทั้งวงเงินแล้ว

ความคืบหน้ารายโครงการ

องค์กรชุมชน/สถานะด้านการรื้อย้ายและก่อสร้าง	อนุมัติปี 69	เตรียมรื้อ	รื้อย้าย	ระหว่างสร้าง	สร้างเสร็จ
1.สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนหลังแฟลตร่วมพัฒนา จำกัด	122	รื้อแล้ว	35	-	-
2.สหกรณ์เคหสถานทำนบสตรีเหล็กร่วมพัฒนา จำกัด	11	รื้อแล้ว	11	-	11
3.สหกรณ์เคหสถานตาลคู่สมบูรณ์พูนทรัพย์ จำกัด	18	รื้อแล้ว	68	68	-
4.สหกรณ์เคหสถานแจ้งวัฒนะ 5 จำกัด	-	รื้อแล้ว	65	56	-
รวม	**151**	**24**	**179**	**124**	**11**

➢**สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนหลังแฟลตร่วมพัฒนา จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร**

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัย จำนวน 122 ครัวเรือน 19,306,000.00 บาท โดยเบิกจ่ายแล้ว 10,468,300.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.22 ของวงเงินที่ได้รับ คงเหลือ 8,837,700.00 บาท ซึ่งมีแผนดำเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ปัจจุบันสหกรณ์ฯ ได้รับอนุญาตให้เช่าที่ดินจากกรมธนารักษ์ เนื้อที่ 3-1-98.5 ไร่ และอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างบ้านจากกรมธนารักษ์ โดยได้ยื่นคำขอเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2569 และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จะดำเนินการยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน

เขตหลักสี่ตามลำดับ โดยการดำเนินงานที่ผ่านมามีความล่าช้า เนื่องจากสมาชิกบางส่วนขาดความเชื่อมั่นต่อโครงการจากความล่าช้าในกระบวนการพิจารณาอนุญาตของหน่วยงานราชการ รวมถึงมีข้อกังวลเกี่ยวกับความชัดเจนของแผนงานก่อสร้างเขื่อน ส่งผลให้สมาชิกเกิดความลังเลและกังวลต่อการรื้อย้ายบ้านเดิม ซึ่งสถาบันฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงข้อมูลและสร้างความเข้าใจกับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง รวมถึงร่วมกับคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ดำเนินการทบทวนจำนวนสมาชิกที่มีความพร้อมในการรื้อย้ายบ้านเดิมและก่อสร้างบ้านใหม่ในระยะแรก เพื่อเร่งให้เกิดรูปธรรมในการพัฒนาโครงการ **ส่งผลให้สหกรณ์สามารถทะยอยรื้อย้ายบ้านเดิมแล้ว รวม 35 ครัวเรือน** และจะเริ่มกระบวนการก่อสร้างบ้านทันทีเมื่อได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์และสำนักงานเขตหลักสี่ โดยคาดว่ากระบวนการพิจารณาอนุญาตจะใช้ระยะเวลาประมาณ 45–60 วัน ทั้งนี้ สถาบันฯ จะติดตามและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถดำเนินการตามแผนและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่คงเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ต่อไป





➢**สหกรณ์เคหสถานทำนบสตรีเหล็กร่วมพัฒนา จำกัด เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร** ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัย จำนวน 11 ครัวเรือน 1,644,500.00 บาท โดยเบิกจ่ายแล้ว 1,422,502.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.50 ของวงเงินที่ได้รับ คงเหลือ 221,998.00 บาท ซึ่งมีแผนดำเนินการเบิกจ่ายในช่วงเดือนมิถุนายน 2570 ผลการดำเนินงานพบว่า สหกรณ์ดำเนินการก่อสร้างบ้านรวมทั้งสิ้น 167 ครัวเรือน ประกอบด้วย บ้านที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบบ้านให้สมาชิกเข้าอยู่อาศัยแล้ว จำนวน 145 ครัวเรือน **(ในจำนวนดังกล่าวเป็นบ้านที่ได้รับการเสนอของบประมาณในปี 2569 จำนวน 11 ครัวเรือน)** และบ้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 22 ครัวเรือน โดยมีแผนส่งมอบบ้านให้กับสมาชิกในช่วงเดือนตุลาคม 2569



➢**สหกรณ์เคหสถานตาลคู่สมบูรณ์พูนทรัพย์ จำกัด เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร** ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัย จำนวน 18 ครัวเรือน 2,703,500.00 บาท โดยเบิกจ่ายแล้ว 2,101,590.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.75 ของวงเงินที่ได้รับ คงเหลือ 601,910.00 บาท ซึ่งมีแผนดำเนินการเบิกจ่ายในช่วงเดือน มิถุนายน 2570 ผลการดำเนินงานพบว่า สหกรณ์ดำเนินการก่อสร้างบ้านแล้วรวม 152 ครัวเรือน ประกอบด้วย บ้านที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 151 ครัวเรือน และบ้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 1 ครัวเรือน นอกจากนี้ สหกรณ์มีแผนก่อสร้างบ้านเพิ่มเติม จำนวน 59 ครัวเรือน โดยในจำนวนดังกล่าวเป็นบ้านที่ได้รับการเสนอของบประมาณในปี 2569 จำนวน 18 ครัวเรือน ในพื้นที่ชุมชนตาลคู่พัฒนา **ปัจจุบันดำเนินการรื้อย้ายบ้านเดิมแล้วและอยู่ระหว่างการก่อสร้างบ้าน 68 หลัง** ซึ่งมากกว่าจำนวนตามแผนงานการก่อสร้าง เนื่องจากมีสมาชิกสนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมจากการเห็นรูปธรรมงานพัฒนา





➢**สหกรณ์เคหสถานแจ้งวัฒนะ 5 จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร** ได้รับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินการตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 663,040.00 บาท โดยเบิกจ่ายงบประมาณแล้วทั้งวงเงิน คิดเป็นร้อยละ 100 ของวงเงินที่ได้รับ สหกรณ์มีแผนก่อสร้างบ้านรวม 81 ครัวเรือน ดำเนินการรื้อย้ายบ้านเดิมแล้ว จำนวน 65 ครัวเรือน ปัจจุบันผู้รับจ้างก่อสร้างเริ่มดำเนินการล้อมรั้วตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเตรียมก่อสร้างบ้านในเฟสที่ 1 จำนวน 56 ครัวเรือน



1.2 ภาพรวมการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มีการอนุมัติงบสนับสนุนให้กับองค์กรชุมชนและภาคีพัฒนา 29 โครงการ 345 ครัวเรือน 69,375,472 บาท เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 48,246,662 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.54 คงเหลือรอเบิกจ่าย 21,128,810 บาท ดังนี้

ปีงบประมาณ/ สนับสนุนชุมชนริมคลอง	รหัสงบ	ปีงบ	ดำเนินการปี 2569 (กลุ่มใหม่ อนุมัติ 2569)				ร้อยละการเบิกจ่าย
			อนุมัติระหว่างปี		เบิกจ่าย (กลุ่ม2569)	คงเหลือรอเบิกจ่าย	
			ครัวเรือน	จำนวนเงิน			
งบโครงการบ้านมั่นคง		2559	-	15,780,557	14,283,630	1,496,927	90.51
งบสนับสนุนการพัฒนาฯ และงบช่วยเหลือฯ		2560	49	5,529,500	4,371,845	1,157,655	79.06
1.งบสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภคชุมชนริ	ค86568		49	3,576,000	2,538,095	1,037,905	
2.งบช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเสียโอกาสชุมชนริมคลอ	ค86668			1,953,500	1,833,750	119,750	
3.งบช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนริมคล	ค86700	2561		2,119,000	-	2,119,000	-
4.โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรม	86800	2563	145	21,516,575	14,634,705	6,881,870	68.02
5.โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรม	86900	2564				-	
6.โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรม	86000	2565				-	
7.โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรม	86100	2566				-	
8.โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรม	86200	2567				-	
9.โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรม	86300	2568		112,800	112,800	-	100.00
10.โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง	86400	2569	151	24,317,040	14,843,682	9,473,358	61.04
รวมทั้งสิ้น			345	69,375,472	48,246,662	21,128,810	69.54

2. งบประมาณโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2568 (กลุ่มโครงการเดิม) *ไม่รวมงบโครงการบ้านมั่นคง*

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มีงบคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รวม 111,687,187 บาท โดยมีการเบิกจ่ายระหว่างปี 13,168,815 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.79 ของวงเงินคงเหลือยกมา มีการคืนโครงการและงบประมาณ จำนวน 170 ครัวเรือน 25,167,205 บาท ทั้งนี้ ได้รับโอนคืนงบประมาณ จำนวน 22,148,500 บาท มีงบที่อยู่ระหว่างเรียกคืนเงินที่เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน 11,753,583 บาท **ส่งผลให้คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย (กรณีได้รับคืนเงินที่เบิกจ่ายไปแล้ว) จำนวน 95,280,885 บาท** โดยมีการอนุมัติคงงบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว (ใช้ดำเนินการแล้ว) จำนวน 218,782 บาท ดังนี้

ปีงบประมาณ/ สนับสนุนชุมชนริมคลอง	รหัสงบ	ปีงบ	คงเหลือรอเบิกจ่าย (กรณีรับคืนเงินที่เบิกจ่ายไปแล้ว)	ดำเนินการปี 2569 (กลุ่มเดิม)						
				เบิกจ่ายระหว่างปี	คืนงบระหว่างปี		คงเหลือรอเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระหว่างเรียกคืนงบที่เบิกจ่ายไปแล้ว	คงเหลือรอเบิกจ่าย (กรณีรับคืนเงินที่เบิกจ่ายไปแล้ว)
					ครัวเรือน	จำนวนเงิน				
งบโครงการบ้านมั่นคง		2559	0.00	-			0		504,000	0
งบสนับสนุนการพัฒนาฯ และงบช่วยเหลือฯ		2560	12,637,154	-	-	-	12,637,154		11,753,583	12,418,372
1.งบสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภคชุมชนริ	ค86568		8,700,654	-	-	-	8,700,654		2,937,333	8,700,654
2.งบช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเสียโอกาสชุมชนริมคลอ	ค86668		3,936,500	-		-	3,936,500		8,816,250	3,717,718
3.งบช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนริมคล	ค86700	2561	-		40	5,880,000	- 5,880,000			-
4.โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรม	86800	2563	90,189,203	12,372,815	113	16,745,705	61,070,683	13.72		77,339,183
5.โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรม	86900	2564	796,000	796,000			-	100.00		-
6.โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรม	86000	2565	-				-			-
7.โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรม	86100	2566	-				-			-
8.โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรม	86200	2567	6,697,200		17	2,541,500	4,155,700			4,155,700
9.โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรม	86300	2568	1,367,630				1,367,630			1,367,630
รวมทั้งสิ้น			111,687,187	13,168,815	170	25,167,205	73,351,167	11.79	12,257,583	95,280,885
รวมทั้งสิ้น (ไม่รวมงบโครงการบ้านมั่นคงปี 2559)			111,687,187	13,168,815	170	25,167,205	73,351,167	11.79	11,753,583	95,280,885

3. ภาพรวมงบประมาณโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2569

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ได้รับจัดสรรงบประมาณดำเนินการ รวม 10,302 ครัวเรือน งบประมาณ 1,778,416,000 บาท โดยมีการอนุมัติงบประมาณสุทธิ 7,703 ครัวเรือน 1,408,517,491.42 บาท เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 1,304,431,629.42 บาท โดยอยู่ระหว่างเรียกคืนเงินที่เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน 12,257,583 บาท **ส่งผลให้คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย (กรณีหากได้รับคืนเงินที่เบิกจ่ายไปแล้ว) จำนวน 116,562,227 บาท** ทั้งนี้มีการอนุมัติคงงบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว (ใช้ดำเนินการแล้ว) จำนวน 218,782 บาท

ทั้งนี้ ในการดำเนินการระยะต่อไป คงเหลือเป้าหมายดำเนินการ รวม 3,372 ครัวเรือน 561,132,782.54 บาท ดังนี้

ปีงบประมาณ/ สนับสนุนชุมชนริมคลอง	รหัสงบ	ปีงบ	กรอบที่ได้รับจัดสรร		(ณ 21 กันยายน 2569) อนุมัติสุทธิ (สะสม)		เบิกจ่ายสุทธิ (สะสม)	ระหว่างเรียกคืนงบที่เบิกจ่ายไปแล้ว	อนุมัติคงงบที่เบิกจ่ายไป	คงเหลือรอเบิกจ่าย (กรณีหักคืนเงินที่เบิกจ่ายไปแล้ว)	คงเหลือเป้าหมายดำเนินการต่อ รอ	
			ครัวเรือน	งบประมาณ	ครัวเรือน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน				ครัวเรือน	รวม
				A		B	C	D	E	F=B-C+E+D		G=A-B
งบโครงการบ้านมั่นคง		2559	-	-	813	203,205,938.96	203,283,936.96	504,000.00		426,002.00	-	-
งบสนับสนุนการพัฒนาฯ และงบช่วยเหลือฯ		2560	4,696	751,360,000	2,890	440,304,331.00	438,481,887.00	11,753,583	218,782	13,794,809.00	1,806	299,084,004.00
1.งบสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภคชุมชนริ	ค86568		4,696		2,890	188,028,344.00	181,227,118.00	2,937,333.00		9,738,559.00	1,806	147,147,023.00
2.งบช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเสียโอกาสชุมชนริมคลอ	ค86668					204,869,587.00	209,848,369.00	8,816,250.00	218,782.00	4,056,250.00		151,936,981.00
3.งบช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนริมคล	ค86700	2561	905	199,680,000	865	195,681,603.46	193,681,603.46	-		2,000,000.00		3,998,396.54
4.โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรม	86800	2563	3,115	548,240,000	2,846	502,241,778.00	418,020,725.00	-		84,221,053.00	269	45,998,222.00
5.โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรม	86900	2564	995	175,120,000	15	16,142,224.00	16,142,224.00	-		-	980	158,977,776.00
6.โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรม	86000	2565	200	35,200,000	-	2,228,160.00	2,228,160.00	-		-	200	32,971,840.00
7.โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรม	86100	2566	100	17,600,000	-	1,114,100.00	1,114,100.00	-		-	100	16,485,900.00
8.โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรม	86200	2567	70	12,320,000	53	8,703,356.00	4,613,906.00	-		4,089,450.00	17	3,616,644.00
9.โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรม	86300	2568	70	12,320,000	70	12,320,000.00	10,952,370.00	-		1,367,630.00	-	-
10.โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง	86400	2569	151	26,576,000	151	26,576,000.00	17,102,642.00	-		9,473,358.00	-	-
รวมทั้งสิ้น			10,302	1,778,416,000	7,703	1,408,517,491.42	1,305,621,554.42	12,257,583.00	218,782.00	115,372,302.00	3,372	561,132,782.54
รวมทั้งสิ้น (ไม่รวมงบโครงการบ้านมั่นคงปี 2559)			10,302	1,778,416,000	6,890	1,205,311,552.46	1,102,337,617.46	11,753,583.00	218,782.00	114,946,300.00	3,372	561,132,782.54

4. โครงการที่คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่ายภายใต้การพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง

รวม 115,372,302.00 บาท

4.1 งบโครงการบ้านมั่นคง จำนวน 2 โครงการ จำนวนเงินคงเหลือ 426,002 บาท

ลำดับ	รหัสโครงการ	องค์กรชุมชน	คงเหลือสุทธิ
1	PT046869-03491	โครงการสนับสนุนบ้านมั่นคงที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนริมคลอง เปรม ประชากร ของ กลุ่มออมทรัพย์แจ้งวัฒนะ 5 จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	245,652
2	PT046869-03620	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยบ้านมั่นคง สหกรณ์เคหสถานบ้านเพื่อที่อยู่อาศัยบางบัวเชิงสะพานไม้ 1 จำกัด	180,350
			426,002

4.2 งบประมาณปี พ.ศ. 2560 งบสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภคชุมชนริมคลอง ค86568 และงบช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเสียโอกาสชุมชนริมคลอง ค86668 คงเหลือจำนวน 10 โครงการ จำนวนเงินคงเหลือ 13,794,809 บาท

ลำดับ	รหัสโครงการ	องค์กรชุมชน	คงเหลือ	ระหว่างเรียกคืน	อนุมัติคงไว้	คงเหลือสุทธิ
1	PT116868-03028	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองลาดพร้าวจตุจักร จำกัด (หลังกรมวิทยาศาสตร์)	1,534,500			1,534,500
2	PT116868-01832	ชุมชนหลังสมาคมโรงเรียนไทย-ญี่ปุ่น โดย สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงห้วยขวาง จำกัด	1,772,890			1,772,890
3	PT116869-01652	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนพหลโยธิน 32 จำกัด	463,650			463,650
4	PT116869-03409	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเพิ่มทรัพย์สินสมบุญ จำกัด (ชุมชนพัฒนาหมู่ 1)	58,500.00			58,500.00
5	PT116869-03408	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเพิ่มทรัพย์สินสมบุญ จำกัด (ชุมชนพัฒนาหมู่ 2)	635,505.00			635,505.00
6	HS-60-0025	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนลาดพร้าว 80	- 112,532		112,532	-
7	HS-60-0039	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนสามัคคีร่วมใจ	- 175,000	175,000		-

ลำดับ	รหัสโครงการ	องค์กรชุมชน	คงเหลือ	ระหว่างเรียกคืน	อนุมัติคงไว้	คงเหลือสุทธิ
8	HS-60-0058	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนริมคลองบางซื่อลาดพร้าว 34	- 8,540,833	8,434,583	106,250	-
9	HS-60-0081	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนคลองเสนานิคม 2	- 2,103,914	3,144,000		1,040,086
10	HS-60-0036	สหกรณ์เคหสถานเครือข่ายคลองบางเขน จำกัด (ชุมชนพหลโยธิน 32 กลุ่ม 2)	1,872,000			1,872,000
11	HS-60-0080	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนพหลโยธิน 46	1,950,040			1,950,040
12	HS-60-0083	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนริมคลองลาดพร้าวภาวนา	2,700,342			2,700,342
13	HS-60-0084	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนหลังตลาดสุภาพงษ์	1,767,296			1,767,296
			1,822,444	**11,753,583**	**218,782**	**13,794,809**

4.3 งบประมาณปี พ.ศ. 2561 งบช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนริมคลอง ค86700 คงเหลือจำนวน 1 โครงการ จำนวนเงินคงเหลือ 2,000,000 บาท

ลำดับ	รหัสโครงการ	องค์กรชุมชน	คงเหลือสุทธิ
1	ระหว่างบันทึกโครงการ *ระหว่างเสนอปรับแผนงาน*	โครงการพื้นที่สร้างสรรค์ สู่การจัดการที่ยั่งยืนอย่างมีส่วนร่วม ปี 2569 โดยเครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง	2,000,000
			2,000,000

4.4 งบประมาณปี พ.ศ. 2563 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร 86800 คงเหลือจำนวน 23 โครงการ จำนวนเงินคงเหลือ 84,221,053 บาท

ลำดับ	รหัสโครงการ	องค์กรชุมชน	คงเหลือสุทธิ
1	PT116863-05813	สหกรณ์เคหสถานศิษย์หลวงปู่ขาว จำกัด	820,000
2	PT116863-07909	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงประเสริฐเปรมประชา จำกัด	7,497,000
3	PT116863-07912	สหกรณ์เคหสถานร่มไทรงามพัฒนา จำกัด	16,464,000
4	PT116863-07926	สหกรณ์เคหสถานประชากร 3 จำกัด	477,630
5	PT116863-09414	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนหลักหก จำกัด	26,709,835
6	PT116863-09417	สหกรณ์เคหสถานแจ้งวัฒนะ 5 จำกัด	2,928,420
7	PT116863-09472	สหกรณ์เคหสถานชุมชนร่วมพัฒนา จำกัด	14,538,700
8	PT116865-06462	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนหลักหก จำกัด	1,800,000
9	PT116865-06532	สหกรณ์เคหสถานชุมชนปู่เจ้าสมิงพรายสะพานปูน ดอนเมือง จำกัด	152,858
10	PT116866-05594	สหกรณ์เคหสถานแจ้งวัฒนะ 5 จำกัด (ซอยต้นสน)	300,000
11	PT116866-05595	สหกรณ์ฌคหสถานพัฒนา 99 มีสุขร่วมใจ จำกัด	67,500
12	PT116866-05596	สหกรณ์เคหสถานชุมชนปู่เจ้าสมิงพรายสะพานปูน ดอนเมือง จำกัด	89,000
13	PT116866-05597	สหกรณ์เคหสถานศิษย์หลวงปู่ขาว จำกัด	135,000
14	PT116866-05598	สหกรณ์เคหสถานประชากร 3 จำกัด	105,000
15	PT116867-01528	สหกรณ์เคหสถานแจ้งวัฒนะ 5 จำกัด (อยู่ดีมีสุข)	133,170
16	PT116868-01874	สหกรณ์เคหสถานคลองเปรมประชาพัฒนา จำกัด	190,320
17	PT116869-01578	สหกรณ์เคหสถานตาลคู่สมบูรณ์พูนทรัพย์ จำกัด	147,500
18	PT116869-03146	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จำกัด	6,660,000
19	PT176864-03270	สหกรณ์เคหสถานประชากร 3 จำกัด	68,250
20	PT176864-04202	สหกรณ์เคหสถานชุมชนร่วมพัฒนา จำกัด	3,328,500
21	PT176864-04204	สหกรณ์เคหสถานศิษย์หลวงปู่ขาว จำกัด	730,000
22	PT176864-04277	สหกรณ์เคหสถานชุมชนปู่เจ้าสมิงพรายสะพานปูน ดอนเมือง จำกัด	804,000
23	PT116869-03493	สหกรณ์เคหสถานชุมชนแจ้งวัฒนะ 5 จำกัด	74,370
			84,221,053

4.5 งบประมาณปี พ.ศ. 2567 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร 86200
คงเหลือจำนวน 1 โครงการ จำนวนเงินคงเหลือ 4,089,450 บาท

ลำดับ	รหัสโครงการ	องค์กรชุมชน	คงเหลือสุทธิ
1	PT116867-06117	สหกรณ์เคหสถานตาลคู่สมบูรณ์พูนทรัพย์ จำกัด (ตาลคู่พัฒนา)	4,089,450
			4,089,450

4.6 งบประมาณปี พ.ศ. 2568 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร 86300
คงเหลือจำนวน 2 โครงการ จำนวนเงินคงเหลือ 1,367,630 บาท

ลำดับ	รหัสโครงการ	องค์กรชุมชน	คงเหลือสุทธิ
1	PT116868-00028	สหกรณ์เคหสถานร่มไทรงามพัฒนา จำกัด	867,630
2	PT116868-01874 (นับปี2563)	สหกรณ์เคหสถานคลองเปรมประชาพัฒนา จำกัด	500,000
			1,367,630


4.7 งบประมาณปี พ.ศ. 2569 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร 86400
คงเหลือจำนวน 2 โครงการ จำนวนเงินคงเหลือ 9,473,358 บาท

ลำดับ	รหัสโครงการ	องค์กรชุมชน	คงเหลือสุทธิ
1	PT116869-00126	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนหลังแฟลตร่วมพัฒนา จำกัด	8,685,200.00
2	PT116869-01824	สหกรณ์เคหสถานทำนบสตรีเหล็กร่วมพัฒนา จำกัด	214,998.00
3	PT116869-01578 (นับปี2563)	สหกรณ์เคหสถานตาลคู่สมบูรณ์พูนทรัพย์ จำกัด	573,160.00
			9,473,358

5. สถานะการดำเนินงานในระบบโปรแกรมสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

จำนวน 2 โปรแกรม ได้แก่ โปรแกรมบริหารงานบ้านมั่นคง CodiBMOS และ โปรแกรมบริหารจัดการโครงการ CodiPMS มีโครงการที่ยกมาดำเนินการในปี พ.ศ. 2569 จำนวน 155 โครงการ ซึ่งมีการปิดโครงการระหว่างปี รวม 30 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 19.35 ของโครงการที่ยกมา) ดังนี้

โปรแกรม	ยกมาจากปี 2568	ดำเนินการปิดโครงการ ปี 2569				ปิดโครงการรวม	คงเหลือดำเนินการ / Active
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
CodiBMOS	54	-	-	1	2	3	51
CodiPMS	101	17	1	4	5	27	74
รวม	**155**	**17**	**1**	**5**	**7**	**30**	**125**

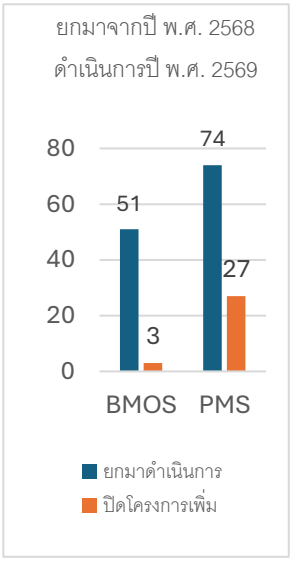

ทั้งนี้โครงการที่มีสถานะ “ดำเนินการ / Active” จำนวน 125 โครงการ

- มีการเบิกจ่ายงบประมาณครบทั้งวงเงินแล้ว 96 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 76.80 ของโครงการคงเหลือ) โดยอยู่ระหว่างการติดตามสถานะด้านการก่อสร้างบ้าน สรุปผลการดำเนินงาน และติดตามการรายงานผลการดำเนินงานและปิดโครงการ โดยจะได้มีการสนับสนุนให้องค์กรชุมชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
- คงเหลือโครงการที่คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 29 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 23.20 ของโครงการคงเหลือ) โดยอยู่ระหว่างการติดตามสถานะงานเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับการก่อสร้างบ้าน

****

สถานะการดำเนินงานในระบบโปรแกรมสารสนเทศพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน (ยกมา 30 กันยายน 2568)

"ดำเนินการ / Active" รวมทั้งสิ้น 127 โครงการ

ลำดับ	ปี	รหัสโครงการ	องค์กรผู้รับผลประโยชน์	งบประมาณอนุมัติ	เบิกจ่าย	รับคืน	คงเหลือ	โปรแกรม
1	2557	HS-57-0037	กลุ่มออมทรัพย์ประชานุกูล	18,562,500.00	9,717,500.00	8,845,000.00	-	BMOS
2	2558	HS-58-0057	กลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยบางบัวร่วมใจพัฒนา (เชิงสะพานไม้ 2)	30,591,000.00	27,636,000.00	2,955,000.00	-	BMOS
3	2558	HS-58-0110	วังหิน(คณะกรรมการชุมชน)	12,259,000.00	9,132,300.00	3,126,700.00	-	BMOS
4	2558	HS-58-0111	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา จำกัด	54,596,000.00	24,053,250.00	30,542,750.00	-	BMOS
5	2558	HS-58-0145	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนริมคลองพัฒนา	16,849,000.00	16,849,000.00	-	-	BMOS
6	2559	HS-59-0020	ชุมชนพัฒนาหมู่ 1	18,837,000.00	9,717,500.00	9,119,500.00	-	BMOS
7	2559	HS-59-0021	กลุ่มออมทรัพย์หลังสมาคม รร.ไทย-ญี่ปุ่น	14,053,000.00	9,823,027.00	4,229,973.00	-	BMOS
8	2559	HS-59-0022	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนริมคลองลาดพร้าวประชาอุทิศ	16,594,500.00	15,859,500.00	735,000.00	-	BMOS
9	2559	HS-59-0024	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนสามัคคีร่วมใจ	14,040,000.00	2,448,000.00	11,592,000.00	-	BMOS
10	2559	HS-59-0025	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา	30,306,660.00	16,977,660.00	13,329,000.00	-	BMOS
11	2559	HS-59-0026	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนร้อยกรอง	17,328,533.00	9,624,533.00	7,704,000.00	-	BMOS
12	2559	HS-59-0062	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนริมคลอง กสบ.หมู่ 5	6,212,500.00	6,211,250.00	1,250.00	-	BMOS
13	2560	HS-60-0006	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนพหลโยธิน 32 จำกัด	13,246,990.00	12,460,990.00	786,000.00	-	BMOS
14	2560	HS-60-0007	กลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยหลัง วค.จันทรเกษม	7,057,190.00	7,027,190.00	30,000.00	-	BMOS
15	2560	HS-60-0008	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงริมคลองสอง จำกัด (ซอยพรพระร่วง)	19,621,000.00	19,621,000.00	-	-	BMOS
16	2560	HS-60-0009	กลุ่มออมทรัพย์บ้านมั่นคงชุมชนหลังกรมวิทยาศาสตร์	19,354,680.00	11,197,180.00	8,157,500.00	-	BMOS
17	2560	HS-60-0017	สหกรณ์เคหสถานยิ่งเจริญก้าวหน้า จำกัด	21,358,400.00	15,000,875.00	6,357,525.00	-	BMOS
18	2560	HS-60-0020	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนสนามมวย ทอ. เพื่อโครงการบ้านมั่นคง	6,175,500.00	5,876,500.00	299,000.00	-	BMOS
19	2560	HS-60-0021	กลุ่มออมทรัพย์บ้านมั่นคงชุมชนวัดบางบัว	15,332,810.00	15,332,810.00	-	-	BMOS
20	2560	HS-60-0024	กลุ่มออมทรัพย์ริมคลองสอง	53,579,000.00	53,579,000.00	-	-	BMOS
21	2560	HS-60-0025	กลุ่มออมทรัพย์ลาดพร้าว 80	28,921,380.00	13,447,980.00	15,473,400.00	-	BMOS
22	2560	HS-60-0035	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนหลัง วค.จันทรเกษม กลุ่ม 2	13,902,500.00	13,798,750.00	103,750.00	-	BMOS
23	2560	HS-60-0036	สหกรณ์เคหสถานเครือข่ายคลองบางเขน จำกัด (ชุมชนพหล 32 กลุ่ม 2)	6,732,000.00	4,860,000.00	-	-	BMOS
24	2560	HS-60-0037	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา	5,681,400.00	5,657,400.00	24,000.00	-	BMOS
25	2560	HS-60-0038	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนร้อยกรอง	4,342,400.00	4,342,400.00	-	-	BMOS
26	2560	HS-60-0039	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนสามัคคีร่วมใจ	2,379,112.00	1,800,295.00	578,817.00	-	BMOS
27	2560	HS-60-0042	กลุ่มออมทรัพย์ กสบ.พัฒนา	9,056,000.00	8,906,500.00	149,500.00	-	BMOS
28	2560	HS-60-0047	กลุ่มออมทรัพย์ กสบ.สามัคคีร่วมใจ	4,451,400.00	4,304,400.00	147,000.00	-	BMOS
29	2560	HS-60-0058	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนริมคลองบางซื่อลาดพร้าว 34	12,707,500.00	8,540,833.00	4,166,667.00	-	BMOS
30	2560	HS-60-0059	กลุ่มชุมชนริมคลองบางซื่อรัชดาภิเษก	8,415,900.00	8,415,900.00	-	-	BMOS
31	2560	HS-60-0063	สหกรณ์เคหสถานชายคลองบางบัว จำกัด	50,119,000.00	50,119,000.00	-	-	BMOS
32	2560	HS-60-0080	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนพหลโยธิน 46	13,824,500.00	11,613,210.00	261,250.00	1,950,040.00	BMOS
33	2560	HS-60-0081	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนชายคลองเสนานิคม 2	14,878,000.00	12,127,914.00	1,710,000.00	1,040,086.00	BMOS
34	2560	HS-60-0083	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนริมคลองลาดพร้าวภาวนา	16,338,000.00	13,345,158.00	292,500.00	2,700,342.00	BMOS
35	2560	HS-60-0084	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนหลังตลาดสุภาพงษ์	11,371,000.00	9,531,204.00	72,500.00	1,767,296.00	BMOS
36	2560	HS-60-0130	กลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยเครือข่ายสิทธิชุมชนคนริมคลอง	20,749,350.00	18,733,850.00	2,015,500.00	-	BMOS
37	2561	HS-61-0017	กลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยคลองสามแสนสุข	3,463,449.00	3,463,449.00	-	-	BMOS
38	2561	HS-61-0044	ชุมชนพัฒนาหมู่ 1	237,800.00	237,800.00	-	-	BMOS
39	2561	HS-61-0046	กลุ่มออมทรัพย์ประชานุกูล	12,800.00	12,800.00	-	-	BMOS
40	2561	HS-61-0047	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนริมคลอง กสบ.หมู่ 5	753,000.00	753,000.00	-	-	BMOS
41	2561	HS-61-0048	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนริมคลองพัฒนา	378,000.00	378,000.00	-	-	BMOS
42	2561	HS-61-0049	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา จำกัด	5,298,480.00	4,479,480.00	819,000.00	-	BMOS
43	2561	HS-61-0051	วังหิน(คณะกรรมการชุมชน)	2,883,000.00	2,820,000.00	63,000.00	-	BMOS
44	2561	HS-61-0052	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนริมคลองลาดพร้าวประชาอุทิศ	1,159,440.00	1,159,440.00	-	-	BMOS
45	2561	HS-61-0053	กลุ่มออมทรัพย์หลังสมาคม รร.ไทย-ญี่ปุ่น	363,000.00	360,000.00	3,000.00	-	BMOS
46	2561	HS-61-0083	กลุ่มออมทรัพย์บ้านใหม่พัฒนา	1,590,000.00	1,590,000.00	-	-	BMOS

ลำดับ	ปี	รหัสโครงการ	องค์กรผู้รับผลประโยชน์	งบประมาณอนุมัติ	เบิกจ่าย	รับคืน	คงเหลือ	โปรแกรม
47	2561	HS-61-0135	กลุ่มออมทรัพย์บ้านใหม่พัฒนา	5,524,000.00	5,524,000.00	-	-	BMOS
48	2562	HS-62-0029	สหกรณ์เคหสถานสามัคคีเทวสุนทร จำกัด	15,232,300.00	10,497,300.00	4,735,000.00	-	BMOS
49	2562	HS-62-0030	สหกรณ์เคสถานชุมชนประชาร่วมใจ 1 จำกัด	45,086,000.00	45,086,000.00	-	-	BMOS
50	2562	HS-62-0034	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จำกัด	54,053,060.00	54,053,060.00	-	-	BMOS
51	2564	HS-64-0001	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงห้วยขวาง จำกัด	7,913,755.00	7,913,755.00	-	-	BMOS
52	2563	PT116863-05813	สหกรณ์เคหสถานศิษย์หลวงปู่ขาว จำกัด	23,050,000.00	22,042,500.00	-	820,000.00	PMS
53	2563	PT116863-05814	สหกรณ์เคหสถานตลาดหลักสี่ จำกัด	11,714,500.00	11,714,500.00	-	-	PMS
54	2563	PT116863-05815	สหกรณ์เคหสถานพัฒนา 99 มีสุขร่วมใจ จำกัด	11,261,000.00	11,261,000.00	-	-	PMS
55	2563	PT116863-05818	สหกรณ์เคหสถานเทวมั่นคง จำกัด	13,201,500.00	13,201,500.00	-	-	PMS
56	2563	PT116863-07906	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเปรมประชาสมบูรณ์ จำกัด	15,315,400.00	15,315,400.00	-	-	PMS
57	2563	PT116863-07909	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงประเสริฐเปรมประชา จำกัด	24,681,600.00	17,184,600.00	-	7,497,000.00	PMS
58	2563	PT116863-07912	สหกรณ์เคหสถานร่มไทรงามพัฒนา จำกัด	37,831,000.00	21,367,000.00	-	16,464,000.00	PMS
59	2563	PT116863-07925	สหกรณ์เคหสถานทำนบสตรีเหล็กร่วมพัฒนา จำกัด	24,280,500.00	22,995,725.00	-	1,284,775.00	PMS
60	2563	PT116863-07926	สหกรณ์เคหสถานประชากร 3 จำกัด	22,366,250.00	21,888,620.00	-	477,630.00	PMS
61	2563	PT116863-09414	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนหลักหก จำกัด	55,923,650.00	29,213,815.00	-	26,709,835.00	PMS
62	2563	PT116863-09415	สหกรณ์เคหสถานตาลคู่สมบูรณ์พูนทรัพย์ จำกัด	20,504,100.00	20,504,100.00	-	-	PMS
63	2563	PT116863-09417	ชุมชนแจ้งวัฒนะ 5	12,114,120.00	5,641,120.00	-	6,473,000.00	PMS
64	2563	PT116863-09472	ชุมชนร่วมพัฒนา	23,976,500.00	9,437,800.00	-	14,538,700.00	PMS
65	2563	PT116863-09473	สหกรณ์เคหสถานคลองเปรมประชาพัฒนา จำกัด	30,925,500.00	30,925,500.00	-	-	PMS
66	2564	PT176864-03270	สหกรณ์เคหสถานประชากร 3 จำกัด	1,943,500.00	1,875,250.00	-	68,250.00	PMS
67	2564	PT176864-03493	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จำกัด	16,243,170.00	16,243,170.00	-	-	PMS
68	2564	PT176864-03494	สหกรณ์เคหสถานตาลคู่สมบูรณ์พูนทรัพย์ จำกัด	897,000.00	897,000.00	-	-	PMS
69	2564	PT176864-03495	สหกรณ์เคหสถานทำนบสตรีเหล็กร่วมพัฒนา จำกัด	747,500.00	747,500.00	-	-	PMS
70	2564	PT176864-04199	สหกรณ์เคหสถานตลาดหลักสี่ จำกัด	4,036,500.00	4,036,500.00	-	-	PMS
71	2564	PT176864-04200	สหกรณ์เคหสถานพัฒนา 99 มีสุขร่วมใจ จำกัด	3,193,000.00	3,193,000.00	-	-	PMS
72	2564	PT176864-04201	สหกรณ์เคหสถานคลองเปรมประชาพัฒนา จำกัด	3,087,000.00	3,087,000.00	-	-	PMS
73	2564	PT176864-04202	ชุมชนร่วมพัฒนา	7,173,500.00	3,845,000.00	-	3,328,500.00	PMS
74	2564	PT176864-04203	สหกรณ์เคหสถานเทวมั่นคง จำกัด	4,303,250.00	4,303,250.00	-	-	PMS
75	2564	PT176864-04204	สหกรณ์เคหสถานศิษย์หลวงปู่ขาว จำกัด	3,139,500.00	2,409,500.00	-	730,000.00	PMS
76	2564	PT176864-04276	สหกรณ์เคสถานชุมชนประชาร่วมใจ 1 จำกัด	882,000.00	882,000.00	-	-	PMS
77	2564	PT176864-04277	สหกรณ์เคหสถานชุมชนปู่เจ้าสมิงพรายสะพานปูน ดอนเมือง จำกัด	9,507,390.00	8,703,390.00	-	804,000.00	PMS
78	2564	PT176864-04278	สหกรณ์เคหสถานวัดดอนเมืองด้านเหนือ จำกัด	14,145,735.00	14,145,735.00	-	-	PMS
79	2564	PT216864-04206	เครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	PMS
80	2565	PT116865-03973	สหกรณ์เคหสถานชุมชนประชาร่วมใจ 1 จำกัด	1,575,000.00	1,575,000.00	-	-	PMS
81	2565	PT116865-04129	สหกรณ์เคหสถานสามัคคีเทวสุนทร จำกัด	48,000.00	48,000.00	-	-	PMS
82	2565	PT116865-06070	สหกรณ์เคหสถานตลาดหลักสี่ จำกัด	1,345,500.00	1,345,500.00	-	-	PMS
83	2565	PT116865-06462	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนหลักหก จำกัด	3,290,000.00	1,490,000.00	-	1,800,000.00	PMS
84	2565	PT116865-06526	สหกรณ์เคหสถานชุมชนประชาร่วมใจ 1 จำกัด	2,205,000.00	2,205,000.00	-	-	PMS
85	2565	PT116865-06529	สหกรณ์เคหสถานเทวมั่นคง จำกัด	975,500.00	975,500.00	-	-	PMS
86	2565	PT116865-06532	สหกรณ์เคหสถานชุมชนปู่เจ้าสมิงพรายสะพานปูน ดอนเมือง จำกัด	2,650,900.00	2,498,042.00	-	152,858.00	PMS
87	2565	PT116865-06533	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเปรมประชาสมบูรณ์ จำกัด	4,335,500.00	4,335,500.00	-	-	PMS
88	2565	PT116865-06539	สหกรณ์เคหสถานศิษย์หลวงปู่ขาว จำกัด	671,625.00	671,625.00	-	-	PMS
89	2565	PT116865-06542	สหกรณ์เคหสถานพัฒนา 99 มีสุขร่วมใจ จำกัด	627,650.00	627,650.00	-	-	PMS
90	2565	PT116865-06545	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จำกัด	2,251,880.00	2,251,880.00	-	-	PMS
91	2565	PT116865-07090	สหกรณ์เคหสถานชุมชนประชาร่วมใจ 1 จำกัด	555,000.00	555,000.00	-	-	PMS
92	2566	PT116866-00026	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จำกัด	1,351,128.00	1,351,128.00	-	-	PMS
93	2566	PT116866-05592	สหกรณ์เคหสถานตาลคู่สมบูรณ์พูนทรัพย์ จำกัด	1,495,000.00	1,495,000.00	-	-	PMS
94	2566	PT116866-05594	สหกรณ์เคหสถานแจ้งวัฒนะ 5 จำกัด	3,727,400.00	3,427,400.00	-	300,000.00	PMS
95	2566	PT116866-05595	สหกรณ์เคหสถานพัฒนา 99 มีสุขร่วมใจ จำกัด	598,000.00	530,500.00	-	67,500.00	PMS
96	2566	PT116866-05596	สหกรณ์เคหสถานชุมชนปู่เจ้าสมิงพรายสะพานปูน ดอนเมือง จำกัด	1,943,500.00	1,854,500.00	-	89,000.00	PMS
97	2566	PT116866-05597	สหกรณ์เคหสถานศิษย์หลวงปู่ขาว จำกัด	1,196,000.00	1,061,000.00	-	135,000.00	PMS
98	2566	PT116866-05598	สหกรณ์เคหสถานประชากร 3 จำกัด	4,784,000.00	4,679,000.00	-	105,000.00	PMS
99	2566	PT116866-05616	สหกรณ์เคหสถานคลองเปรมประชาพัฒนา จำกัด	735,000.00	735,000.00	-	-	PMS
100	2567	PT116867-01528	สหกรณ์เคหสถานแจ้งวัฒนะ 5 จำกัด	1,927,250.00	1,794,080.00	-	133,170.00	PMS
101	2567	PT116867-03900	สหกรณ์เคหสถานตาลคู่สมบูรณ์พูนทรัพย์ จำกัด	255,000.00	255,000.00	-	-	PMS

ลำดับ	ปี	รหัสโครงการ	องค์กรผู้รับผลประโยชน์	งบประมาณอนุมัติ	เบิกจ่าย	รับคืน	คงเหลือ	โปรแกรม
102	2567	PT116867-03903	กลุ่มออมทรัพย์หลังสมาคม รร.ไทย-ญี่ปุ่น	36,000.00	36,000.00	-	-	PMS
103	2567	PT116867-03926	สหกรณ์เคหสถานประชากร 3 จำกัด	1,107,000.00	1,107,000.00	-	-	PMS
104	2567	PT116867-03928	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนลาดพร้าว 80	108,000.00	108,000.00	-	-	PMS
105	2567	PT116867-06117	สหกรณ์เคหสถานตาลคู่สมบูรณ์พูนทรัพย์ จำกัด	7,923,500.00	3,767,800.00	-	4,155,700.00	PMS
106	2567	PT116867-07028	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเพิ่มทรัพย์สินสมบุญ จำกัด	3,122,000.00	3,122,000.00	-	-	PMS
107	2567	PT116867-07135	สหกรณ์เคหสถานสามัคคีเทวสุนทร จำกัด	3,706,000.00	3,706,000.00	-	-	PMS
108	2568	PT046868-03546	สหกรณ์เคหสถานประชากร 3 จำกัด	621,000.00	621,000.00	-	-	PMS
109	2568	PT046868-03547	สหกรณ์เคหสถานร่มไทรงามพัฒนา จำกัด	2,136,000.00	2,136,000.00	-	-	PMS
110	2568	PT046868-03548	สหกรณ์เคหสถานทำนบสตรีเหล็กร่วมพัฒนา จำกัด	1,299,000.00	1,275,000.00	24,000.00	-	PMS
111	2568	PT116868-00001	กลุ่มพัฒนากรุงเทพ–สวนผัก	525,000.00	525,000.00	-	-	PMS
112	2568	PT116868-00028	สหกรณ์เคหสถานร่มไทรงามพัฒนา จำกัด	9,540,000.00	8,672,370.00	-	867,630.00	PMS
113	2568	PT116868-01148	เครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง	690,000.00	690,000.00	-	-	PMS
114	2568	PT116868-01479	สหกรณ์เคหสถานสามัคคีเทวสุนทร จำกัด	846,000.00	846,000.00	-	-	PMS
115	2568	PT116868-01832	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงห้วยขวาง จำกัด	5,940,000.00	4,167,110.00	-	1,772,890.00	PMS
116	2568	PT116868-01860	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงห้วยขวาง จำกัด	36,000.00	36,000.00	-	-	PMS
117	2568	PT116868-01868	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงห้วยขวาง จำกัด	108,000.00	108,000.00	-	-	PMS
118	2568	PT116868-01874	สหกรณ์เคหสถานคลองเปรมประชาพัฒนา จำกัด	4,201,950.00	4,011,630.00	-	190,320.00	PMS
119	2568	PT116868-03026	สหกรณ์เคหสถานสามัคคีเทวสุนทร จำกัด	1,004,850.00	1,004,850.00	-	-	PMS
120	2568	PT116868-03028	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองลาดพร้าวจตุจักร จำกัด	6,049,895.00	4,515,395.00	-	1,534,500.00	PMS
121	2568	PT116868-03029	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนพหลโยธิน 32 จำกัด	375,980.00	375,980.00	-	-	PMS
122	2568	PT116868-03031	สหกรณ์เคหสถานคลองเปรมประชาพัฒนา จำกัด	809,730.00	809,730.00	-	-	PMS
123	2568	PT116868-03481	สหกรณ์เคหสถานประชากร 3 จำกัด	108,000.00	108,000.00	-	-	PMS
124	2568	PT116868-03486	สหกรณ์เคหสถานทำนบสตรีเหล็กร่วมพัฒนา จำกัด	45,000.00	45,000.00	-	-	PMS
125	2568	PT116868-03513	สหกรณ์เคหสถานร่มไทรงามพัฒนา จำกัด	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	PMS
